

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Salah satu bentuk kawasan hutan suaka alam adalah Suaka Margasatwa (SM). Suaka Margasatwa Cikepuh merupakan salah satu SM di Jawa Barat yang peranannya cukup penting untuk membantu dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan terutama di dalam wilayah DAS Citarum-Ciliwung.

Lahan kritis, erosi, sedimentasi, dan pendangkalan sungai masih banyak terjadi di wilayah DAS Citarum-Ciliwung sehingga diperlukan upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. RHL menjadi salah satu upaya dalam menangani lahan kritis di Wilayah BPDASHL Citarum-Ciliwung.

Pola kerja sama RHL dapat dilakukan dengan melakukan sinergi dengan para pihak yang terkait, terutama pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui peningkatan peran SM Cikepuh sebagai salah satu pemangku kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan masyarakat guna melakukan upaya bersama untuk mengembalikan fungsi DAS Citarum-Ciliwung.

Penyusunan rancangan kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan dalam rangka melakukan kegiatan RHL. Rehabilitasi hutan dan lahan yang dimaksud adalah melakukan penanaman pada LMU terpilih, dengan standar biaya yang digunakan mengikuti standar HSPK-Perdirjen PDASHL No: P.5/PDASHL/SET/KUM.1/8/2018 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini adalah menyusun buku Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lingkup BPDASHL Citarum-Ciliwung tahun 2018 pada kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Sukabumi yang realistis dan mudah dilaksanakan di lapangan yang memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

C. SASARAN

Sasaran penyusunan Rancangan kegiatan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan evaluasi di hutan konservasi, terdiri dari:

- 1) Tahun pertama : Pembibitan dan penanaman
- 2) Tahun Kedua : Pemeliharaan I
- 3) Tahun Ketiga : Pemeliharaan II
- 4) Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman

II. RISALAH UMUM

A. KONDISI BIOFISIK

1. Letak dan Luas

a. Letak Administratif

- Blok : Ciawi Surat
 - Desa : Mandrajaya
 - Kecamatan : Ciemas
 - Kabupaten : Sukabumi
 - Provinsi : Jawa Barat
- Luas : 38,99 ha
 - Resort : Cikepuh
 - Seksi Konservasi Wilayah : Wilayah II Bogor
 - UPT: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat

b. Letak Geografis

- Secara hidrologis, lokasi terletak pada DAS Cibulakan dan DAS Cibuaya.
- Blok Ciawi Surat, sebelah utara berbatasan dengan area non-RHL; sebelah selatan berbatasan dengan area non-RHL; sebelah barat berbatasan dengan Blok Tegal Persawahan; sebelah timur berbatasan dengan Blok Tegal Sabuk, dengan koordinat geografis $106^{\circ}24'46,322''$ BT dan $-7^{\circ}15'37,185''$ LS.

2. Penggunaan Lahan Desa

Desa Mandrajaya

Sawah: 850 Ha

Kebun: - Ha

Calon lokasi RHL Blok Ciawi Surat berada di Desa Mandrajaya. Lokasi tersebut berupa hutan konservasi dengan kerapatan tegakan kategori rendah .

3. Ketinggian Tempat dan Topografi

Ketinggian tempat kawasan SM Cikepuh berkisar antara 0-250 meter dari permukaan laut, dengan topografi landai.

B. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

1. Demografi

Desa Mandrajaya

Jumlah Penduduk: 5.805 jiwa

Jumlah Laki-laki: 3.016 jiwa

Jumlah Perempuan: 2.789 jiwa

Jumlah Usia produktif: 3.062 jiwa

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju lokasi melewati jalan beraspal yang dapat dilewati kendaraan roda empat, dilanjutkan melalui jalan beraspal di desa. Kemudian untuk mencapai blok dilanjutkan melalui jalan setapak. Adapun jarak dari blok ke kota kecamatan, kabupaten, dan provinsi:

- Jarak ke Kota Kecamatan: 12,064 km - Jarak ke Kota Kabupaten: 33,656 km - Jarak ke Kota Propinsi: 139,013 km

3. Mata Pencaharian

Desa Mandrajaya

Petani : 1.144 jiwa

Buruh tani : 917 Jiwa

PNS/TNI/POLRI: 37 Jiwa

4. Tenaga Kerja

Pelaksanaan Kegiatan Penanaman RHL dilakukan secara swakelola maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan masyarakat mitra konservasi.

5. Sosial Budaya

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang telah memahami bercocok tanam serta memiliki kesadaran akan pentingnya RHL. Hal ini akan berdampak baik terhadap sosialisasi dan pelaksanaan RHL di lapang.

6. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat yang ada di sekitar lokasi yaitu organisasi keagamaan Desa Mandrajaya.

III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

1. Lokasi Persemaian

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di persemaian pada lokasi penanaman dengan koordinat 106°24'54.618" BT dan 7°15'23.861" LS.

2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

a. Jenis dan jumlah kebutuhan bibit disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL seluas 38,99 ha

Jenis Bibit*	Jumlah Bibit per Ha (Batang)	Jumlah Bibit (Batang)			Total Kebutuhan Bibit (Batang)
		P0	P1	P2	
Kayu-kayuan					
Ketapang	125	4.875	975	507	6.357
Beurih	125	4.875	975	507	6.357
Kepuh	125	4.875	975	507	6.357
Gempol	125	4.875	975	468	6.318
Sentul	125	4.875	975	468	6.318
Total Bibit	625	24.375	4.875	2.457	31.707

*Apabila bibit sebagaimana pada Tabel 1 tidak tercukupi atau tersedia, jenis bibit dapat diganti dengan jenis endemik lokal BBKSDA lainnya sesuai dengan RPE

- b. Jumlah dan jenis bibit yang digunakan sesuai dengan kondisi dan luas lahan yang telah ditetapkan.
- c. Bibit dengan kondisi fisiologis dan morfologis yang baik yaitu bibit sehat, memiliki tinggi 30 cm – 50 cm, dan berdiameter pangkal batang minimal 3 mm. Media tumbuh bibit harus kompak.
- d. Bibit normal yaitu bibit yang sehat, berbatang tunggal, dan leher akar berkayu.

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, fisik, pengelolaan dan faktor sosial serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang besar.

Spesifikasi Pekerjaan Penyiapan Lahan

1) Persiapan

- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam.
- Penyiapan lahan berupa pembersihan daerah lubang tanaman dalam bentuk piringan (cemplongan).
- Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada musim kemarau.
- Rancangan lubang tanaman sesuai dengan kondisi lapang dan jumlah lubang tanaman paling sedikit 625 lubang/ha.

2) Pelaksanaan

a. Pembentukan Satuan Unit Kerja Penyiapan Lahan

- Satuan unit kerja beranggotakan minimal 5 orang.
- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rintisan area penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- Dua anggota regu, bertugas membuat dan membuka rintisan area penanaman.
- Dua anggota regu bertugas membuat ajir dan memasang ajir pada lubang tanaman.

b. Persiapan Peralatan Kerja

- Peta kerja Rancangan Kegiatan Penanaman RHL 1 : 20.000.
- Persiapan peralatan kerja antara lain: parang/ golok, cangkul, dan papan nama blok.

c. Perencanaan Kerja

- Menentukan lokasi blok rehabilitasi kawasan Hutan Konservasi.
- Membuat peta kerja detail penyiapan lahan.
- Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan.

d. Pelaksanaan

- Mencari tanda area penanaman yang akan dibuat.
- Membersihkan daerah lubang tanaman dalam bentuk piringan (cemplongan).

- Pada setiap ujung jalur diberi tanda patok kayu diameter 5 cm dengan tinggi 130 cm.
 - Menentukan lokasi lubang tanaman paling sedikit 625 lubang/ha dan menandai lubang tanam dengan ajir.
- e. Pencatatan dan pelaporan meliputi pekerjaan:
- Nama lokasi blok.
 - Jumlah lubang tanaman.
 - Rencana jenis dan jumlah tanaman.
 - Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.
 - Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab satuan unit kerja penyiapan lahan (mandor).
 - Laporan kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap.
 - Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah blok dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan.

2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	2.340	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	24.375	-	-
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	-	-	-
5	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	39	-	-

- a. Pengadaan ajir tanaman: dibuat dari bambu atau bahan sejenisnya agar mudah dalam pengecekan lubang tanaman maupun tanamannya. Jumlah ajir tanaman disesuaikan dengan banyaknya bibit yang ditanam yaitu paling sedikit 24.375 batang.
- b. Pengadaan bahan dan papan nama:
- Dibuat empat persegi panjang dengan ukuran 120 cm × 90 cm dan dipasang pada dua buah tiang.
 - Bahan untuk papan nama digunakan papan dengan tebal 2 cm × lebar 120 cm × panjang 90 cm sebanyak 1 lembar.

- Bahan untuk tiang papan nama dari kayu dengan ukuran 5 cm × 7 cm panjang 2 meter sebanyak 2 batang.
- Tulisan untuk papan nama dapat dicetak/ disablon sesuai dengan ukuran dan desain pada Gambar 1.

3. Penanaman

a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
1	Persiapan lapangan	HOK	234	-	-
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, dan piringan	HOK	429	-	-
3	Pembuatan dan pemasangan papan nama	HOK	39	-	-
4	Distribusi bibit dan penanaman	HOK	312	-	-
5	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	-	39	-
6	Pengawasan/ mandor	OB	12	24	24
7	Penyulaman (2x), penyiangan, pendangiran, pengendalian hama & penyakit (3x)	HOK	-	663	546
Jumlah			1.026	726	570

b. Teknik Pelaksanaan

Pembuatan satuan unit kerja distribusi bibit dan penanaman

- 1) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- 2) Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam.
- 3) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan parang/golok.
- 4) Menentukan lokasi blok penanaman.

- 5) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit.
- 6) Membuat peta kerja detail penanaman.
- 7) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- 8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman

c. Pelaksanaan

- 1) Bibit yang telah disiapkan diangkut ke areal penanaman. Bibit dapat diangkut dengan menggunakan motor, keranjang, atau dipikul sampai ke lokasi penanaman dan diletakkan dekat lubang tanaman yang telah dibuat. Apabila lokasi penanaman curam, pengangkutan dapat dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan.
- 2) Membersihkan piringan dan menggali lubang tanam yang telah ditandai ajir.
- 3) Melakukan penanaman.

d. Pencatatan dan Pelaporan

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut:

- 1) Nama lokasi blok kerja.
- 2) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada blok kerja.
- 3) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

- 1) Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), penyiangan dan pendangiran, dan pengendalian hama penyakit.
- 2) Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, dan pengendalian hama penyakit.

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan

1) Penyulaman

Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada pemeliharaan tahun pertama dan tahun kedua sebanyak 2 kali pada masing-masing tahun.

2) Penyiangan dan pendangiran

Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan. Penyiangan dan pendangiran pada pemeliharaan tahun kedua dilaksanakan tiga kali dan tahun ketiga dilaksanakan tiga kali.

3) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau alami apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman.

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

A. PEMBUATAN TANAMAN (P0)

Tabel 4 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)

No.	Kegiatan	Satuan	Satuan Pokok per Ha	Volume	Satuan Biaya Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)
I.	Biaya Upah					
1	Persiapan lapangan	HOK	5,50	234	80.000	18.720.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, dan piringan	HOK	10,50	429	80.000	34.320.000
3	Pembuatan dan pemasangan papan nama	HOK	1,08	3	80.000	3.120.000
4	Distribusi bibit dan penanaman	HOK	8,00	312	80.000	24.960.000
5	Pengawasan/mandor	OB	0,10	12	180.000	2.160.000
	Jumlah I					80.400.000
II.	Belanja Bahan					
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	60	2.340	150	351.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	24.375	250	6.093.750
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0.04	2	500.000	1.000.000
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0.02	-	3.000.000	-
5	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	39	60.000	2.340.000
	Jumlah II					9.784.750
III	Kebutuhan Bibit					
1	Tanaman kayu-kayuan					
	Ketapang	Batang	125	4.875	3.000	14.625.000
	Beurih	Batang	125	4.875	3.000	14.625.000

No.	Kegiatan	Satuan	Satuan Pokok per Ha	Volume	Satuan Biaya Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
	Kepuh	Batang	125	4.875	3.000	14.625.000
	Gempol	Batang	125	4.875	3.000	14.625.000
	Sentul	Batang	125	4.875	3.000	14.625.000
	Jumlah III		625	24.375		73.125.000
IV	Total Biaya Swakelola					163.309.750
V	Rataan Biaya per Ha Swakelola					4.187.429
VI	Biaya Umum dan Keuntungan 10%					16.330.975
VII	Total Biaya Apabila Dilakukan Pihak Ketiga					179.640.725
VIII	Rataan Biaya per Ha Apabila Dilakukan Pihak Ketiga					4.606.172

B. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

Tabel 5 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Pertama (P1)

No.	Kegiatan	Satuan	Satuan Pokok per Ha	Volume	Satuan Biaya Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)
I.	Biaya Upah					
1	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	1,00	39	80.000	3.120.000
2	Penyulaman (2x)	HOK	3,00	117	80.000	9.360.000
3	Penyiangan, pendangiran, pengendalian hama dan penyakit (3x)	HOK	13,50	546	80.000	43.680.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,10	24	180.000	4.320.000
	Jumlah I					60.480.000

No.	Kegiatan	Satuan	Satuan Pokok per Ha	Volume	Satuan Biaya Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)
II	Bibit Sulaman					
1	Tanaman kayu-kayuan					
	Ketapang	Batang	25	975	3.000	2.925.000
	Beurih	Batang	25	975	3.000	2.925.000
	Kepuh	Batang	25	975	3.000	2.925.000
	Gempol	Batang	25	975	3.000	2.925.000
	Sentul	Batang	25	975	3.000	2.925.000
	Jumlah II		125	4.875		14.625.000
III	Total Biaya Swakelola					75.105.000
IV	Rataan Biaya per Ha Swakelola					1.925.769
V	Biaya Umum dan Keuntungan 10%					7.510.500
VI	Total Biaya Apabila Dilakukan Pihak Ketiga					82.615.500
VII	Rataan Biaya per Ha Apabila Dilakukan Pihak Ketiga					2.118.346

C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Tabel 6 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Kedua (P2)

No.	Kegiatan	Satuan	Satuan Pokok per Ha	Volume	Satuan Biaya Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)
I.	Biaya Upah					
1	Penyulaman (2x), Penyiangan, pendangiran, dan pngendalian hama dan penyakit (3x)	HOK	13,50	546	80.000	43.680.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,10	24	180.000	4.320.000
	Jumlah I					48.000.000

No.	Kegiatan	Satuan	Satuan Pokok per Ha	Volume	Satuan Biaya Unit (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)
II.	Bibit Sulaman					
1	Tanaman kayu-kayuan					
	Ketapang	Batang	13	507	3.000	1.521.000
	Beurih	Batang	13	507	3.000	1.521.000
	Kepuh	Batang	13	507	3.000	1.521.000
	Gempol	Batang	12	468	3.000	1.404.000
	Sentul	Batang	12	468	3.000	1.404.000
	Jumlah II		63	4.662		7.371.000
III	Total Biaya Swakelola					55.371.000
IV	Rataan Biaya per Ha Swakelola					1.419.769
V	Biaya Umum dan Keuntungan 10%					5.537.100
VI	Total Biaya Apabila Dilakukan Pihak Ketiga					60.908.100
VII	Rataan Biaya per Ha Apabila Dilakukan Pihak Ketiga					1.561.746

D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

No.	Kegiatan	Komponen	Biaya	Total Biaya (Rp)
1	Penanaman (P0)	Biaya upah	80.400.000	179.640.725
		Belanja bahan	9.784.750	
		Kebutuhan bibit	73.125.000	
		Biaya umum dan keuntungan 10%	16.330.975	
2	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Biaya upah	60.480.000	82.615.500
		Bibit sulaman	14.625.000	
		Biaya umum dan keuntungan 10%	7.510.500	
3	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	Biaya upah	48.000.000	60.908.100
		Bibit sulaman	7.371.000	
		Biaya umum dan keuntungan 10%	5.537.100	
	Jumlah (Rp)			323.164.325

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (P0) dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2019

No.	Kegiatan	TAHUN 2019					
		Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pengadaan bibit						
2	Pemasangan ajir						
3	Pembuatan piringan dan lubang tanam						
4	Pembuatan dan pemasangan papan nama						
5	Distribusi bibit ke lubang tanam						
7	Penanaman						
7	Pengadaan ajir						
8	Pengadaan bahan pembuatan papan nama						
9	Pengadaan bahan/peralatan kerja						

B. JADWAL KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman tahun pertama (P1) dapat di lihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) Tahun 2020

No.	Kegiatan	TAHUN 2020											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Distribusi bibit ke lubang tanam		■								■		
2	Penyulaman (2x)		■	■							■	■	
3	Penyiangan dan pendangiran (3x)			■	■			■	■			■	■


C. JADWAL KEGIATAN PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman tahun kedua (P2) dapat di lihat pada Tabel 9.


Tabel 9 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) Tahun 2021

No.	Kegiatan	TAHUN 2021											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Distribusi bibit ke lubang tanam		■								■		
2	Penyulaman (2x)		■	■							■	■	
3	Penyiangan, pendangiran, dan pengendalian hama penyakit (3x)			■	■			■	■			■	■


Gambar 1 Papan Nama Kegiatan

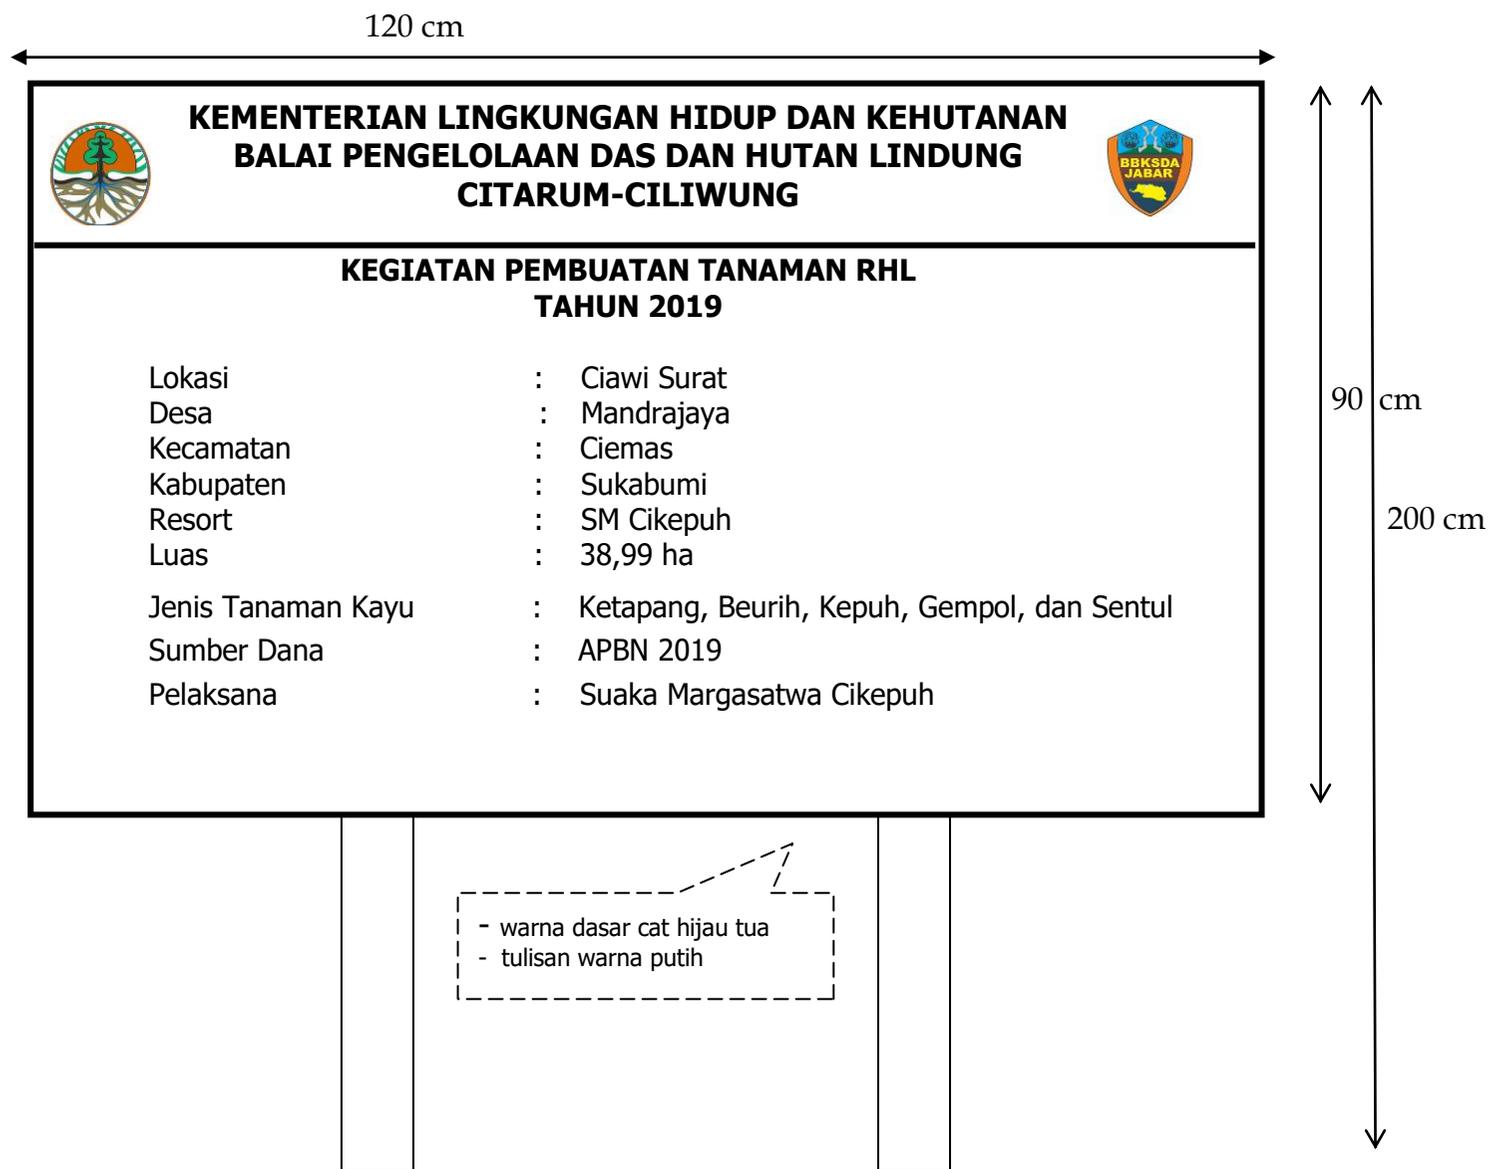


Gambar 2 Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir

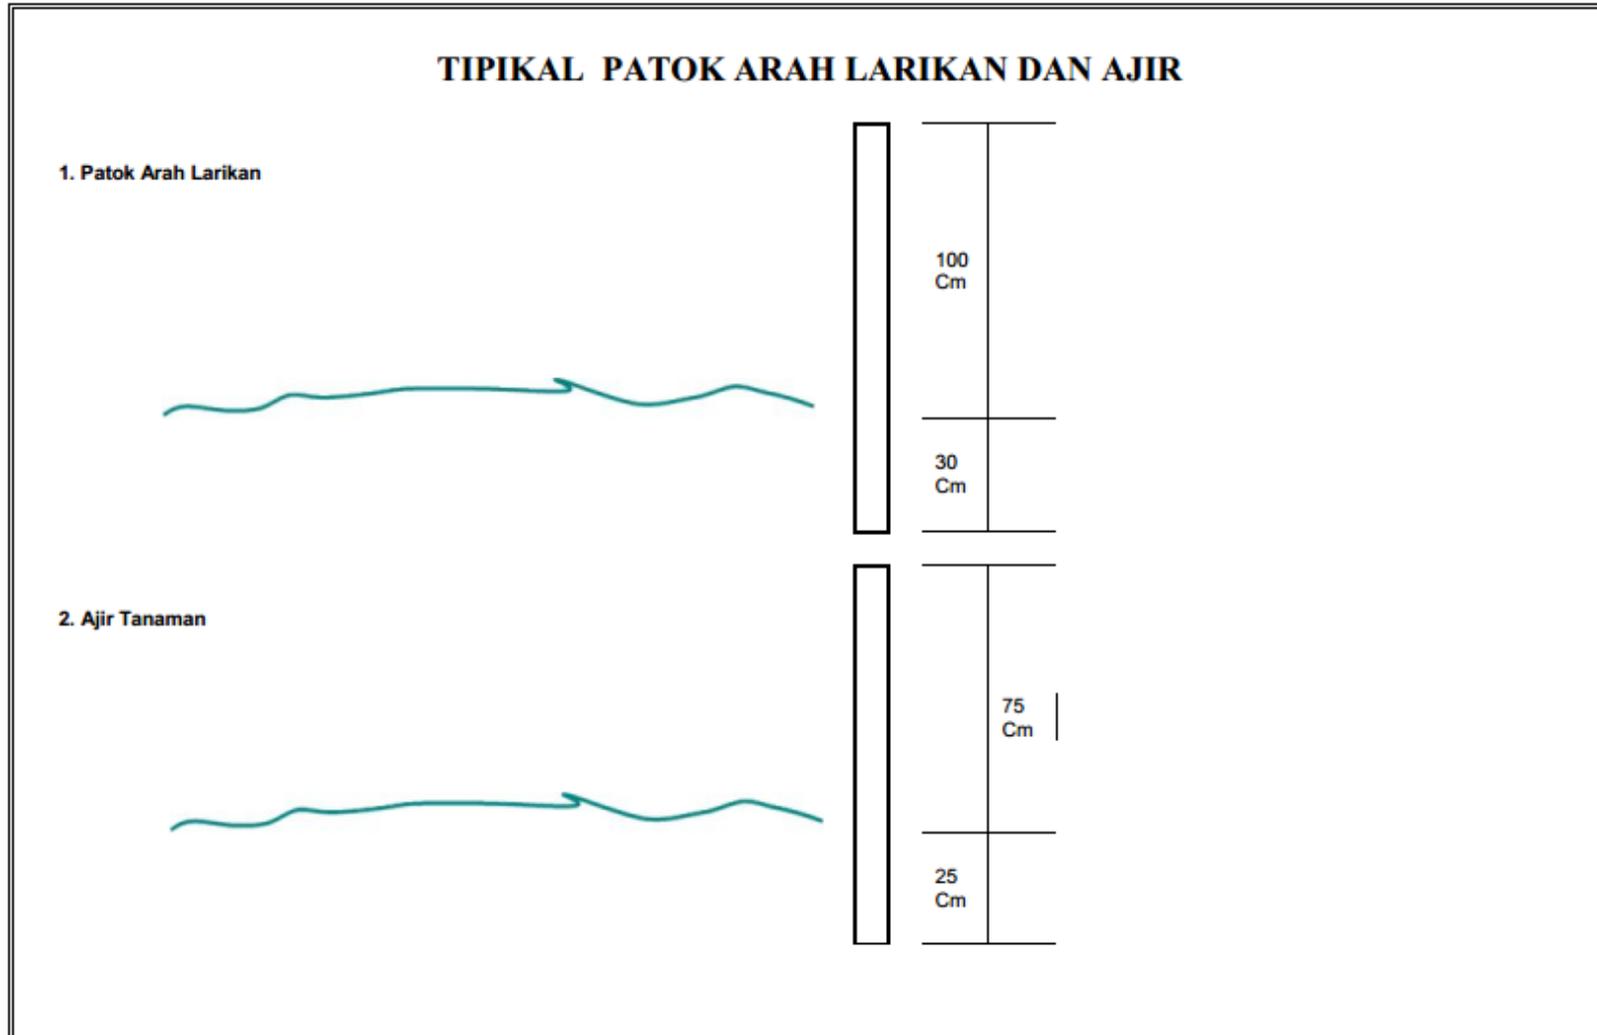

Gambar 3 Lubang Tanam

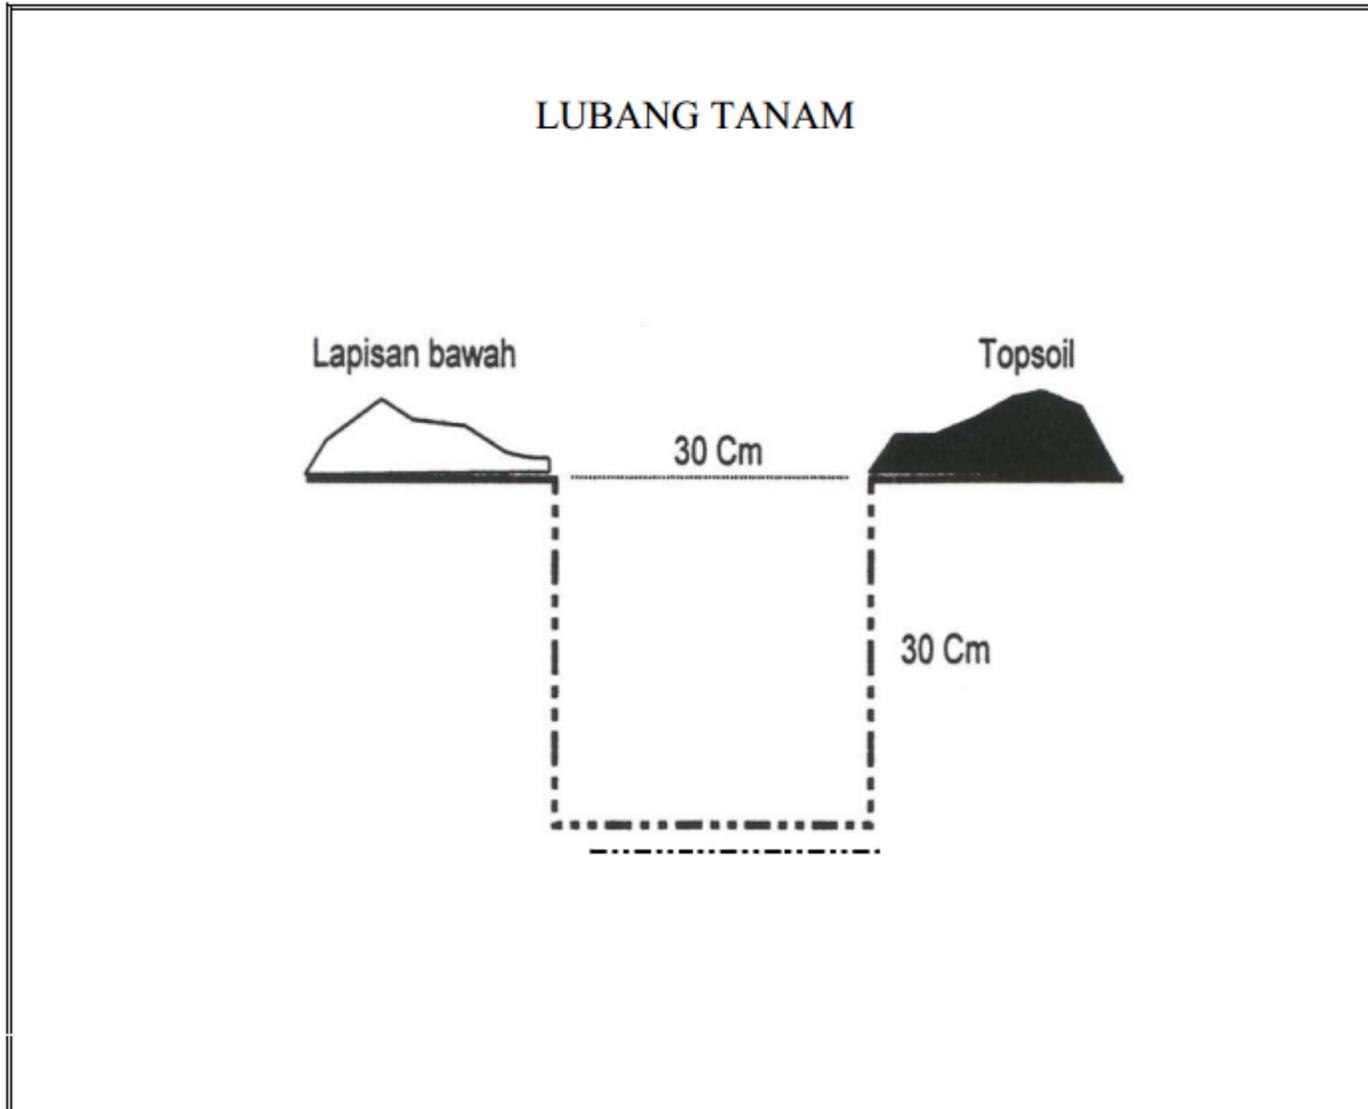

Gambar 4 Cara Menanam Bibit

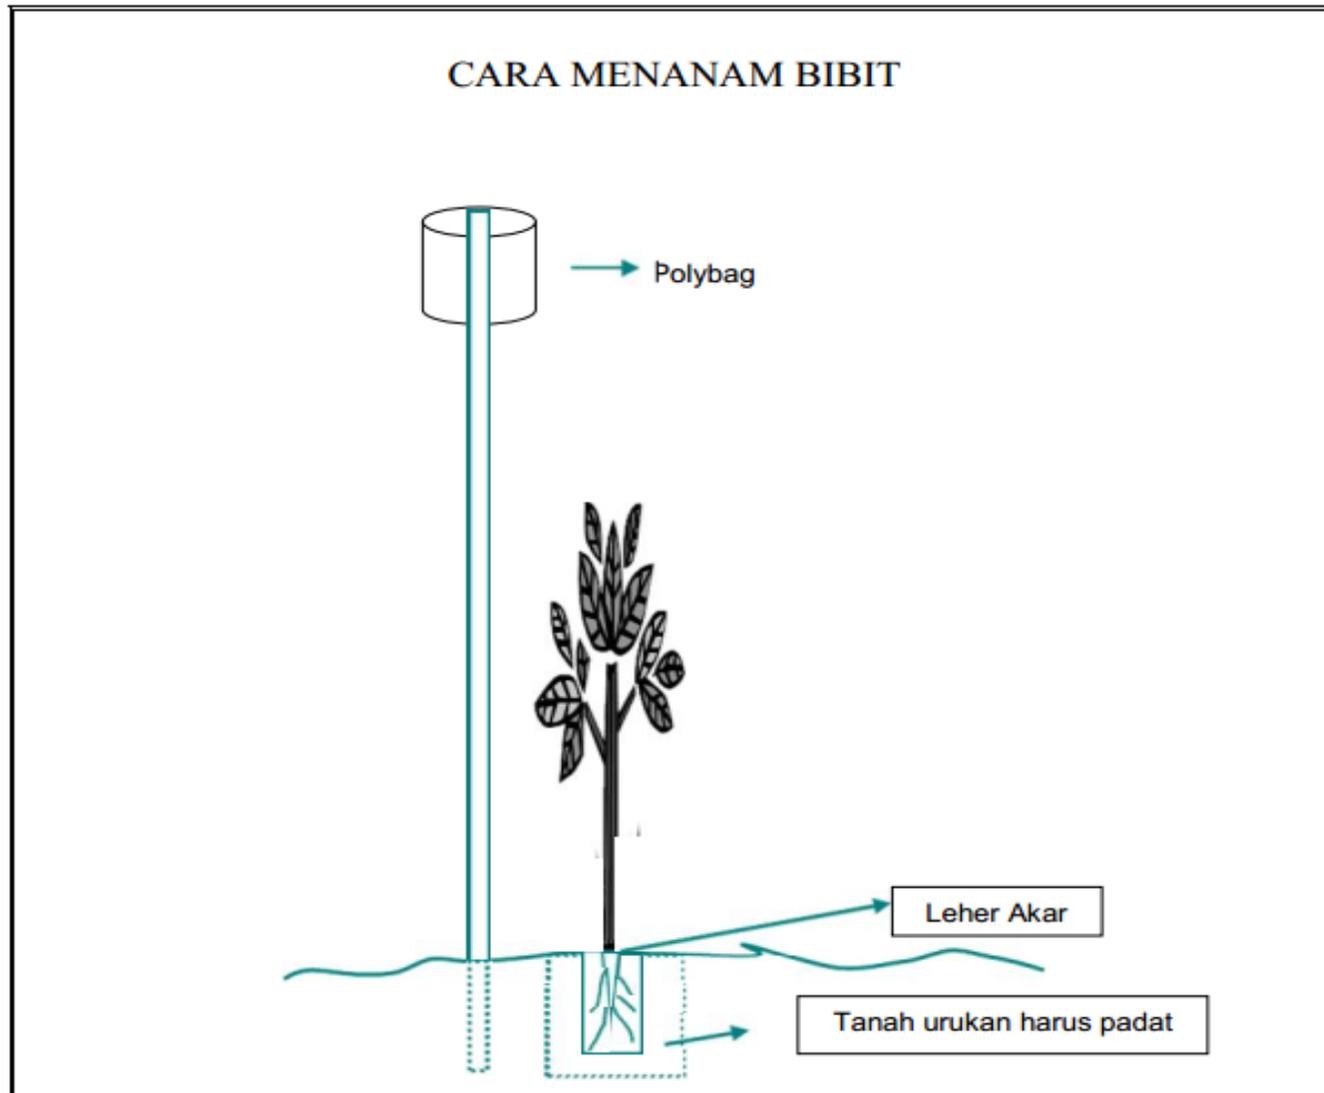

Lampiran Foto Calon Lokasi Penanaman RHL

FOTO CALON LOKASI PENANAMAN RHL

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Blok | : Ciawi Surat |
| 2. Resort | : Cikepuh |
| 3. Seksi Konservasi Wilayah | : Wilayah II Bogor |
| 4. UPT | : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat |

