



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG PEMALI JRATUN

Jalan : Karangrejo Raya No. 9 Banyumanik- Semarang

RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (INTENSIF)
TAHUN 2019

Petak	:	67 C, 68 E, 69 (A,B-1,B-2,D,E,F)
Fungsi Kawasan	:	Hutan Lindung
KPH	:	Pekalongan Timur
BKPH	:	Randudongkal
RPH	:	Bongas
Desa	:	Jojogan, Majalangu
Kecamatan	:	Watukumpul
Kabupaten	:	Pemalang
Provinsi	:	Jawa Tengah
DAS	:	Comal
Luas	:	211,7 Ha

Semarang, Maret 2019

LEMBAR PENGESAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL (INTENSIF)
TAHUN 2019**

Petak	:	67 C, 68 E, 69 (A,B-1,B-2,D,E,F)
Fungsi Kawasan	:	Hutan Lindung
KPH	:	Pekalongan Timur
Desa	:	Jojogan, Majalangu
BKPH	:	Randudongkal
RPH	:	Bongas
Kecamatan	:	Watukumpul
Kabupaten	:	Pemalang
Provinsi	:	Jawa Tengah
DAS	:	Comal
Luas	:	211,7 Ha


DISAHKAN
Kepala BP DASHL Pemali Jratun

Rochimah Nugraheni, S.Hut. M.Si
NIP. 19691028 199803 2 002

DIKETAHUI
Kepala KPH Pekalongan Timur


Ioko Santoso, S.Hut. MM
PHT. 19730801 200107 100

DINILAI
Kepala Seksi Program DAS

Sita Murti, S.Hut. M.Sc
NIP. 19690517 199803 2 002

DISUSUN
Tim Penyusun

Casram
NIP. 19790717 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan, sehingga rancangan kegiatan penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Intensif pada Kawasan Hutan Lindung di wilayah KPH Pekalongan Timur ini dapat disusun dengan baik.

Rancangan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembuatan Penanaman Intensif dan Pemeliharaannya yang memuat risalah umum, biofisik lapangan dan sosial ekonomi masyarakat, rancangan teknis, rencana pembiayaan dan tata waktu pelaksanaan. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi acuan teknis bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan..

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, Maret 2019

Kepala Balai



[Handwritten Signature]
ROCHIMAH NUGRAHINI, S.Hut, M.Si

NIP. 19691028 199803 2 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DATAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sasaran.....	2
II. RISALAH UMUM	3
A. Kondisi Biofisik	3
B. Kondisi Sosial Ekonomi.....	4
III. RANCANGAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL	5
A. Rancangan Penyediaan Bibit.....	5
B. Rancangan Penanaman	7
C. Rancangan Pemeliharaan Tanaman	14
IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA	15
A. Pembuatan Tanaman (P0)	15
B. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1).....	23
C. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2).....	31
D. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya.....	39

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	40
A. Jadwal Kegiatan Tahun Berjalan	40
B. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1).....	41
C. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2).....	42

DAFTAR LAMPIRAN

A. DAFTAR TABEL

1 Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL	5
2 Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL	8
3 Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL	10
4 Tabel 4. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)	15
5 Tabel 5. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1).....	23
6 Tabel 6. Kebutuhan Biaya Pemeliharaan (P2)	31
7 Tabel 7. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya	39
8 Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2019	40
9 Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) Tahun 2020	41
10 Tabel 10. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) Tahun 2021	42

B. DAFTAR GAMBAR

1 Gambar 1. Papan Petak	43
2 Gambar 2. Papan Nama Blok	44
3 Gambar 3. Gubuk Kerja	45
4 Gambar 4. Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir	46
5 Gambar 5. Lubang Tanam	47
6 Gambar 6. Cara Menanam Bibit	48

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. RHL menjadi salah satu upaya dalam menangani lahan kritis di wilayah kerja BPDASHL Pemali Jratun yang mencapai angka 92.963 hektar (tahun 2018), menahan laju degradasi lahan, dan sedimentasi yang sangat tinggi yang mencapai angka 250 ton/km²/tahun. RHL dihadapkan pada laju degradasi lahan yang cenderung terus meningkat dengan keterbatasan biaya penganggaran. Oleh karena itu kegiatan RHL perlu disusun dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung tingkat keberhasilan kegiatan RHL. Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan kegiatan RHL adalah pada tahap perencanaan. Perencanaan RHL diawali dari penentuan sasaran lokasi RHL yang diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, daerah tangkapan air (DTA) waduk/dam, dan daerah rawan bencana. Sasaran RHL pada Tahun 2019 di wilayah kerja BPDASHL Pemali Jratun adalah pada catchment areadanau prioritas dan pada daerah rawan bencana dengan luas target total luasan sebesar 5.000 hektar.

Sasaran lokasi tersebut selanjutnya ditapis dengan peta penutupan lahan, peta tingkat bahaya erosi, peta perizinan, dan selanjutnya diverifikasi dengan citra satelit resolusi tinggi untuk dapat menentukan sasaran lokasi yang tepat. Verifikasi lapangan dilakukan dengan kegiatan orientasi, risalah dan groundcheck/checking lapangan untuk memastikan keadaan lapangan sesuai dengan sasaran yang telah diitetapkan. Rancangan Kegiatan Penanaman RHL ini merupakan rancangan tingkat tapak untuk mendukung keberhasilan RHL secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman RHL adalah menyusun buku Rancangan Kegiatan Penanaman RHL di lingkup wilayah kerja BPDASHL Pemali Jratun tahun 2019 di Wilayah KPH Pekalongan Timur yang realistis dan mudah dilaksanakan di lapangan yang memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Tujuan Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman ini adalah agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat terarah dan tepat sasaran dan menjadi rancangan ini sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan di lapangan.

C. Sasaran

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Penanaman RHL meliputi kegiatan penanaman pada hutan hutan lindung, terdiri dari :

- 1) Tahun Pertama : Pembibitan, penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan
- 2) Tahun Kedua : Pemeliharaan I
- 3) Tahun Ketiga : Pemeliharaan II
- 4) Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman

II. RISALAH UMUM

A. Kondisi Biofisik

1. Letak dan Luas

a. Letak Administratif

- 1) Blok / Lokasi Petak : 67 C, 68 E, 69 (A,B-1,B-2,D,E,F)
- 2) Desa : Jojogan, Majalangu
- 3) Kecamatan : Watukumpul
- 4) Kabupaten : Pemalang
- 5) Provinsi : Jawa Tengah

b. Letak Geografis

Secara hidrologis terletak pada DAS Comal

Secara administrasi berbatasan dengan :

	Batas Desa	Desa	
		Jojogan	Majalangu
1	Batas sebelah Utara	Gapura dan Bodas	Gapura dan Bodas
2	Batas sebelah Selatan	Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga
3	Batas sebelah Barat	Majalangu	Watukumpul
4	Batas sebelah Timur	Cikadu	Jojogan

Letak Geografis terletak pada posisi koordinat : '108° 34' 13" BT sampai dengan 108° 37' 15" BT dan 7° 10' 53" LS sampai dengan 7° 12' 56" LS

2. Penutupan Lahan

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)	
		Jojogan	Majalangu
1	Tegal	339,939	112,834
2	Pemukiman	12,297	26,567
3	Perkebunan/Kehutanan	217,529	507,255
4	Sawah	20,9	226,074
5	Semak Belukar	191,675	43,462
9	Lain-lain		

3. Ketinggian Tempat dan Topografi

Ketinggian tempat 800-1200 meter dpl, dengan topografi berbukit dan bergunung.

C Kondisi Sosial Ekonomi

1. Demografi

No	Demografi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Jojogan	Majalangu
1	Jumlah Penduduk	4.436	8.626
2	Jumlah Lak-laki	2.227	4425
3	Jumlah Perempuan	2.209	4201
4	Jumlah Usia Produktif	3.105	6.038

2. Aksesibilitas

No	Demografi	Jarak (Km)	
		Jojogan	Majalangu
1	Jarak ke Kota Kecamatan	1	2
2	Jarak ke Kota Kabupaten	40	41
3	Jarak ke Kota Propinsi	105	106

3. Mata Pencaharian

No	Demografi	Jumlah (Orang)	
		Jojogan	Majalangu
1	Petani	683	1112
2	Buruh Tani	86	293
3	Industri	10	203
4	Buruh Bangunan	48	391
5	Pedagang	108	480
6	dll	8	217

4. Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman RHL ini akan dilakukan oleh Pihak Perum Perhutani, dengan melibatkan tenaga kerja/kelompok tani setempat dan diutamakan yang berada di sekitar lokasi kegiatan

5. Sosial Budaya

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga telah cukup akrab dengan fungsi kegiatan bangunan konservasi tanah serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya kegiatan tersebut. Dimana hal itu akan berdampak baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

6. Kelembagaan Masyarakat

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan Proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat, desa hutan, pihak yang berkepentingan). Dalam sistem PHBM, hutan terbagi dalam pangkuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH).

LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan top down approach, dibuat bersama antara MDH dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Sistem PHBM menganut pada prinsip pengelolaan hutan community based forest management (CBFM) dan resources based forest management (RBFM). Prinsip pengelolaan hutan CBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasannya. Dan Prinsip pengelolaan hutan RBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan Perum Perhutani tidak hanya bertumpu kepada hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya saja, tetapi meliputi pengelolaan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun yang ada di permukaan lahan hutan, seperti: Air, galian C, Agribisnis, Wisata Alam, dan lainnya, yang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat hutan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

LMDH yang mengelola wilayah Hutan di lokasi kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Nama Lembaga (Kelompok Tani)	Alamat
1	Watu Tumpang	Watukumpul

Susunan Pengurus Kelompok LMDH adalah sebagai berikut :

- 1 Ketua : Koima
- 2 Sekretaris : Nur Hadi Ristansto
- 3 Bendahara :

III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

1. Lokasi Persemaian

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di persemaian pada lokasi penanaman di wilayah KPH Pekalongan Timur

2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL

No.	Komposisi Jenis Tanaman	Jumlah Bibit/Ha (Btg)	Kebutuhan Bibit (Btg)			Total (Btg)
			Penanaman (P0) termasuk Sulaman 10%	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) (Bibit Sulaman 20%)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) (Bibit Sulaman 10%)	
1	2	3	4	5	6	7
I. Petak 67C SELATAN						
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	- Petai	688	20.640	3.750	1.890	26.280
Jumlah I		688	20.640	3.750	1.890	26.280
II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR						
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	- Nangka	355	8.059	1.476	749,0	10.284
-	- Petai	333	7.559	1.362	681,0	9.602
Jumlah II		688	15.618	2.838	1.430	19.886
III. Petak 68E TENGAH						
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	- Nangka	688	20.640	3.750	1.890	26.280
Jumlah III		688	20.640	3.750	1.890	26.280

1	2	3	4	5	6	7
IV.	Petak 68E BARAT					
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	Nangka	688	20.640	3.750	1.890	26.280
Jumlah IV		688	20.640	3.750	1.890	26.280
V.	Petak 69A					
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	Durian	688	13.072	2.375	1.197	16.644
Jumlah V		688	13.072	2.375	1.197	16.644
VI.	Petak 69B-1 dan 69B-2					
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	Durian	540	11.070	1.927	1.005	14.002
	Petai	148	3.034	636	287	3.957
Jumlah VI		688	14.104	2.563	1.292	17.959
VII.	Petak 69D UTARA					
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	Petai	688	20.640	3.750	1.890	5.640
Jumlah VII		688	20.640	3.750	1.890	5.640

1	2	3	4	5	6	7
VIII.	Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F					
1	Tanaman kayu-kayuan					
-	-	-	-	-	-	-
2	Tanaman HHBK					
-	Petai	688	20.296	3.688	1.859	25.843
	Jumlah VIII	688	20.296	3.688	1.859	25.843
	Jumlah Total		145.650	26.464	13.338	164.812

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, fisik, pengelolaan dan faktor sosial serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang besar.

Spesifikasi Pekerjaan Penyiapan Lahan

1) Persiapan

- Lokasi dan luas penyiapan lahan didasarkan pada hasil inventarisasi dan rancangan pembagian blok dan petak.
- Teknik penyiapan lahan didasarkan pada kondisi fisik, kelerengan dan tipe penutupan lahan.
- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam.
- Penyiapan lahan untuk jalur-jalur tanaman dilaksanakan dengan cara membatat rumput dan gulma serta belukar selebar 1 meter. Jarak antar sumbu jalur disesuaikan dengan jarak tanaman dengan arah utara selatan atau mengikuti kontur.
- Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada musim kemarau
- Pada sistem tanam jalur, jalur-jalur tanam dirancang tidak terputus dan rancangan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam.

2) Pelaksanaan

a) Pembentukan satuan unit kerja penyiapan lahan

- Satuan kerja unit lahan beranggotakan minimal 5 orang
- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rintisan jalur tanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- Dua anggota regu, bertugas membuat dan membuka rintisan jalur
- Dua anggota regu bertugas membuat ajir dan memasang ajir pada lubang tanam sepanjang jalur.

b) Persiapan Peralatan Kerja

- Penyiapan peta kerja penyiapan lahan 1 : 10.000
- Persiapan peralatan kerja antara lain : parang/golok, cangkul, papan tanda dan perlengkapan logistik lainnya.

c) Perencanaan Kerja

- Menentukan lokasi blok dan petak kerja rehabilitasi hutan lindung
- Membuat peta kerja detail penyiapan lahan
- Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan

d) Pelaksanaan

- Mencari tanda jalur penanaman yang akan dibuat
- Membuat rintisan jalur bersih/tanaman selebar 1 meter.
- Pada setiap ujung jalur diberi tanda patok kayu diameter 5 cm dengan tinggi 130 cm.
- Menentukan lokasi lubang tanaman sebanyak 625 s.d 1.100 lubang/ha dan menandai lubang tanam dengan ajir

e) Pencatatan dan pelaporan meliputi pekerjaan :

- Nama Lokasi blok dan petak kerja.
- Jumlah jalur tanam pembuatan rehabilitasi hutan.
- Rencana jenis dan jumlah tanaman pada masing-masing petak.
- Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan
- Buku register diisi setiap hari Kegiatan
- Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab Satuan unit kerja penyiapan lahan.
- Laporan Kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap.
- Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah petak dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan

2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan serta tenaga kerja sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
I. Petak 67C SELATAN					
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.500	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	18.750	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	1	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	450	450	450
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	30	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	30	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	20.640	3.750	1.890
II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR					
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.135	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	14.188	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	-	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	341	341	341
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	23	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	23	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	15.618	2.838	1.430

1	2	3	4	5	6
III.	Petak 68E TENGAH				
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.500	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	18.750	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	1	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	450	450	450
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	30	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	30	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	20.640	3.750	1.890
IV.	Petak 68E BARAT				
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.500	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	18.750	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	-	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	450	450	450
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	30	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	30	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	20.640	3.750	1.890
V.	Petak 69A				
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	950	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	11.875	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	-	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	285	285	285
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	19	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	19	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	13.072	2.375	1.197
VI.	Petak 69B-1 dan 69B-2				
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.025	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	12.813	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan petak dan blok	Unit	2	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	1	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	308	308	308
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	21	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	21	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	14.104	2.563	1.292

1	2	3	4	5	6
VII. Petak 69D UTARA					
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.500	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	18.750	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	-	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	450	450	450
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	30	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	30	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	20.640	3.750	1.890
VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F					
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	1.475	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	18.438	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	1	-	-
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja	Unit	-	-	-
5	Pengadaan Pupuk	Kg	443	443	443
6	Pengadaan Obat- obatan	Ha	30	-	-
7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket	30	-	-
8	Pengadaan Bibit	Btg	20.296	3.688	1.859

3. Penanaman

a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
I. Petak 67C SELATAN					
A. Persiapan Lahan					
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	165	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	315	-	-
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	20	-	-
B. Penanaman					
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	240	30	-

1	2	3	4	5	6
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	360	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	90	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	405	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	-	-	405
II.	Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR				
A.	Persiapan Lahan				
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	125	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	238	-	-
3	Pembuatan papan nama	HOK	3	-	-
B.	Penanaman				
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	182	23	-
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	272	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	68	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	306	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	-	-	306
III.	Petak 68E TENGAH				
A.	Persiapan Lahan				
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	165	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	315	-	-
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	20	-	-
B.	Penanaman				
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	240	30	-
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	360	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	90	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	405	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	-	-	405
IV.	Petak 68E BARAT				
A.	Persiapan Lahan				
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	165	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	315	-	-
3	Pembuatan papan nama	HOK	3	-	-
B.	Penanaman				
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	240	30	-

1	2	3	4	5	6
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	360	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	90	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	405	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	-	-	405
V.	Petak 69A				
A.	Persiapan Lahan				
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	105	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	200	-	-
3	Pembuatan papan nama	HOK	3	-	-
B.	Penanaman				
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	152	19	-
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	228	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	57	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	257	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama	HOK	-	-	257
VI.	Petak 69B-1 dan 69B-2				
A.	Persiapan Lahan				
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	113	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	215	-	-
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	20	-	-
B.	Penanaman				
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	164	21	-
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	246	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	62	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	277	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	-	-	277
VII.	Petak 69D UTARA				
A.	Persiapan Lahan				
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	165	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	315	-	-
3	Pembuatan papan nama	HOK	3	-	-
B.	Penanaman				
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	240	30	-

1	2	3	4	5	6
C. Pemeliharaan Tanaman					
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	360	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	90	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	405	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama	HOK	-	-	405
VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F					
A. Persiapan Lahan					
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	162	-	-
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	310	-	-
3	Pembuatan papan nama	HOK	3	-	-
B. Penanaman					
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	236	30	-
C. Pemeliharaan Tanaman					
1	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	354	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	89	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	-	398	-
4	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama	HOK	-	-	398

b. Teknik Pelaksanaan

Pembentukan satuan unit kerja Distribusi Bibit dan Penanaman

- 1) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- 2) Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam.
- 3) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan perlengkapan logistik lainnya.
- 4) Menentukan lokasi blok dan petak kerja penanaman.
- 5) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit.
- 6) Membuat peta kerja detail penanaman.
- 7) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- 8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman.

c. Pelaksanaan

- 1) Melakukan distribusi bibit.
- 2) Membersihkan piringan dan menggali lubang tanam yang telah ditandai ajir.
- 3) Melakukan penanaman.

d. Pencatatan dan pelaporan.

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut:

- 1) Nama lokasi blok dan petak kerja.
- 2) Jumlah jalur tanam rehabilitasi hutan.
- 3) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada masing-masing petak.
- 4) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan

C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
2. Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
3. Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan

1) Penyulaman

Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama dan tahun kedua.

2) Penyiangan dan pendangiran

Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan.

Penyiangan dan pendangiran dilakukan menyesuaikan dengan kondisi tanaman pengganggu.

3) Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

4) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman.

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

A. PEMBUATAN TANAMAN (P0)

Tabel 4. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)

I. Petak 67C SELATAN		Luas :		30,0 Ha					
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	1,08	80.000	HOK	20	HOK	20	1.600.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
JUMLAH I									98.800.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
JUMLAH II									22.787.500
III. Penyediaan Bibit/Benih									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	688	3.200	Batang	20.640	Batang	20.640	66.048.000
JUMLAH III									66.048.000
IV. JUMLAH BIAYA (I+II+III)									
									187.635.500
IV. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									
									-
V. TOTAL BIAYA (III+IV)									
									187.635.500

II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR

- Petak 67C UTARA
- Petak 68E TIMUR

Luas : 22,7 Ha

Luas : 10,1 Ha

Luas : 12,6 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	125	HOK	125	10.000.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	238	HOK	238	19.040.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	182	HOK	182	14.560.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	272	HOK	272	21.760.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	2	OB	2	8.280.000
	JUMLAH I								73.880.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.135	Patok	1.135	1.702.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	14.188	Batang	14.188	3.547.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	341	Kg	341	6.820.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	23	Ha	23	1.248.500
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	23	Paket	23	1.380.000
	JUMLAH II								15.098.000
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	355	3.000	Batang	8.059	Batang	8.059	24.177.000
-	Petai	Batang	333	3.200	Batang	7.559	Batang	7.559	24.188.800
	JUMLAH III								48.365.800
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								137.343.800
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								137.343.800

III. Petak 68E TENGAH

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	1,08	80.000	HOK	20	HOK	20	1.600.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								98.800.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								22.787.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	688	3.000	Batang	20.640	Batang	20.640	61.920.000
	JUMLAH III								61.920.000
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								183.507.500
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								183.507.500

IV. Petak 68E BARAT

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								97.440.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								19.787.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	688	3.000	Batang	20.640	Batang	20.640	61.920.000
	JUMLAH III								61.920.000
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								179.147.500
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								179.147.500

V. Petak 69A

Luas : 19,0 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	105	HOK	105	8.400.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	200	HOK	200	16.000.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	152	HOK	152	12.160.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	228	HOK	228	18.240.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	2	OB	2	6.840.000
	JUMLAH I								61.880.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	950	Patok	950	1.425.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	11.875	Batang	11.875	2.968.750
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	285	Kg	285	5.700.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	19	Ha	19	1.045.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	19	Paket	19	1.140.000
	JUMLAH II								12.678.750
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	688	3.200	Batang	13.072	Batang	13.072	41.830.400
	JUMLAH III								41.830.400
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								116.389.150
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								116.389.150

VI. Petak 69B-1 dan 69B-2

- Petak 69B-1
- Petak 69B-2

Luas : 20,5 Ha

Luas : 16,1 Ha

Luas : 4,4 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	113	HOK	113	9.040.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	215	HOK	215	17.200.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	1,08	80.000	HOK	20	HOK	20	1.600.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	164	HOK	164	13.120.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	246	HOK	246	19.680.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	2	OB	2	7.560.000
JUMLAH I									68.200.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.025	Patok	1.025	1.537.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	12.813	Batang	12.813	3.203.250
3	Pengadaan bahan papan nama petak dan blok	Unit	1	400.000	Unit	2	Unit	2	800.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	308	Kg	308	6.160.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	21	Ha	21	1.127.500
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	21	Paket	21	1.260.000
JUMLAH II									17.088.250
III. Penyediaan Bibit/Benih									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	540	3.200	Batang	11.070	Batang	11.070	35.424.000
-	Petai	Batang	148	3.200	Batang	3.034	Batang	3.034	9.708.800
JUMLAH III									45.132.800
IV. JUMLAH BIAYA (I+II+III)									
									130.421.050
IV. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									
									-
V. TOTAL BIAYA (III+IV)									
									130.421.050

VII. Petak 69D UTARA

Luas : 30,0 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								97.440.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								19.787.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	688	3.200	Batang	20.640	Batang	20.640	66.048.000
	JUMLAH III								66.048.000
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								183.275.500
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								183.275.500

VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F

- Petak 69D SELATAN
- Petak 69E

Luas : 29,5 Ha

Luas : 3,9 Ha

Luas : 12,8 Ha

- Petak 69F

Luas : 12,8 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	162	HOK	162	12.960.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	310	HOK	310	24.800.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	236	HOK	236	18.880.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	354	HOK	354	28.320.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								96.000.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.475	Patok	1.475	2.212.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.438	Batang	18.438	4.609.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	443	Kg	443	8.860.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.622.500
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								19.504.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	688	3.200	Batang	20.296	Batang	20.296	64.947.200
	JUMLAH III								64.947.200
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								180.451.700
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								180.451.700

B. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

I. Petak 67C SELATAN

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								52.800.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
	JUMLAH II								9.000.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	125	3.200	Batang	3.750	Batang	3.750	12.000.000
	JUMLAH III								12.000.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								73.800.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								73.800.000

II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR

- Petak 67C UTARA
- Petak 68E TIMUR

Luas : 22,7 Ha
 Luas : 10,1 Ha
 Luas : 12,6 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	23	HOK	23	1.840.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	68	HOK	68	5.440.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	306	HOK	306	24.480.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	8.280.000
	JUMLAH I								40.040.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	341	Kg	341	6.820.000
	JUMLAH II								6.820.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	65	3.000	Batang	1.476	Batang	1.476	4.428.000
-	Petai	Batang	60	3.200	Batang	1.362	Batang	1.362	4.358.400
	JUMLAH III								8.786.400
IV.	JUMLAH (I+II+III)								55.646.400
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								55.646.400

III. Petak 69A

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000	
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000	
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									52.800.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Nangka	Batang	125	3.000	Batang	3.750	Batang	3.750	11.250.000	
JUMLAH III									11.250.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									73.050.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									73.050.000

IV. Petak 68E BARAT

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000	
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000	
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									52.800.000	
II. Bahan-bahan										
1	0	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Nangka	Batang	125	3.000	Batang	3.750	Batang	3.750	11.250.000	
JUMLAH III									11.250.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									73.050.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									73.050.000

V. Petak 69A

Luas : 19 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	19	HOK	19	1.520.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	57	HOK	57	4.560.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	257	HOK	257	20.560.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	6.840.000
	JUMLAH I								33.480.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	285	Kg	285	5.700.000
	JUMLAH II								5.700.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	125	3.200	Batang	2.375	Batang	2.375	7.600.000
	JUMLAH III								7.600.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								46.780.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								46.780.000

VI. Petak 69B-1 dan 69B-2

- Petak 69B-1
- Petak 69B-2

Luas : 20,5 Ha
 Luas : 16,1 Ha
 Luas : 4,4 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	21	HOK	21	1.680.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	62	HOK	62	4.960.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	277	HOK	277	22.160.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	7.560.000
	JUMLAH I								36.360.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	308	Kg	308	6.160.000
	JUMLAH II								6.160.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	94	3.200	Batang	1.927	Batang	1.927	6.166.400
-	Petai	Batang	31	3.200	Batang	636	Batang	636	2.035.200
	JUMLAH III								8.201.600
IV.	JUMLAH (I+II+III)								50.721.600
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								50.721.600

VII. Petak 69D UTARA

Luas : 30

Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								52.800.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
	JUMLAH II								9.000.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	125	3.200	Batang	3.750	Batang	3.750	12.000.000
	JUMLAH III								12.000.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								73.800.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								73.800.000

VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F

- Petak 69D SELATAN
- Petak 69E

Luas : 29,5
 Luas : 3,9
 Luas : 12,8

Ha
 Ha
 Ha

- Petak 69F

Luas : 12,8

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	89	HOK	89	7.120.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	398	HOK	398	31.840.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								52.160.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	443	Kg	443	8.860.000
	JUMLAH II								8.860.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	125	3.200	Batang	3.688	Batang	3.688	11.801.600
	JUMLAH III								11.801.600
IV.	JUMLAH (I+II+III)								72.821.600
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								72.821.600

C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Tabel 6. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

I. Petak 67C SELATAN		Luas :		30 Ha						
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									43.200.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Petai	Batang	63	3.200	Batang	1.890	Batang	1.890	6.048.000	
JUMLAH III									6.048.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									58.248.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									58.248.000

II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR

Luas : 22,7 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	306	HOK	306	24.480.000
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	8.280.000
JUMLAH I									32.760.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	341	Kg	341	6.820.000
JUMLAH II									6.820.000
III. Penyediaan Bibit									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	33	3.000	Batang	749	Batang	749	2.247.000
-	Petai	Batang	30	3.200	Batang	681	Batang	681	2.179.200
JUMLAH III									4.426.200
IV.	JUMLAH (I+II+III)								44.006.200
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								44.006.200

III. Petak 69A

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
JUMLAH I									43.200.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
JUMLAH II									9.000.000
III. Penyediaan Bibit									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	63	3.000	Batang	1.890	Batang	1.890	5.670.000
JUMLAH III									5.670.000
IV. JUMLAH (I+II+III)									57.870.000
V. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									
		-	-	-	-	-	-	-	-
VI. TOTAL BIAYA (IV+V)									57.870.000

IV. Petak 68E BARAT

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
JUMLAH I									43.200.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
JUMLAH II									9.000.000
III. Penyediaan Bibit									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	63	3.000	Batang	1.890	Batang	1.890	5.670.000
JUMLAH III									5.670.000
IV. JUMLAH (I+II+III)									57.870.000
V. BIAAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAAYA		-	-	-	-	-	-	-	-
VI. TOTAL BIAAYA (IV+V)									57.870.000

V. Petak 69A

Luas : 19 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	257	HOK	257	20.560.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	6.840.000	
JUMLAH I									27.400.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	285	Kg	285	5.700.000	
JUMLAH II									5.700.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Durian	Batang	63	3.200	Batang	1.197	Batang	1.197	3.830.400	
JUMLAH III									3.830.400	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									36.930.400
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									36.930.400

VI. Petak 69B-1 dan 69B-2

- Petak 69B-1
- Petak 69B-2

Luas : 20,5 Ha

Luas : 16,1 Ha

Luas : 4,4 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	277	HOK	277	22.160.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	7.560.000	
JUMLAH I									29.720.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	308	Kg	308	6.160.000	
JUMLAH II									6.160.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Durian	Batang	49	3.200	Batang	1.005	Batang	1.005	3.216.000	
-	Petai	Batang	14	3.200	Batang	287	Batang	287	918.400	
JUMLAH III									4.134.400	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									40.014.400
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									40.014.400

VII. Petak 69D UTARA

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								43.200.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
	JUMLAH II								9.000.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	63	3.200	Batang	1.890	Batang	1.890	6.048.000
	JUMLAH III								6.048.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								58.248.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								58.248.000

VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F

- Petak 69D SELATAN
- Petak 69E

Luas : 29,5 Ha

Luas : 3,9 Ha

Luas : 12,8 Ha

- Petak 69F

Luas : 12,8

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	398	HOK	398	31.840.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									42.640.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	443	Kg	443	8.860.000	
JUMLAH II									8.860.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Petai	Batang	63	3.200	Batang	1.859	Batang	1.859	5.948.800	
JUMLAH III									5.948.800	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									57.448.800
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									57.448.800

D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

No.	Kegiatan	Luas		Total Biaya (Rp.)
1	2	3		4
I. Petak 67C SELATAN				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	187.635.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.800.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	58.248.000
Jumlah I		30,0	Ha	319.683.500
II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR				
1.	Penanaman (P0)	22,7	Ha	137.343.800
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	22,7	Ha	55.646.400
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	22,7	Ha	44.006.200
Jumlah II		22,7	Ha	236.996.400
III. Petak 69A				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	183.507.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.050.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	57.870.000
Jumlah III		30,0	Ha	314.427.500
IV. Petak 68E BARAT				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	179.147.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.050.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	57.870.000
Jumlah IV		30,0	Ha	310.067.500
V. Petak 69A				
1.	Penanaman (P0)	19,0	Ha	116.389.150
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	19,0	Ha	46.780.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	19,0	Ha	36.930.400
Jumlah V		19,0	Ha	200.099.550
VI. Petak 69B-1 dan 69B-2				
1.	Penanaman (P0)	20,5	Ha	130.421.050
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	20,5	Ha	50.721.600
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	20,5	Ha	40.014.400
Jumlah VI		20,5	Ha	221.157.050
VII. Petak 69D UTARA				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	183.275.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.800.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	58.248.000
Jumlah VII		30,0	Ha	315.323.500

1	2	3	4
VIII.	Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F		
1.	Penanaman (P0)	29,5 Ha	180.451.700
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	29,5 Ha	72.821.600
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	29,5 Ha	57.448.800
	Jumlah VIII	29,5 Ha	310.722.100
	Jumlah Total	211,7 Ha	2.228.477.312

Ket : Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk pajak

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

A. PEMBUATAN TANAMAN (P0)

Tabel 4. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)

I. Petak 67C SELATAN		Luas :		30,0 Ha					
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	1,08	80.000	HOK	20	HOK	20	1.600.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
JUMLAH I									98.800.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
JUMLAH II									22.787.500
III. Penyediaan Bibit/Benih									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	688	3.200	Batang	20.640	Batang	20.640	66.048.000
JUMLAH III									66.048.000
IV. JUMLAH BIAYA (I+II+III)									
									187.635.500
IV. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									
									-
V. TOTAL BIAYA (III+IV)									
									187.635.500

II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR

- Petak 67C UTARA
- Petak 68E TIMUR

Luas : 22,7 Ha

Luas : 10,1 Ha

Luas : 12,6 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	125	HOK	125	10.000.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	238	HOK	238	19.040.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	182	HOK	182	14.560.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	272	HOK	272	21.760.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	2	OB	2	8.280.000
	JUMLAH I								73.880.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.135	Patok	1.135	1.702.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	14.188	Batang	14.188	3.547.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	341	Kg	341	6.820.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	23	Ha	23	1.248.500
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	23	Paket	23	1.380.000
	JUMLAH II								15.098.000
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	355	3.000	Batang	8.059	Batang	8.059	24.177.000
-	Petai	Batang	333	3.200	Batang	7.559	Batang	7.559	24.188.800
	JUMLAH III								48.365.800
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								137.343.800
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								137.343.800

III. Petak 68E TENGAH

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	1,08	80.000	HOK	20	HOK	20	1.600.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								98.800.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								22.787.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	688	3.000	Batang	20.640	Batang	20.640	61.920.000
	JUMLAH III								61.920.000
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								183.507.500
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								183.507.500

IV. Petak 68E BARAT

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								97.440.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								19.787.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	688	3.000	Batang	20.640	Batang	20.640	61.920.000
	JUMLAH III								61.920.000
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								179.147.500
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								179.147.500

V. Petak 69A

Luas : 19,0 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	105	HOK	105	8.400.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	200	HOK	200	16.000.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	152	HOK	152	12.160.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	228	HOK	228	18.240.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	2	OB	2	6.840.000
	JUMLAH I								61.880.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	950	Patok	950	1.425.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	11.875	Batang	11.875	2.968.750
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	285	Kg	285	5.700.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	19	Ha	19	1.045.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	19	Paket	19	1.140.000
	JUMLAH II								12.678.750
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	688	3.200	Batang	13.072	Batang	13.072	41.830.400
	JUMLAH III								41.830.400
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								116.389.150
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								116.389.150

VI. Petak 69B-1 dan 69B-2

- Petak 69B-1
- Petak 69B-2

Luas : 20,5 Ha

Luas : 16,1 Ha

Luas : 4,4 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	113	HOK	113	9.040.000	
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	215	HOK	215	17.200.000	
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	1,08	80.000	HOK	20	HOK	20	1.600.000	
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	164	HOK	164	13.120.000	
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	246	HOK	246	19.680.000	
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	2	OB	2	7.560.000	
JUMLAH I									68.200.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.025	Patok	1.025	1.537.500	
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	12.813	Batang	12.813	3.203.250	
3	Pengadaan bahan papan nama petak dan blok	Unit	1	400.000	Unit	2	Unit	2	800.000	
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000	
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	308	Kg	308	6.160.000	
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	21	Ha	21	1.127.500	
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	21	Paket	21	1.260.000	
JUMLAH II									17.088.250	
III. Penyediaan Bibit/Benih										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Durian	Batang	540	3.200	Batang	11.070	Batang	11.070	35.424.000	
-	Petai	Batang	148	3.200	Batang	3.034	Batang	3.034	9.708.800	
JUMLAH III									45.132.800	
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)									130.421.050
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)									130.421.050

VII. Petak 69D UTARA

Luas : 30,0 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	165	13.200.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	315	HOK	315	25.200.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	240	HOK	240	19.200.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	360	HOK	360	28.800.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								97.440.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.500	Patok	1.500	2.250.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.750	Batang	18.750	4.687.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.650.000
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								19.787.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	688	3.200	Batang	20.640	Batang	20.640	66.048.000
	JUMLAH III								66.048.000
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								183.275.500
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								183.275.500

VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F

- Petak 69D SELATAN
- Petak 69E

Luas : 29,5 Ha

Luas : 3,9 Ha

Luas : 12,8 Ha

- Petak 69F

Luas : 12,8 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	162	HOK	162	12.960.000
2	Pemasangan ajir, Pembuatan lubang dan piringan	HOK	10,50	80.000	HOK	310	HOK	310	24.800.000
3	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	3	HOK	3	240.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,00	80.000	HOK	236	HOK	236	18.880.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran dan penyulaman)	HOK	12,00	80.000	HOK	354	HOK	354	28.320.000
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	0,10	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								96.000.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.475	Patok	1.475	2.212.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	250	Batang	18.438	Batang	18.438	4.609.500
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	400.000	Unit	1	Unit	1	400.000
4	Pengadaan gubuk kerja/pondok kerja	Unit	1	3.000.000	Unit	-	Unit	-	-
5	Pengadaan pupuk	Kg	15	20.000	Kg	443	Kg	443	8.860.000
6	Pengadaan obat- obatan	Ha	1	55.000	Ha	30	Ha	30	1.622.500
7	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1	60.000	Paket	30	Paket	30	1.800.000
	JUMLAH II								19.504.500
III.	Penyediaan Bibit/Benih								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	688	3.200	Batang	20.296	Batang	20.296	64.947.200
	JUMLAH III								64.947.200
IV.	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								180.451.700
IV.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	TOTAL BIAYA (III+IV)								180.451.700

B. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

I. Petak 67C SELATAN

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								52.800.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
	JUMLAH II								9.000.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	125	3.200	Batang	3.750	Batang	3.750	12.000.000
	JUMLAH III								12.000.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								73.800.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								73.800.000

II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR

- Petak 67C UTARA
- Petak 68E TIMUR

Luas : 22,7 Ha
 Luas : 10,1 Ha
 Luas : 12,6 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	23	HOK	23	1.840.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	68	HOK	68	5.440.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	306	HOK	306	24.480.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	8.280.000
	JUMLAH I								40.040.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	341	Kg	341	6.820.000
	JUMLAH II								6.820.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	65	3.000	Batang	1.476	Batang	1.476	4.428.000
-	Petai	Batang	60	3.200	Batang	1.362	Batang	1.362	4.358.400
	JUMLAH III								8.786.400
IV.	JUMLAH (I+II+III)								55.646.400
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								55.646.400

III. Petak 69A

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000	
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000	
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									52.800.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Nangka	Batang	125	3.000	Batang	3.750	Batang	3.750	11.250.000	
JUMLAH III									11.250.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									73.050.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									73.050.000

IV. Petak 68E BARAT

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000	
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000	
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									52.800.000	
II. Bahan-bahan										
1	0	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Nangka	Batang	125	3.000	Batang	3.750	Batang	3.750	11.250.000	
JUMLAH III									11.250.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									73.050.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									73.050.000

V. Petak 69A

Luas : 19 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	19	HOK	19	1.520.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	57	HOK	57	4.560.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	257	HOK	257	20.560.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	6.840.000
	JUMLAH I								33.480.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	285	Kg	285	5.700.000
	JUMLAH II								5.700.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	125	3.200	Batang	2.375	Batang	2.375	7.600.000
	JUMLAH III								7.600.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								46.780.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								46.780.000

VI. Petak 69B-1 dan 69B-2

- Petak 69B-1
- Petak 69B-2

Luas : 20,5 Ha
 Luas : 16,1 Ha
 Luas : 4,4 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	21	HOK	21	1.680.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	62	HOK	62	4.960.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	277	HOK	277	22.160.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	7.560.000
	JUMLAH I								36.360.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	308	Kg	308	6.160.000
	JUMLAH II								6.160.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Durian	Batang	94	3.200	Batang	1.927	Batang	1.927	6.166.400
-	Petai	Batang	31	3.200	Batang	636	Batang	636	2.035.200
	JUMLAH III								8.201.600
IV.	JUMLAH (I+II+III)								50.721.600
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								50.721.600

VII. Petak 69D UTARA

Luas : 30

Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	90	7.200.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								52.800.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
	JUMLAH II								9.000.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	125	3.200	Batang	3.750	Batang	3.750	12.000.000
	JUMLAH III								12.000.000
IV.	JUMLAH (I+II+III)								73.800.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								73.800.000

VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F

- Petak 69D SELATAN
- Petak 69E

Luas : 29,5
 Luas : 3,9
 Luas : 12,8

Ha
 Ha
 Ha

- Petak 69F

Luas : 12,8

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gaji - Upah								
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	89	HOK	89	7.120.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan	HOK	13,5	80.000	HOK	398	HOK	398	31.840.000
4	Pengawasan / Mandor	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
	JUMLAH I								52.160.000
II.	Bahan-bahan								
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	443	Kg	443	8.860.000
	JUMLAH II								8.860.000
III.	Penyediaan Bibit								
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Petai	Batang	125	3.200	Batang	3.688	Batang	3.688	11.801.600
	JUMLAH III								11.801.600
IV.	JUMLAH (I+II+III)								72.821.600
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								72.821.600

C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Tabel 6. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

I. Petak 67C SELATAN		Luas :		30 Ha						
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									43.200.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Petai	Batang	63	3.200	Batang	1.890	Batang	1.890	6.048.000	
JUMLAH III									6.048.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									58.248.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									58.248.000

II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR

Luas : 22,7 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	306	HOK	306	24.480.000
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	8.280.000
JUMLAH I									32.760.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	341	Kg	341	6.820.000
JUMLAH II									6.820.000
III. Penyediaan Bibit									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	33	3.000	Batang	749	Batang	749	2.247.000
-	Petai	Batang	30	3.200	Batang	681	Batang	681	2.179.200
JUMLAH III									4.426.200
IV.	JUMLAH (I+II+III)								44.006.200
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)								44.006.200

III. Petak 69A

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									43.200.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Nangka	Batang	63	3.000	Batang	1.890	Batang	1.890	5.670.000	
JUMLAH III									5.670.000	
JUMLAH (I+II+III)									57.870.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									
		-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									57.870.000

IV. Petak 68E BARAT

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gaji - Upah									
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000
JUMLAH I									43.200.000
II. Bahan-bahan									
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000
JUMLAH II									9.000.000
III. Penyediaan Bibit									
1	Tanaman kayu-kayuan								
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-
2	Tanaman HHBK								
-	Nangka	Batang	63	3.000	Batang	1.890	Batang	1.890	5.670.000
JUMLAH III									5.670.000
IV. JUMLAH (I+II+III)									57.870.000
V. BIAAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAAYA		-	-	-	-	-	-	-	-
VI. TOTAL BIAAYA (IV+V)									57.870.000

V. Petak 69A

Luas : 19 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	257	HOK	257	20.560.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	6.840.000	
JUMLAH I									27.400.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	285	Kg	285	5.700.000	
JUMLAH II									5.700.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Durian	Batang	63	3.200	Batang	1.197	Batang	1.197	3.830.400	
JUMLAH III									3.830.400	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									36.930.400
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									36.930.400

VI. Petak 69B-1 dan 69B-2

- Petak 69B-1
- Petak 69B-2

Luas : 20,5 Ha

Luas : 16,1 Ha

Luas : 4,4 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	277	HOK	277	22.160.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	2	OB	2	7.560.000	
JUMLAH I									29.720.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	308	Kg	308	6.160.000	
JUMLAH II									6.160.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Durian	Batang	49	3.200	Batang	1.005	Batang	1.005	3.216.000	
-	Petai	Batang	14	3.200	Batang	287	Batang	287	918.400	
JUMLAH III									4.134.400	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									40.014.400
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									40.014.400

VII. Petak 69D UTARA

Luas : 30 Ha

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	405	HOK	405	32.400.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									43.200.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	450	Kg	450	9.000.000	
JUMLAH II									9.000.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Petai	Batang	63	3.200	Batang	1.890	Batang	1.890	6.048.000	
JUMLAH III									6.048.000	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									58.248.000
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									58.248.000

VIII. Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F

- Petak 69D SELATAN
- Petak 69E

Luas : 29,5 Ha

Luas : 3,9 Ha

Luas : 12,8 Ha

- Petak 69F

Luas : 12,8

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gaji - Upah										
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	13,5	80.000	HOK	398	HOK	398	31.840.000	
2	Pengawasan / Mandor tanam	OB	0,1	3.600.000	OB	3	OB	3	10.800.000	
JUMLAH I									42.640.000	
II. Bahan-bahan										
1	Pengadaan Pupuk	Kg	15	20.000	Kg	443	Kg	443	8.860.000	
JUMLAH II									8.860.000	
III. Penyediaan Bibit										
1	Tanaman kayu-kayuan									
-		Batang	-	-	Batang	-	Batang	-	-	
2	Tanaman HHBK									
-	Petai	Batang	63	3.200	Batang	1.859	Batang	1.859	5.948.800	
JUMLAH III									5.948.800	
IV.	JUMLAH (I+II+III)									57.448.800
V.	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA									-
VI.	TOTAL BIAYA (IV+V)									57.448.800

D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

No.	Kegiatan	Luas		Total Biaya (Rp.)
1	2	3		4
I. Petak 67C SELATAN				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	187.635.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.800.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	58.248.000
Jumlah I		30,0	Ha	319.683.500
II. Petak 67C UTARA dan 68E TIMUR				
1.	Penanaman (P0)	22,7	Ha	137.343.800
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	22,7	Ha	55.646.400
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	22,7	Ha	44.006.200
Jumlah II		22,7	Ha	236.996.400
III. Petak 69A				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	183.507.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.050.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	57.870.000
Jumlah III		30,0	Ha	314.427.500
IV. Petak 68E BARAT				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	179.147.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.050.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	57.870.000
Jumlah IV		30,0	Ha	310.067.500
V. Petak 69A				
1.	Penanaman (P0)	19,0	Ha	116.389.150
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	19,0	Ha	46.780.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	19,0	Ha	36.930.400
Jumlah V		19,0	Ha	200.099.550
VI. Petak 69B-1 dan 69B-2				
1.	Penanaman (P0)	20,5	Ha	130.421.050
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	20,5	Ha	50.721.600
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	20,5	Ha	40.014.400
Jumlah VI		20,5	Ha	221.157.050
VII. Petak 69D UTARA				
1.	Penanaman (P0)	30,0	Ha	183.275.500
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	30,0	Ha	73.800.000
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	30,0	Ha	58.248.000
Jumlah VII		30,0	Ha	315.323.500

1	2	3	4
VIII.	Petak 69D SELATAN, 69E dan 69F		
1.	Penanaman (P0)	29,5 Ha	180.451.700
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	29,5 Ha	72.821.600
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	29,5 Ha	57.448.800
	Jumlah VIII	29,5 Ha	310.722.100
	Jumlah Total	211,7 Ha	2.228.477.312

Ket : Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk pajak

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (T0) dapat di lihat pada Tabel 8

Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2019

No.	Kegiatan	TAHUN 2019												
		Jan	Feb	Mrt	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Kegiatan													
1	Penentuan Arah Larikan													
2	Pembersihan Lapangan/Pembuatan Jalur													
3	Pemasangan Ajir													
4	Pembuatan Piringan & Lubang Tanam													
5	Penanaman dan Pemupukan													
6	Pembuatan Papan Nama													
7	Pembuatan pondok/gubuk kerja													
8	Penyulaman													
9	Penyiangan dan Pendangiran													
10	Pengawasan/Mandor													
II.	Bahan-bahan													
1	Pengadaan patok arah larikan													
2	Pengadaan Ajir													
3	Pengadaan Papan Petak													
4	Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja													
5	Pengadaan Pupuk													
6	Pengadaan Obat-obatan/Herbisida													
7	Penyediaan Bibit													

B. JADWAL KEGIATAN PEMELIHARAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun pertama (P1) dapat di lihat pada Tabel 9

Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) Tahun 2020

No.	Kegiatan	TAHUN 2019												
		Jan	Feb	Mrt	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Kegiatan													
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman													
2	Penyulaman													
3	Penyiangan													
4	Pendangiran													
5	Pemupukan													
6	Pemberantasan Hama dan Penyakit													
7	Pengawasan/Mandor													
II.	Pengadaan Bahan													
1	Pengadaan Pupuk													
2	Penyediaan Bibit													


B. JADWAL KEGIATAN PEMELIHARAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun kedua (P2) dapat di lihat pada Tabel 10


Tabel 10. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) Tahun 2021

No.	Kegiatan	TAHUN 2019												
		Jan	Feb	Mrt	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Kegiatan													
1	Penyulaman													
2	Penyiangan													
3	Pendangiran													
4	Pemupukan													
5	Pemberantasan Hama dan Penyakit													
6	Pengawasan/Mandor													
II.	Pengadaan Bahan													
1	Pengadaan Pupuk													
2	Penyediaan Bibit													


Gambar 1. Papan Petak

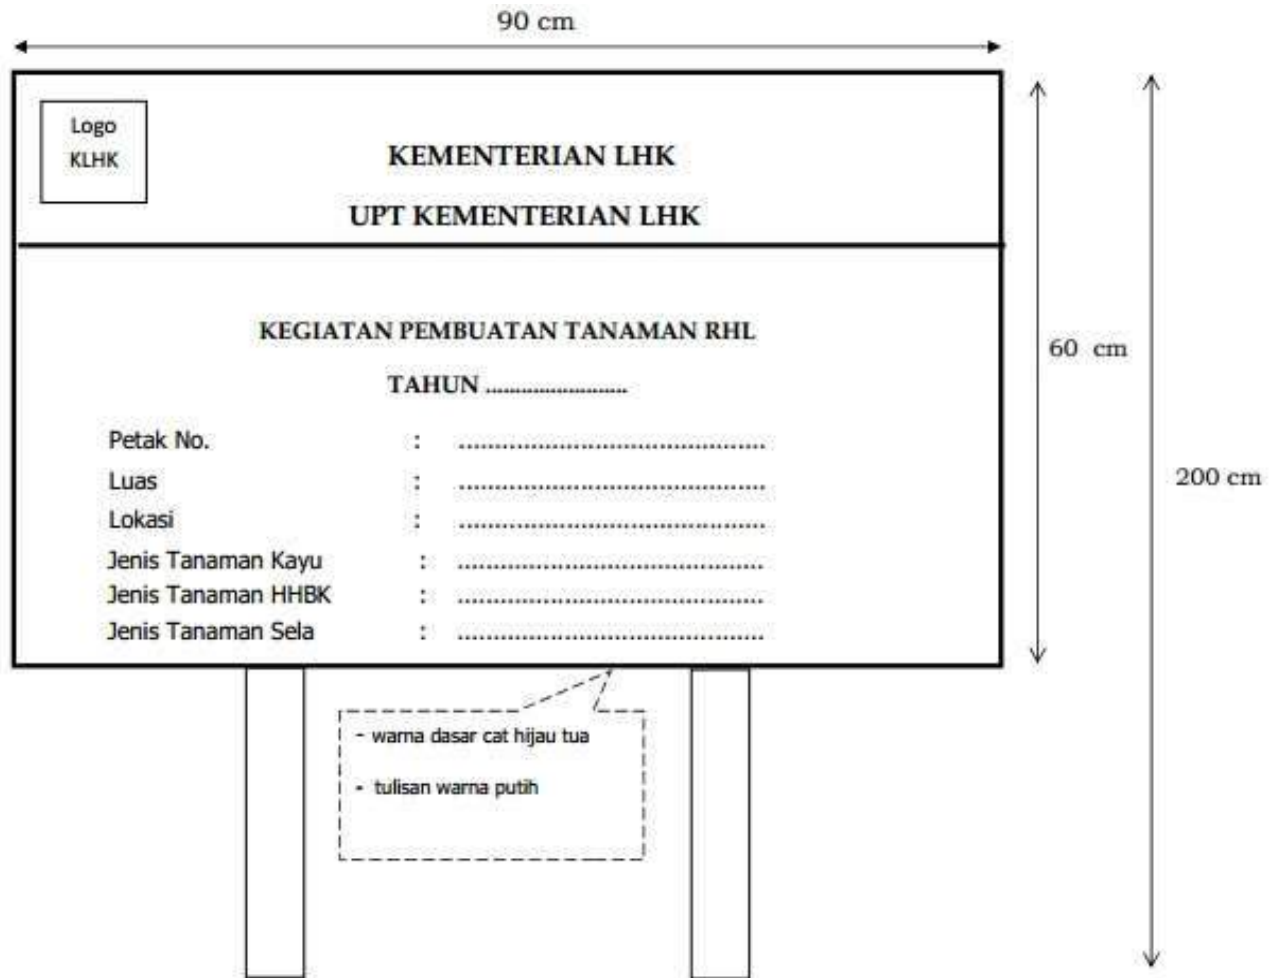


Gambar 2. Papan Blok

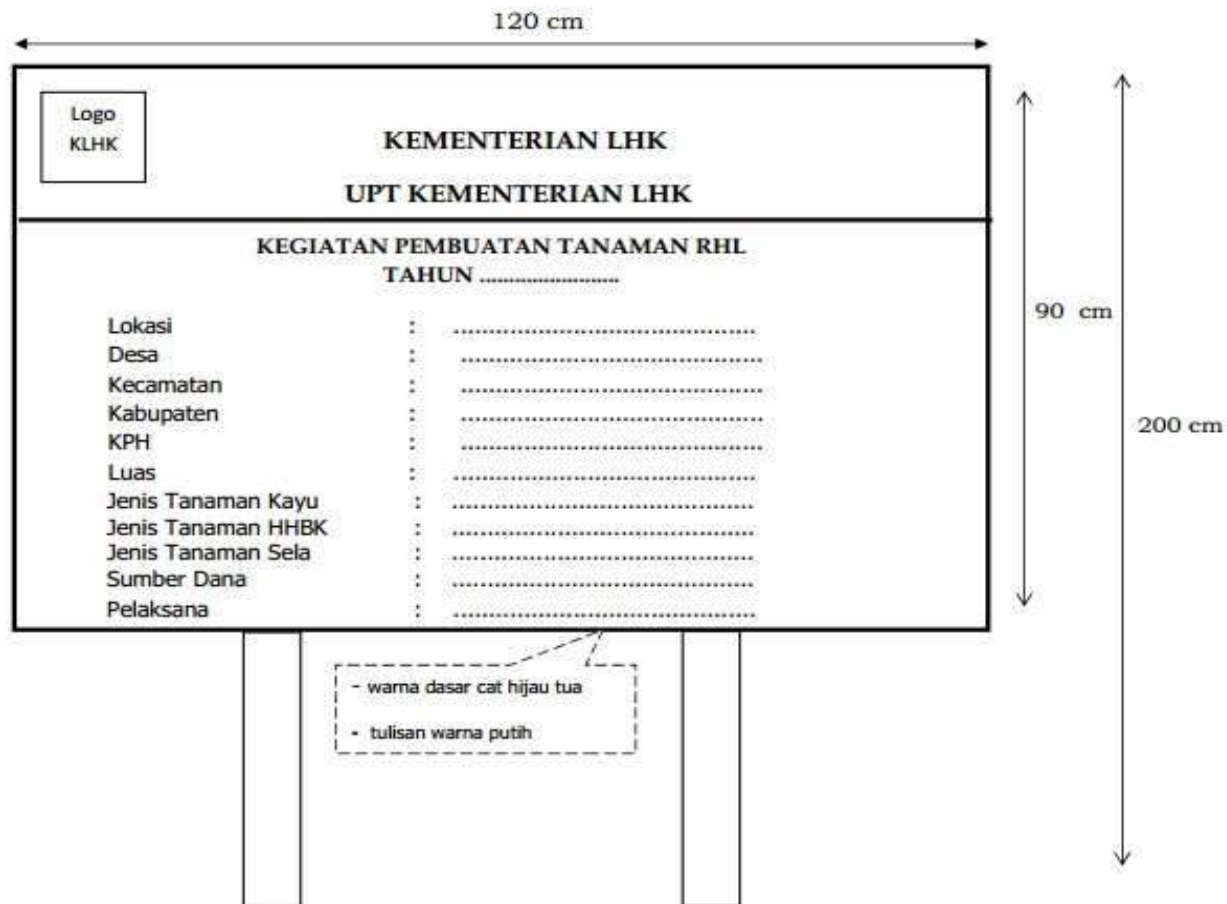


Gambar 3. Gubug Kerja

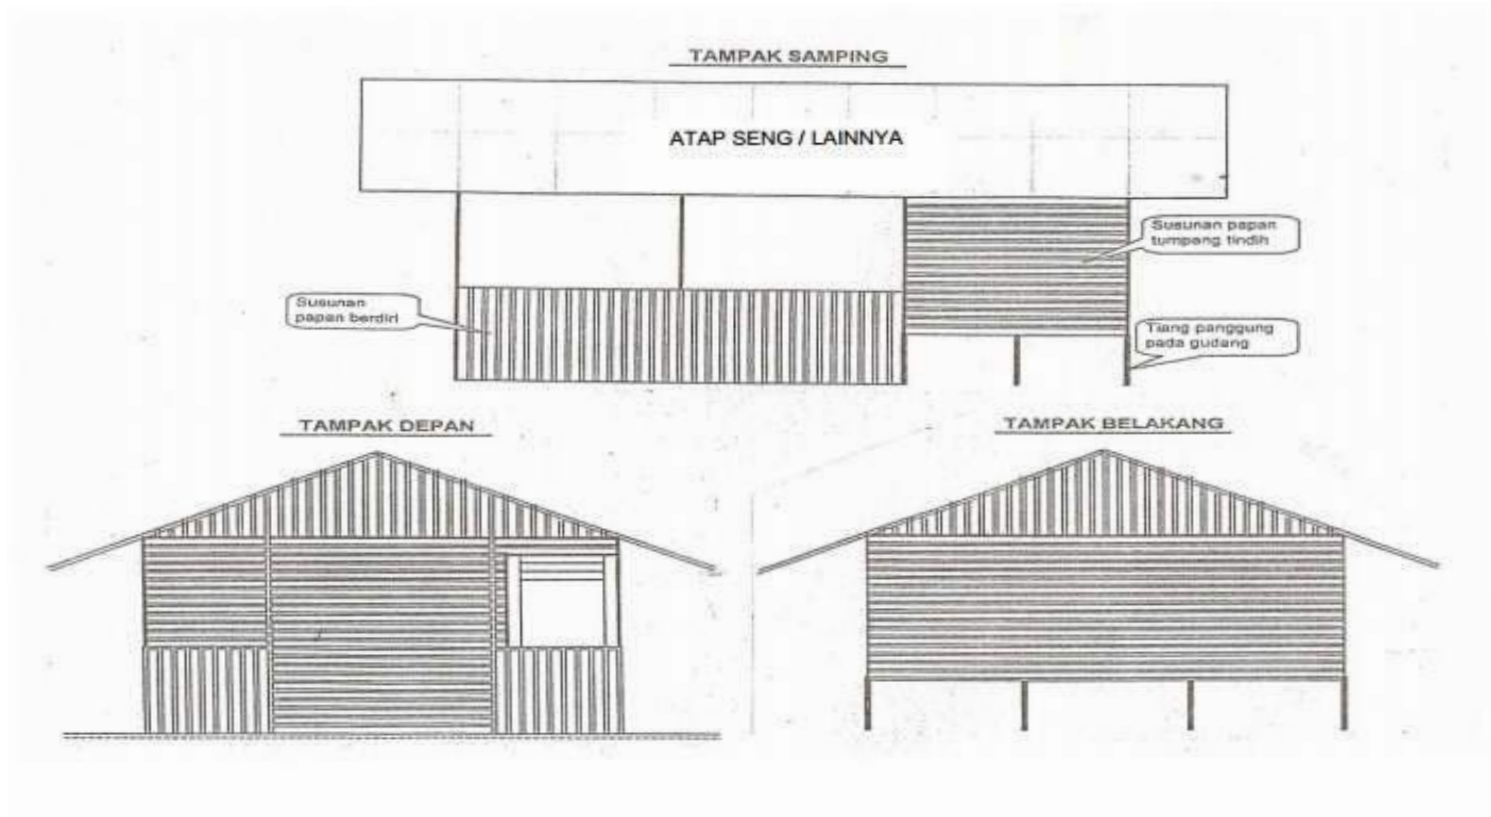

Gambar 4. Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir

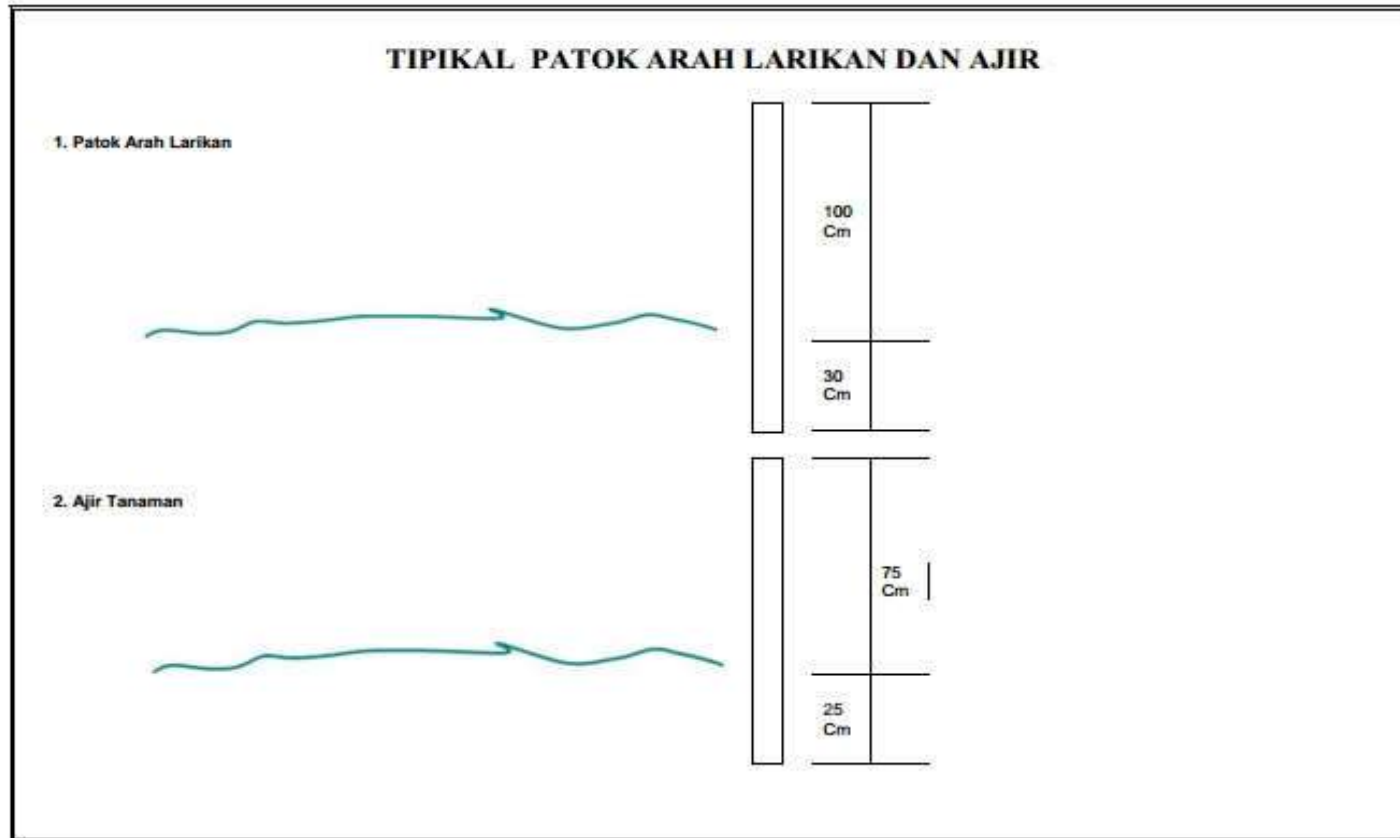

Gambar 5. Lubang Tanam

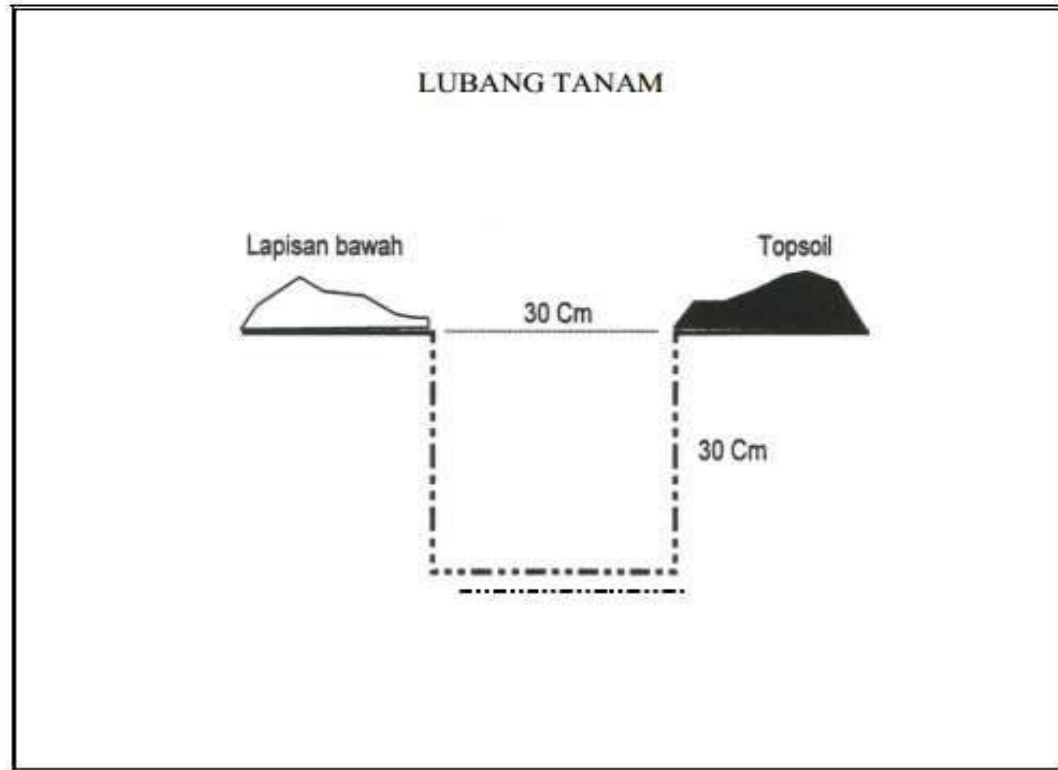

Gambar 6. Cara Menanam Bibit

