



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG**  
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG JENEBERANG SADDANG**

*Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16,5 Makassar, Kode Pos 90243, Telp/Fax. (0411) 554167*

---

**RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN**  
**REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**  
**DAS PRIORITAS**  
**TAHUN 2019**

BLOK : 1  
FUNGSI KAWASAN : HUTAN LINDUNG  
KPHL : SADDANG II  
LOKASI : SALU-SALU  
DESA : LEMBANG BARUPPU SELATAN  
KECAMATAN : BARUPPU  
KABUPATEN : TORAJA UTARA  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
DAS : SADDANG  
LUAS : 120 Ha

---

*Makassar, November 2018*



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN**  
**REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**  
**TAHUN 2019**

**BLOK** : I  
**FUNGSI** : HUTAN LINDUNG  
**K P H L** : SADDANG II  
**LOKASI** : SALU - SALU  
**DESA** : LEMBANG BARUPPU UTARA  
**KECAMATAN** : BARUPPU  
**KABUPATEN** : TORAJA UTARA  
**PROPINSI** : SULAWESI SELATAN  
**D A S** : SADDANG  
**L U A S** : 120 Ha


DISAHKAN :  
KEPALA BPDASHL  
JENEBERANG SADDANG,

  
**ROCHIMAH NUGRAHINI, S.Hut, M.Si**  
NIP. 19691028 199803 2 002


DIKETAHUI :  
KEPALA KPHL SADDANG II,

  
**GAZALI DAMA ICHSAN, SP**  
NIP.19970908 200604 1 007

DINILAI :  
KEPALA SEKSI PROGRAM BPDASHL  
JENEBERANG SADDANG,

  
**AHMAD DIMIYATI, S.Hut,T.,M.Si**  
NIP. 19710307 199203 1 002

DISUSUN :  
TIM PENYUSUN,

  
**SUBIYANTO, S.Hut.**  
NIP. 19770621 199703 1 003



## KATA PENGANTAR

Rancangan teknis kegiatan Penanaman RHL Tahun 2018 ini disusun selain untuk percepatan pelaksanaan fisik pada tahun 2019, juga sebagai arahan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan serta berfungsi sebagai alat kontrol, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Rancangan teknis kegiatan Penanaman RHL Tahun 2019 ini terletak pada lokasi Salu Rea II Desa Lembang Baruppu Selatan Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan seluas 290 Ha, dan berada dalam Kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang akan ditanam pada lokasi ini yaitu Eucalyptus, Buangin, Suren, Cempaka, Aren, Alpukat, Pangi dengan jumlah biaya 3.413.166.000,- melalui pola penanaman Intensif (400 batang/Ha) yang pelaksanaannya direncanakan dengan system kontrak tahun jamak (multiyears).

Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan teknis ini berasal dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan DAS HL Jeneberang Saddang.

Kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari persiapan sampai dengan tersusunnya rancangan kegiatan ini diucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat.

Makassar, Nopember 2018

Kepala Balai,



**ROCHIMAH NUGRAHINI, S.Hut, M.Si**  
NIP. 19691028 199803 2 002



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. RHL menjadi salah satu upaya dalam menangani lahan kritis di Indonesia yang mencapai angka 14 juta hektar (tahun 2018), menahan laju degradasi lahan, dan sedimentasi yang sangat tinggi di Indonesia yang mencapai angka 250 ton/km<sup>2</sup>/tahun.

RHL dihadapkan pada laju degradasi lahan yang cenderung terus meningkat dengan keterbatasan biaya penganggaran. Oleh karena itu kegiatan RHL perlu disusun dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung tingkat keberhasilan kegiatan RHL. Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan kegiatan RHL adalah pada tahap perencanaan.

Perencanaan RHL diawali dari penentuan sasaran lokasi RHL yang diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, daerah tangkapan air (DTA) waduk/dam, dan daerah rawan bencana yang tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air. Sasaran lokasi tersebut selanjutnya ditapis dengan peta penutupan lahan, peta tingkat bahaya erosi, peta perizinan, dan selanjutnya diverifikasi dengan citra satelit resolusi tinggi untuk dapat menentukan sasaran lokasi yang tepat.

Rancangan Kegiatan Penanaman RHL merupakan rancangan tingkat tapak yang mendukung keberhasilan RHL secara keseluruhan, maka perlu disusun Rancangan Kegiatan Penanaman RHL.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman RHL ini adalah sebagai acuan/ pedoman bagi pelaksana kegiatan RHL di lapangan lingkup wilayah kerja BPDASHL Jeneberang Saddang tahun 2019 yang realistis dan mudah dilaksanakan di lapangan yang memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Tujuan Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman ini adalah untuk memudahkan para petugas lapangan untuk melaksanakan pembuatan tanaman RHL, sehingga terselenggara secara efektif, efisien dan berdaya guna.

## **C. SASARAN**

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan penanaman RHL tahun 2019 meliputi Kegiatan Pembuatan Tanaman (PO), Pemeliharaan Tanaman Tahun I dan Pemeliharaan Tanaman Tahun II pada hutan lindung, terdiri dari :

- 1) Tahun Pertama : Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan
- 2) Tahun Kedua : Pemeliharaan Tahun I
- 3) Tahun Ketiga : Pemeliharaan Tahun II
- 4) Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman

## II. RISALAH UMUM

### A. KONDISI BIOFISIK

#### 1. Letak dan Luas

##### a. Letak Administratif

- 1) Blok / Lokasi : I / Salu-salu
- 2) Desa : Lembang Baruppu Selatan
- 3) Kecamatan : Baruppu
- 4) Kabupaten : Toraja Utara
- 5) Propinsi : Sulawesi Selatan

##### b. Letak Geografis

Secara hidrologis, lokasi terletak pada DAS Saddang, batas sebelah utara berbatasan dengan desa Sulawesi Barat, sebelah selatan berbatasan dengan desa Baruppu Selatan, sebelah barat berbatasan dengan desa Baruppu Bente dan sebelah timur berbatasan dengan desa Tetteuma, dengan koordinat geografis BT  $119^{\circ}46'0''-119^{\circ}46'30''$  LS  $2^{\circ}49'0''-2^{\circ}50'0''$

##### c. Luas lokasi : 120 Ha

## 2. Penutupan Lahan

a. Tanah kosong	: 7,5	Ha
b. Semak belukar	: 32	Ha
c. Kebun Campuran	: 6,2	Ha
d. Pertanian lahan kering	: 23	Ha
e. Sawah	: 58	Ha
f. dll	: 42	Ha

3. Ketinggian Tempat adalah 1.517 meter dpl, dengan topografi berbukit.

## **B. KONDISI SOSIAL EKONOMI**

### 1. Demografi

a. Jumlah Penduduk	: 1.517	jiwa
b. Jumlah Laki-laki	: 803	jiwa
c. Jumlah Perempuan	: 781	jiwa
d. Jumlah usia produktif	: 185	jiwa

### 2. Aksesibilitas

a. Jarak ke Kota Kecamatan	: 3	Km
b. Jarak ke Kota Kabupaten	: 43	Km

c. Jarak ke Kota Propinsi : 260 Km

### 3. Mata Pencaharian

a. PNS/ TNI/POLRI : 7 Jiwa

b. Petani : 21 Jiwa

c. Buruh Tani : 13 Jiwa

d. Pedagang : 30 Jiwa

e. Dll : 23 Jiwa

### 4. Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman RHL tahun 2019 akan dilaksanakan secara kontraktual dengan melibatkan tenaga kerja/kelompok tani setempat dan diutamakan yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

### 5. Sosial Budaya

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga telah cukup akrab dengan hal bercocok tanam serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Dimana hal itu akan berdampak baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.



## 6. Kelembagaan Masyarakat

Lembaga formal dan informal yang ada antara lain : Badan Pengembangan Desa (BPD), Kelompok Tani, Dasa Wisma, PKK. Lembaga-lembaga tersebut memberi pengaruh yang berbeda terhadap masyarakat, sebaliknya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut juga berbeda.

Lembaga masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan penanaman RHL tahun 2019 yaitu kelompok tani/ kelompok kerja masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

### III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

#### A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

##### 1. Lokasi Persemaian

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di persemaian pada lokasi penanaman pada koordinat 119°49'30" BT dan 2°46'0" LS.

##### 2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Tabel 1 Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL.

No.	KOMPOSISI JENIS TANAMAN	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan			Total (Btg)
		Satuan	Volume	Penanaman (P0) termasuk Sulaman 10 %	Pemeliharaan Tanaman Tahun I (P1) (Bibit Sulaman 20 %)	Pemeliharaan Tanaman Tahun II (P2) (Bibit Sulaman 10 %)	
<b>III.</b>	<b>PENYEDIAAN BIBIT</b>						
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>						
	* Eucalyptus	Batang	74,00	8.880	1.680	840	11.400
	* Buangin	Batang	74,00	8.880	1.680	840	11.400
	* Suren	Batang	73,00	8.760	1.560	840	11.160
	* Cempaka	Batang	73,00	8.760	1.560	840	11.160
2	<i>Tanaman HHBK :</i>						
	* Aren	Batang	102,00	12.240	2.160	1.080	15.480
	* Alpukat	Batang	44,00	5.280	960	360	6.600
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>52.800</b>	<b>9.600</b>	<b>4.800</b>	<b>67.200</b>

## **B. RANCANGAN PENANAMAN**

### **1. Penyiapan Lahan**

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, fisik, pengelolaan dan faktor sosial serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang besar.

#### **Spesifikasi Pekerjaan Penyiapan Lahan**

##### **a. Persiapan**

- Lokasi dan luas penyiapan lahan didasarkan pada hasil inventarisasi dan rancangan pembagian blok dan petak.
- Teknik penyiapan lahan didasarkan pada kondisi fisik, kelerengan dan tipe penutupan lahan.
- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam.
- Penyiapan lahan untuk jalur-jalur tanaman dilaksanakan dengan cara membat rumput dan gulma serta belukar selebar 1 meter. Jarak antar sumbu jalur disesuaikan dengan jarak tanaman dengan arah utara selatan atau mengikuti kontur.
- Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada musim kemarau
- Pada sistem tanam jalur, jalur-jalur tanam dirancang tidak terputus dan rancangan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam.



b. Pelaksanaan

1) Pembentukan satuan unit kerja penyiapan lahan

- Satuan kerja unit lahan beranggotakan minimal 5 orang
- dua anggota regu, bertugas membuat dan membuka rintisan jalur
- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rintisan jalur tanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- dua anggota regu bertugas membuat ajir dan memasang ajir pada lubang tanam sepanjang jalur.

2) Persiapan Peralatan Kerja

- Penyiapan peta kerja penyiapan lahan 1 : 10.000
- Persiapan peralatan kerja antara lain : parang/golok, cangkul, papan tanda dan perlengkapan logistik lainnya.

3) Perencanaan Kerja

- Menentukan lokasi blok dan petak kerja rehabilitasi hutan kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Membuat peta kerja detail penyiapan lahan
- Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan

4) Pelaksanaan

- Mencari tanda jalur penanaman yang akan dibuat
- Membuat rintisan jalur bersih/tanaman selebar 1 meter.
- Pada setiap ujung jalur diberi tanda patok kayu diameter 5 cm dengan tinggi 130 cm.
- Menentukan lokasi lubang tanaman sebanyak 400 sampai dengan 1.100 lubang/ha dan menandai lubang tanam dengan ajir.

5) Pencatatan dan pelaporan meliputi pekerjaan:

- Nama lokasi blok dan petak kerja.
- Jumlah jalur tanam pembuatan rehabilitasi hutan.
- Rencana jenis dan jumlah tanaman pada masing-masing petak.
- Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.
- Buku register diisi setiap hari kegiatan
- Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab satuan unit kerja penyiapan lahan.
- Laporan kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap.
- Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah petak dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan.

## 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan serta tenaga kerja sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL.

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun I (P1)	Pemeliharaan Tahun II (P2)
<b>II.</b>	<b>BAHAN-BAHAN</b>				
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	6.000,00	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	48.000,00	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	5,00	-	-
4	Pengadaan bahan gubuk kerja	Unit	2,00	-	-
5	Pengadaan pupuk :				
	* Pupuk Kompos	Kg	6.000,00	-	-
	* Pupuk NPK Tablet	Kg	780,00	1.380,00	1.200,00
6	Pengadaan Obatobatan/ Herbisida	Paket	1,00	-	-
7	pengadaan bahan/ peralatan kerja	Paket	1,00	-	-



### 3. Penanaman

#### a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL.

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun I (P1)	Pemeliharaan Tahun II (P2)
<b>I. PERSIAPAN LAHAN</b>					
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	660,00	-	-
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan tanaman	HOK	840,00	-	-
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja	HOK	129,60	-	-
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	720,00	-	-
5	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	-	120,00	-
6	Pemeliharaan tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman)	HOK	960,00	-	-
7	Penyulaman	HOK	-	240,00	-
8	Pembuatan/ Penyempurnaan Teknik KTA berbasis lahan	HOK	1.440,00	-	-
9	Penyiangan, pendangiran, pemupukan, Pengendalian ham/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (3x)	HOK	-	1.440,00	-
10	Penyulaman serta Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah	HOK	-	-	1.440,00
11	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	12,00	12,00	12,00
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>					
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	6.000,00	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	48.000,00	-	-
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	5,00	-	-
4	Pengadaan bahan gubuk kerja	Unit	2,00	-	-
5	Pengadaan pupuk :				
	* Pupuk Kompos	Kg	6.000,00	-	-
	* Pupuk NPK Tablet	Kg	780,00	1.380,00	1.200,00
6	Pengadaan Obatobatan/ Herbisida	Paket	1,00	-	-
7	pengadaan bahan/ peralatan kerja	Paket	1,00	-	-
<b>III. PENYEDIAAN BIBIT</b>					
1	Tanaman Kayu-Kayuan :				
	* Eucalyptus	Batang	8.880	1.680	840
	* Buangin	Batang	8.880	1.680	840
	* Suren	Batang	8.760	1.560	840
	* Cempaka	Batang	8.760	1.560	840
2	Tanaman HHBK :				
	* Aren	Batang	12.240	2.160	1.080
	* Alpukat	Batang	5.280	960	360

## **b. Teknik Pelaksanaan**

- 1) Pembentukan satuan unit kerja Distribusi Bibit dan Penanaman
- 2) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- 3) Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam.
- 4) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan perlengkapan logistik lainnya.
- 5) Menentukan lokasi blok dan petak kerja penanaman.
- 6) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit.
- 7) Membuat peta kerja detail penanaman.
- 8) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- 9) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman.

## **c. Pelaksanaan**

- 1) Melakukan distribusi bibit.
- 2) Membersihkan piringan dan menggali lubang tanam yang telah ditandai ajir.
- 3) Melakukan penanaman.

**d. Pencatatan dan pelaporan.**

- 1) Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut:
- 2) Nama lokasi blok dan petak kerja.
- 3) Jumlah jalur tanam rehabilitasi hutan.
- 4) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada masing-masing petak.
- 5) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

**C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN**

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
2. Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
3. Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.

**Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan**

- 1) Penyulaman



Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama, dan tahun kedua.

2) Penyiangan dan pendangiran

Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan.

3) Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik (kompos) dengan dosis 0,125 kg/ btg dan pupuk anorganik (NPK Tablet) dengan dosis 1-2 biji/ btg pertanaman. Pemupukan pada tahun berjalan dilakukan 3 (tiga) kali, tahun kedua dan tahun ketiga dilakukan 3 (tiga) kali.

4) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman.

## IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

### A. PEMBUATAN TANAMAN (PO)

Tabel 4 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (PO)

No.	Jenis Kegiatan	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
<b>I. GAJI-UPAH</b>									
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	90.000	HOK	660,00	HOK	660,00	59.400.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan tanaman	HOK	7,00	90.000	HOK	840,00	HOK	840,00	75.600.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja	HOK	1,08	90.000	HOK	129,60	HOK	129,60	11.664.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	90.000	HOK	720,00	HOK	720,00	64.800.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman (3x))	HOK	8,00	90.000	HOK	960,00	HOK	960,00	86.400.000
6	Pembuatan/ Penyempurnaan Teknik KTA berbasis lahan	HOK	12,00	90.000	HOK	1.440,00	HOK	1.440,00	129.600.000
7	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	0,10	4.000.000	OB	12,00	OB	12,00	48.000.000
<b>JUMLAH I</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>475.464.000</b>
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>									
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	2.500	Patok	6.000,00	Patok	6.000,00	15.000.000
2	Pengadaan ajir	Batang	400,00	400	Batang	48.000,00	Batang	48.000,00	19.200.000
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	0,04	600.000	Unit	5,00	Unit	5,00	3.000.000
4	Pengadaan bahan gubuk kerja	Unit	0,02	3.400.000	Unit	2,00	Unit	2,00	6.800.000
5	Pengadaan pupuk :								
	* Pupuk Kompos	Kg	50,00	2.000	Kg	6.000,00	Kg	6.000,00	12.000.000
	* Pupuk NPK Tablet	Kg	6,50	20.000	Kg	780,00	Kg	780,00	15.600.000
6	Pengadaan Obatobatan/ Herbisida	Paket	1,00	7.800.000	Paket	1,00	Paket	1,00	7.800.000
7	pengadaan bahan/ peralatan kerja	Paket	0,02	9.600.000	Paket	1,00	Paket	1,00	9.600.000
<b>JUMLAH II</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>89.000.000</b>
<b>III. PENYEDIAAN BIBIT</b>									
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>								
	* Eucalyptus	Batang	74,00	4.000	Batang	8.880,00	Batang	8.880,00	35.520.000
	* Buangin	Batang	74,00	4.000	Batang	8.880,00	Batang	8.880,00	35.520.000
	* Suren	Batang	73,00	4.000	Batang	8.760,00	Batang	8.760,00	35.040.000
	* Cempaka	Batang	73,00	4.000	Batang	8.760,00	Batang	8.760,00	35.040.000
2	<i>Tanaman HHBK :</i>								
	* Aren	Batang	102,00	4.400	Batang	12.240,00	Batang	12.240,00	53.856.000
	* Alpukat	Batang	44,00	4.400	Batang	5.280,00	Batang	5.280,00	23.232.000
<b>JUMLAH III</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>218.208.000</b>
<b>JUMLAH BIAYA SWAKELOLA</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>782.672.000</b>
<b>VI. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10 %)</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>78.267.200</b>
<b>JUMLAH BIAYA KONTRAKTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>860.939.200</b>
<b>VIII. PEMBULATAN</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>860.939.000</b>

## B. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

Tabel 5 Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)

No.	Jenis Kegiatan	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
<b>I. GAJI-UPAH</b>									
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	1,00	90.000	HOK	120,00	HOK	120,00	10.800.000
2	Peyulaman	HOK	2,00	90.000	HOK	240,00	HOK	240,00	21.600.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukan, Pengendalian ham/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (3x)	HOK	12,00	90.000	HOK	1.440,00	HOK	1.440,00	129.600.000
4	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	0,10	4.000.000	OB	12,00	OB	12,00	48.000.000
<b>JUMLAH I</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>210.000.000</b>
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>									
1	Pengadaan pupuk NPK Tablet	Kg	11,50	20.000	Kg	1.380,00	Kg	1.380,00	27.600.000
<b>JUMLAH II</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>27.600.000</b>
<b>III. PENYEDIAAN SULAMAN (20 %)</b>									
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>								
	* Eucalyptus	Batang	14,00	4.000	Batang	1.680,00	Batang	1.680,00	6.720.000
	* Buangin	Batang	14,00	4.000	Batang	1.680,00	Batang	1.680,00	6.720.000
	* Suren	Batang	13,00	4.000	Batang	1.560,00	Batang	1.560,00	6.240.000
	* Cempaka	Batang	13,00	4.000	Batang	1.560,00	Batang	1.560,00	6.240.000
2	<i>Tanaman HHBK :</i>								
	* Aren	Batang	18,00	4.400	Batang	2.160,00	Batang	2.160,00	9.504.000
	* Alpukat	Batang	8,00	4.400	Batang	960,00	Batang	960,00	4.224.000
<b>JUMLAH III</b>									<b>39.648.000</b>
<b>V. JUMLAH BIAYA SWAKELOLA</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>277.248.000</b>
<b>VI. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10 %)</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>27.724.800</b>
<b>VII. JUMLAH BIAYA KONTRAKTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>304.972.800</b>
<b>VIII. PEMBULATAN</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>304.972.000</b>



### C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Tabel 6 Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

No.	Jenis Kegiatan	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
<b>I. GAJI-UPAH</b>									
1	Penyulaman serta Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah	HOK	12,00	90.000	HOK	1.440,00	HOK	1.440,00	129.600.000
2	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	0,10	4.000.000	OB	12,00	OB	12,00	48.000.000
<b>JUMLAH I</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>177.600.000</b>
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>									
1	Pengadaan pupuk NPK Tablet	Kg	10,00	20.000	Kg	1.200,00	Kg	1.200,00	24.000.000
<b>JUMLAH II</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>24.000.000</b>
<b>III. PENYEDIAAN SULAMAN (10 %)</b>									
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>								
	* Eucalyptus	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
	* Buangin	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
	* Suren	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
	* Cempaka	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
2	<i>Tanaman HHBK :</i>								
	* Aren	Batang	9,00	4.400	Batang	1.080,00	Batang	1.080,00	4.752.000
	* Alpukat	Batang	3,00	4.400	Batang	360,00	Batang	360,00	1.584.000
<b>JUMLAH III</b>									<b>19.776.000</b>
<b>V. JUMLAH BIAYA SWAKELOLA</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>221.376.000</b>
<b>VI. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10 %)</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>22.137.600</b>
<b>VII. JUMLAH BIAYA KONTRAKTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>243.513.600</b>
<b>VIII. PEMBULATAN</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>243.513.000</b>

#### D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel 7 Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

No.	Kegiatan	Luas		Total Biaya
		Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1.	Penanaman (P0)	120	Ha	860.939.000
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	120	Ha	304.972.000
3.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P2)	120	Ha	243.513.000
<b>J U M L A H</b>		-	-	<b>1.409.424.000</b>

## V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (T0) dapat di lihat pada Tabel dibawah ini :

#### 1. Kegiatan Penanaman (P0)

Tabel 8 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2019

No.	Jenis Kegiatan	Tahun												Ket.
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	
<b>I.</b>	<b>KEGIATAN</b>													
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan													
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan tanaman													
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja													
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan													
5	Pemeliharaan tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman)													
6	Pembuatan/ Penyempurnaan Teknik KTA berbasis lahan													
7	Pengawasan/ Mandor tanam													
<b>II.</b>	<b>BAHAN-BAHAN</b>													
1	Pengadaan patok arah larikan													
2	Pengadaan ajir													
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama													
4	Pengadaan bahan gubuk kerja													
5	Pengadaan pupuk :													
	* Pupuk Kompos													
	* Pupuk NPK Tablet													
6	Pengadaan Obatobatan/ Herbisida													
7	pengadaan bahan/ peralatan kerja													
<b>III.</b>	<b>PENYEDIAAN BIBIT</b>													
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>													
	* Eucalyptus													
	* Buangin													
	* Suren													
	* Cempaka													
2	<i>Tanaman HHBK :</i>													
	* Aren													
	* Alpukat													

## 2. Pemeliharaan Tanaman Tahun I (P1)

Tabel 9 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Tahun												Ket.
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	
<b>I.</b>	<b>KEGIATAN</b>													
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman													
2	Peyulaman													
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukan, Pengendalian ham/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah													
4	Pengawasan/ Mandor tanam													
<b>II.</b>	<b>BAHAN-BAHAN</b>													
1	Pengadaan pupuk NPK Tablet													
<b>III.</b>	<b>PENYEDIAAN SULAMAN (20 %)</b>													
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>													
	* Eucalyptus													
	* Buangin													
	* Suren													
	* Cempaka													
2	<i>Tanaman HHBK :</i>													
	* Aren													
	* Alpukat													

### 3. Pemeliharaan Tanaman Tahun III (P2)


Tabel 10 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P2) Tahun 2021

No.	Jenis Kegiatan	Tahun												Ket.
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	
<b>I.</b>	<b>KEGIATAN</b>													
1	Penyulaman serta Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah													
2	Pengawasan/ Mandor tanam													
<b>II.</b>	<b>BAHAN-BAHAN</b>													
1	Pengadaan pupuk NPK Tablet													
<b>III.</b>	<b>PENYEDIAAN SULAMAN (10 %)</b>													
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>													
	* Eucalyptus													
	* Buangin													
	* Suren													
	* Cempaka													
2	<i>Tanaman HHBK :</i>													
	* Aren													
	* Alpukat													




## **Lampiran- Lampiran**


**Gambar 1. Papan Nama Blok**

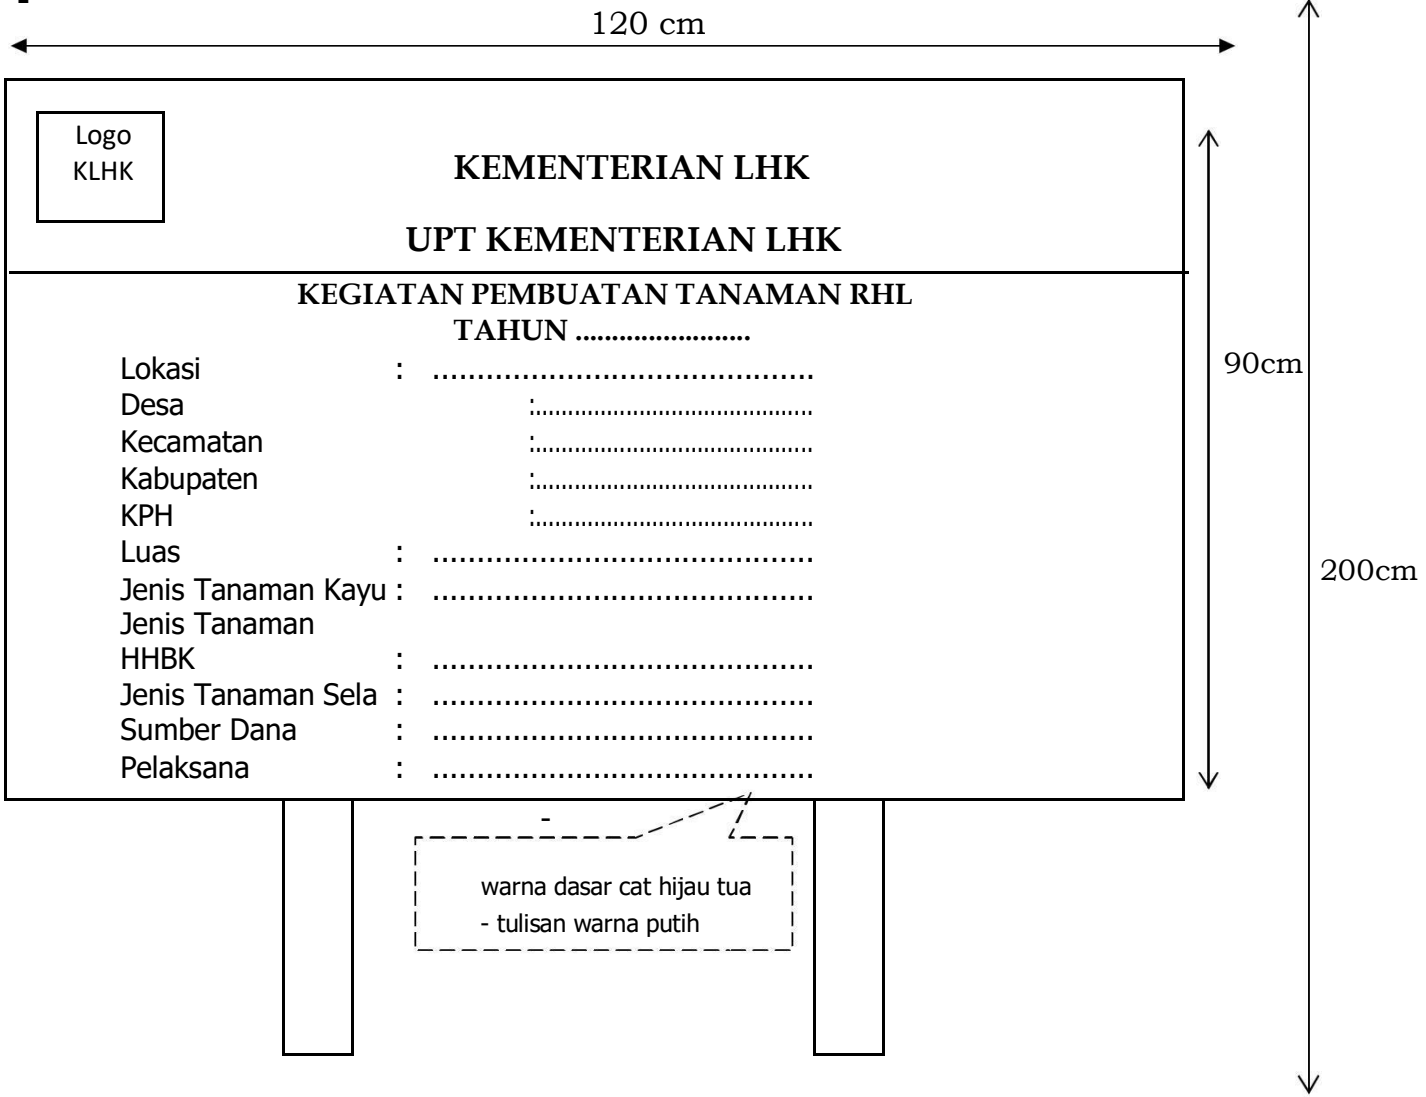


**Gambar 2. Papan Petak**

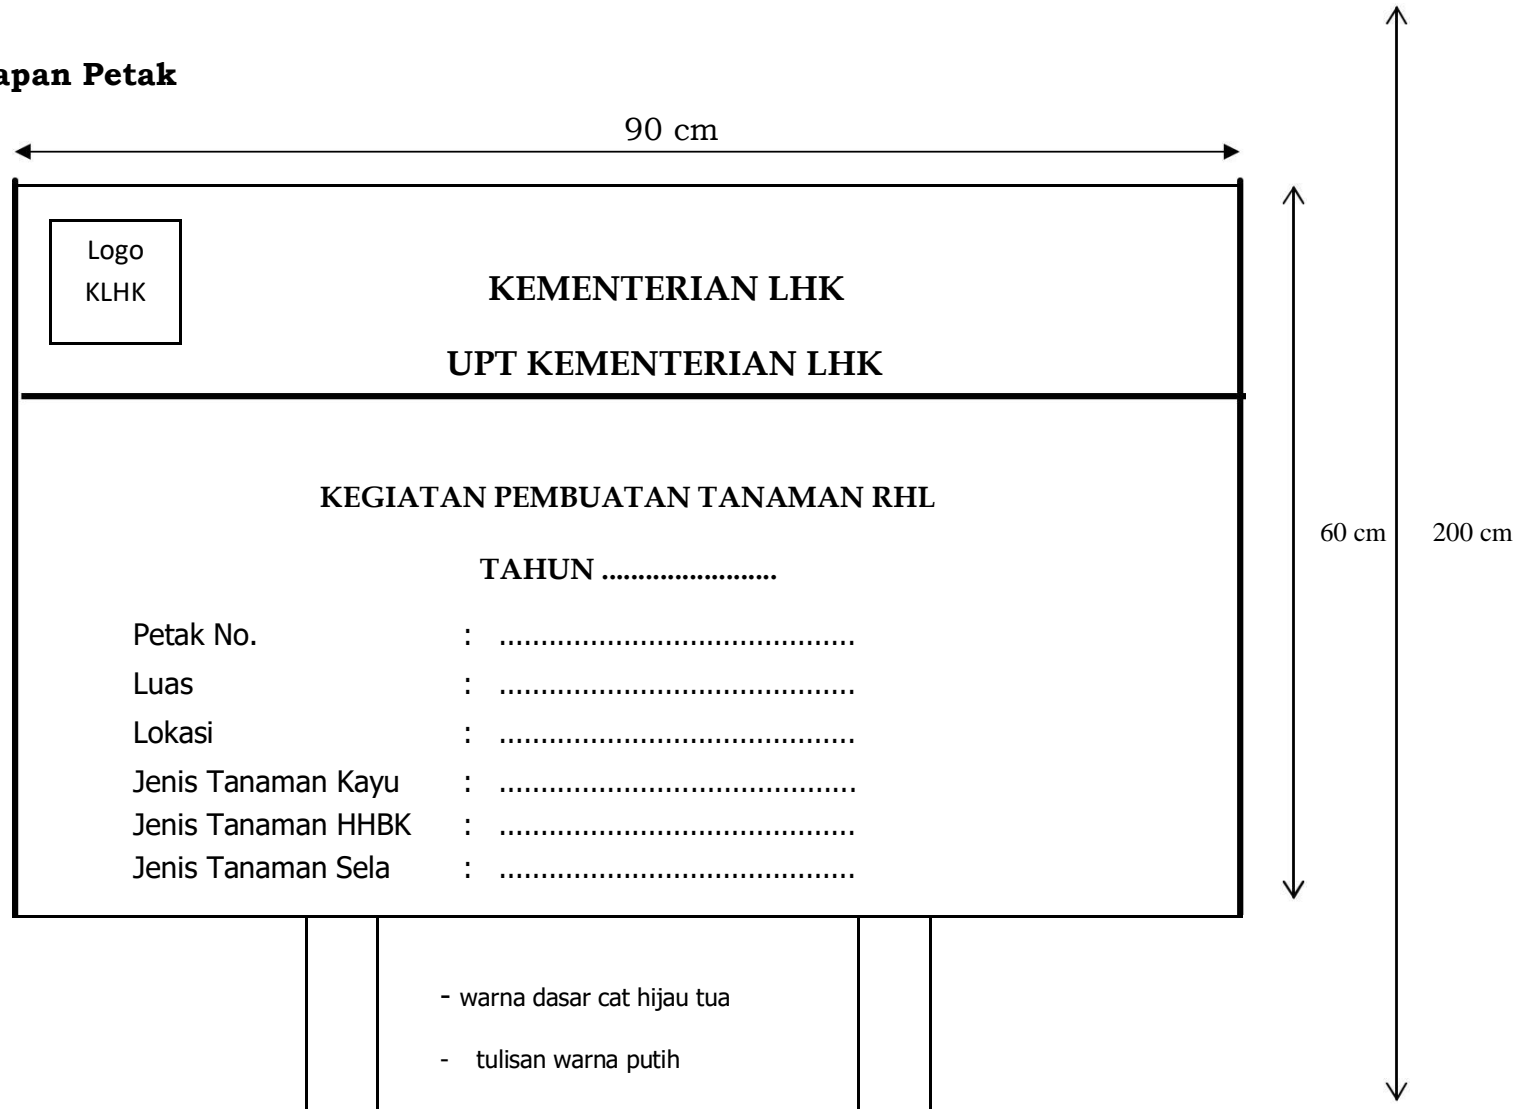


**Gambar 3. Gubuk Kerja**

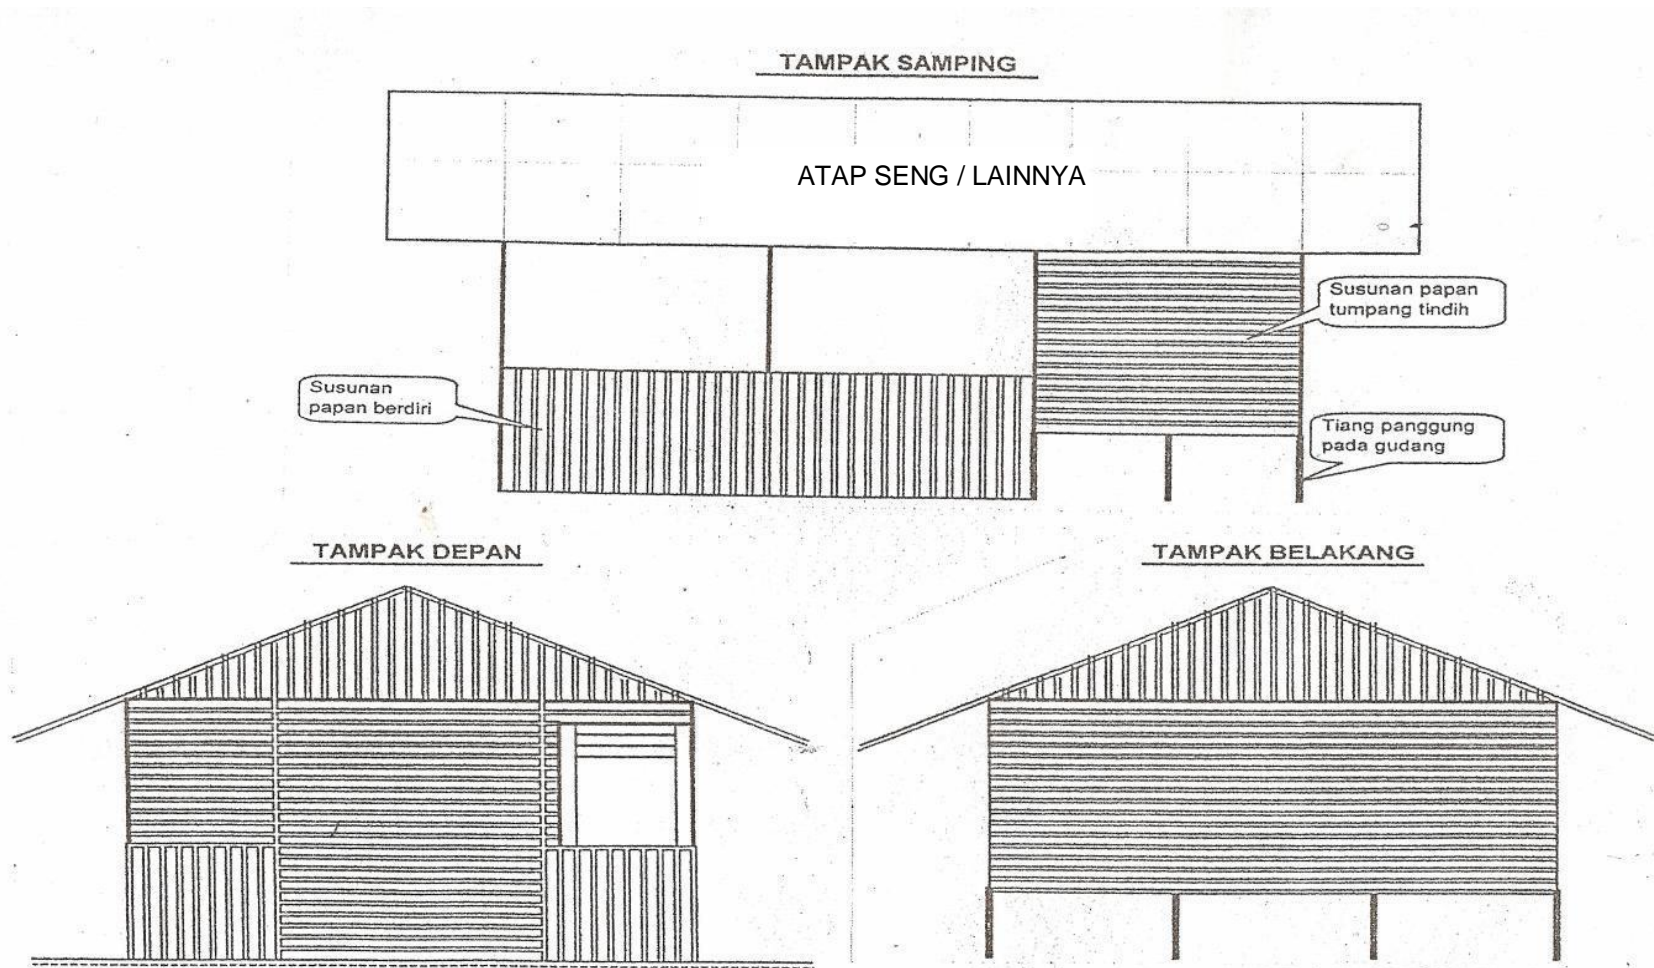

**Gambar 4 Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir**

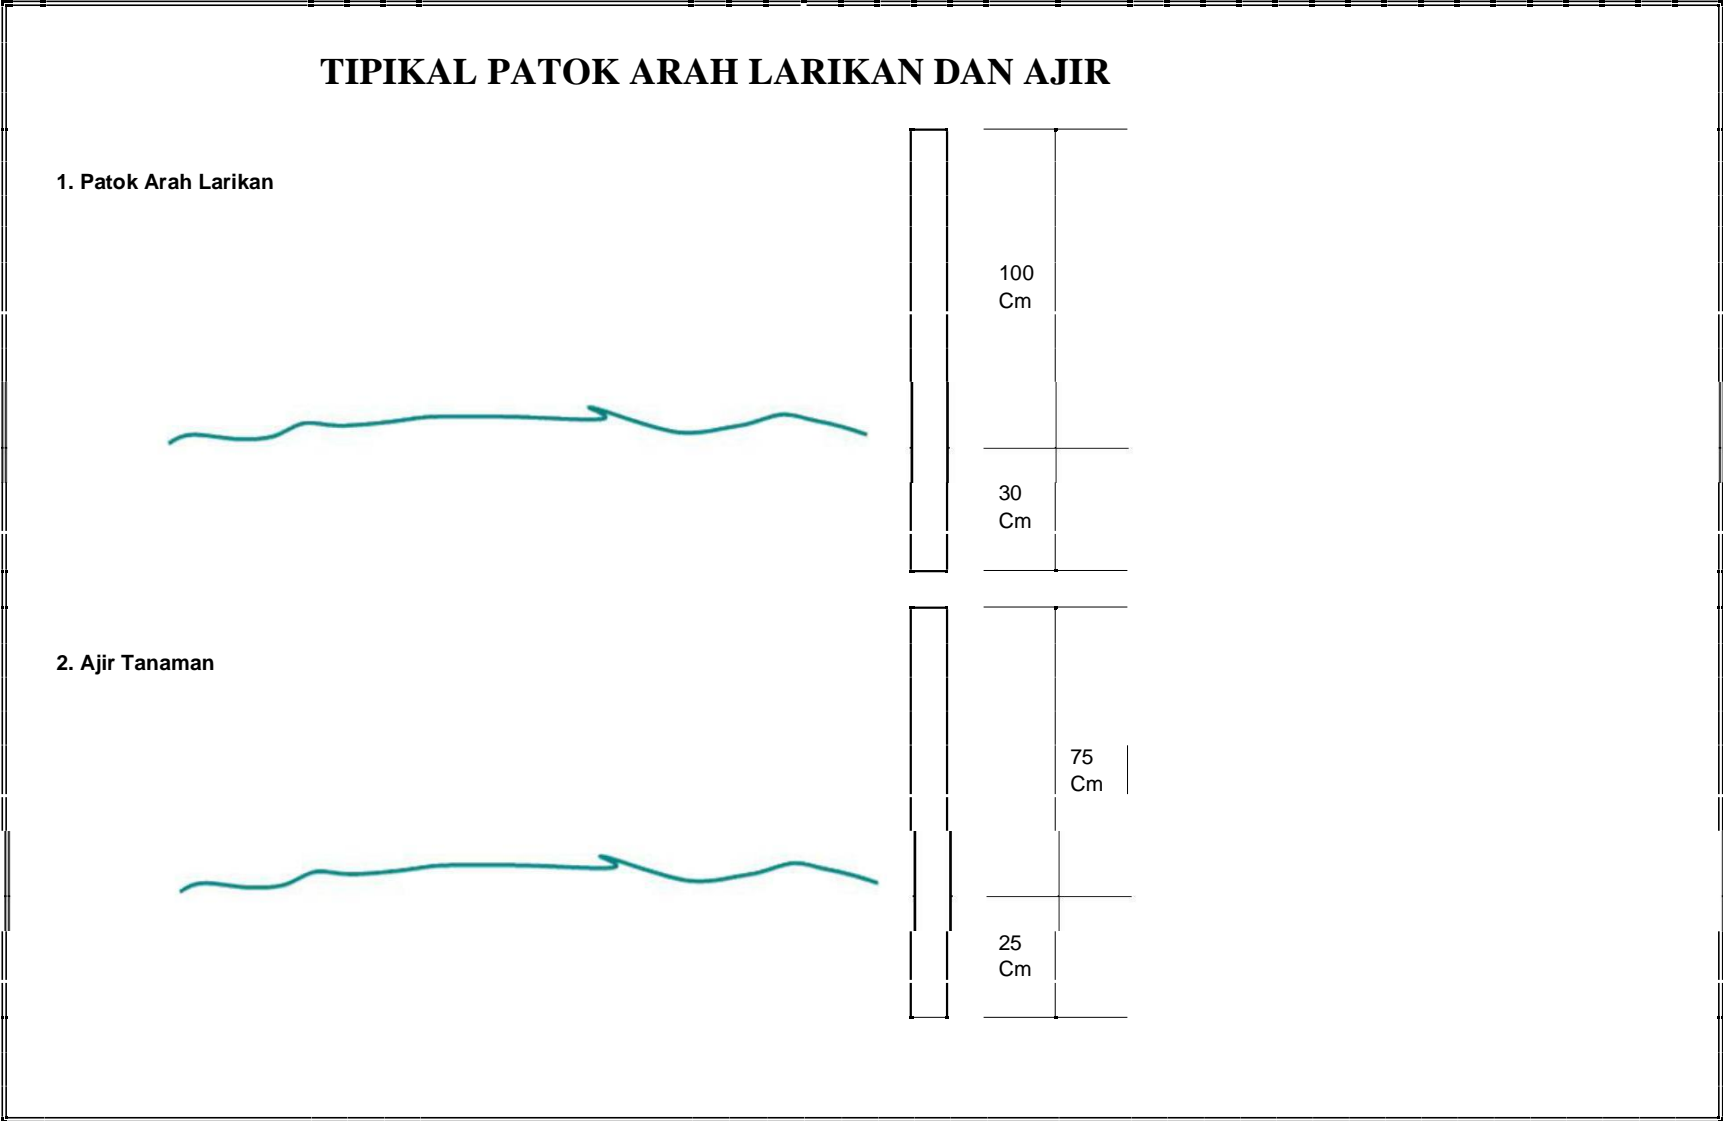


**Gambar 5 Lubang Tanam**

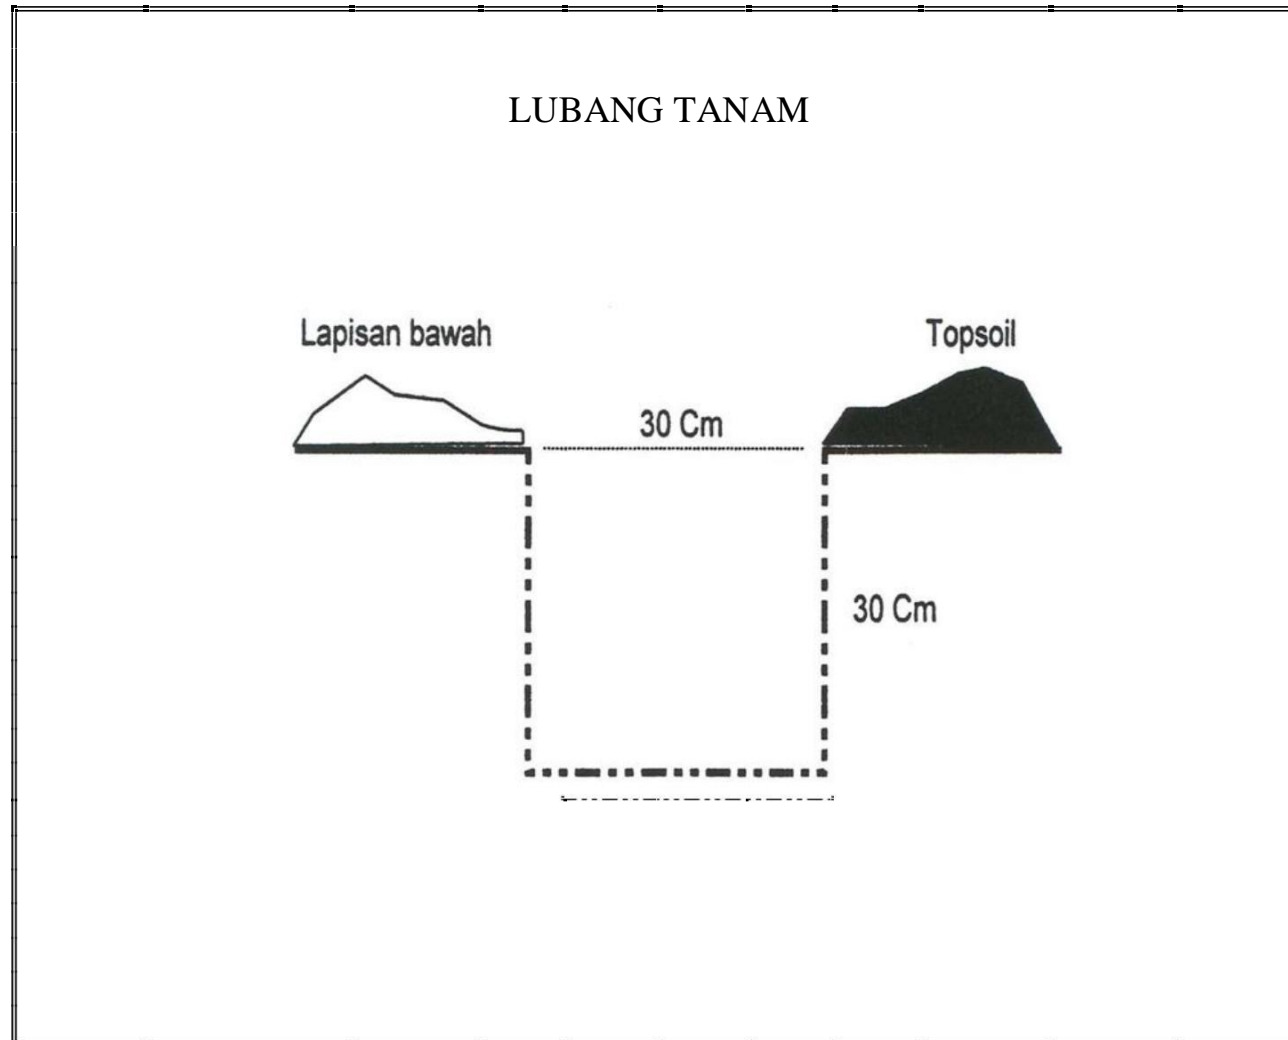




**Gambar 6 Cara Menanam Bibit**

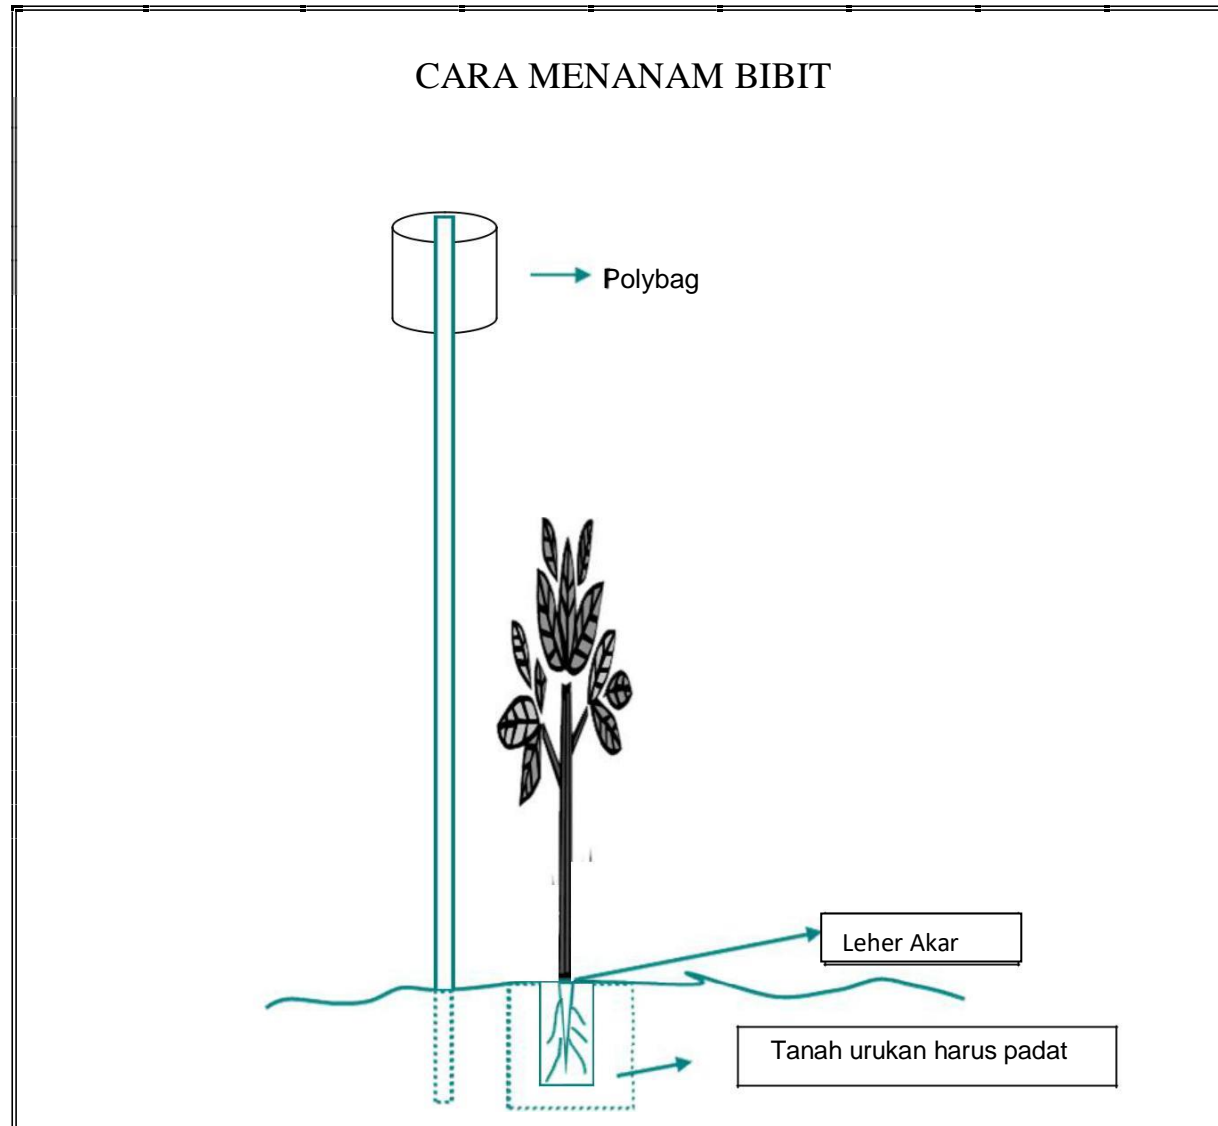






**PETA RANCANGAN KEGIATAN  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
DAS PRIORITAS  
TAHUN 2019**

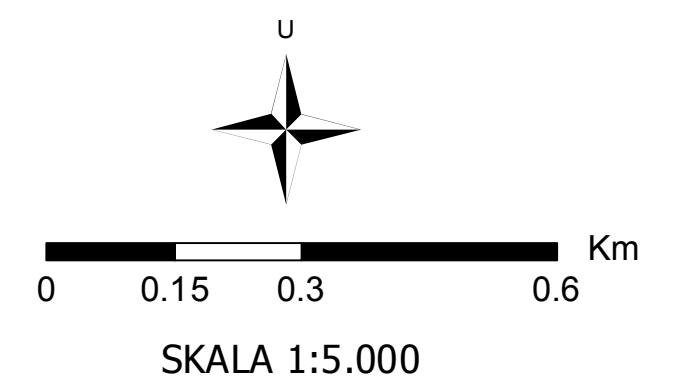

BLOK : I  
 FUNGSI KAWASAN : HUTAN LINDUNG  
 KPH : SADDANG II  
 LOKASI : SALU SALU  
 DESA : LEMBANG BARUPPU SELATAN  
 KECAMATAN : BARUPPU  
 KABUPATEN : TORAJA UTARA  
 PROVINSI : SUL-SEL  
 DAS : SADDANG  
 LUAS : 120 Ha

**KETERANGAN :**

- Sungai
- Gubuk Kerja
- Patok Luar
- Patok Bantu
- Persemaian
- Lokasi RHL Agroforestry
- Batas Petak

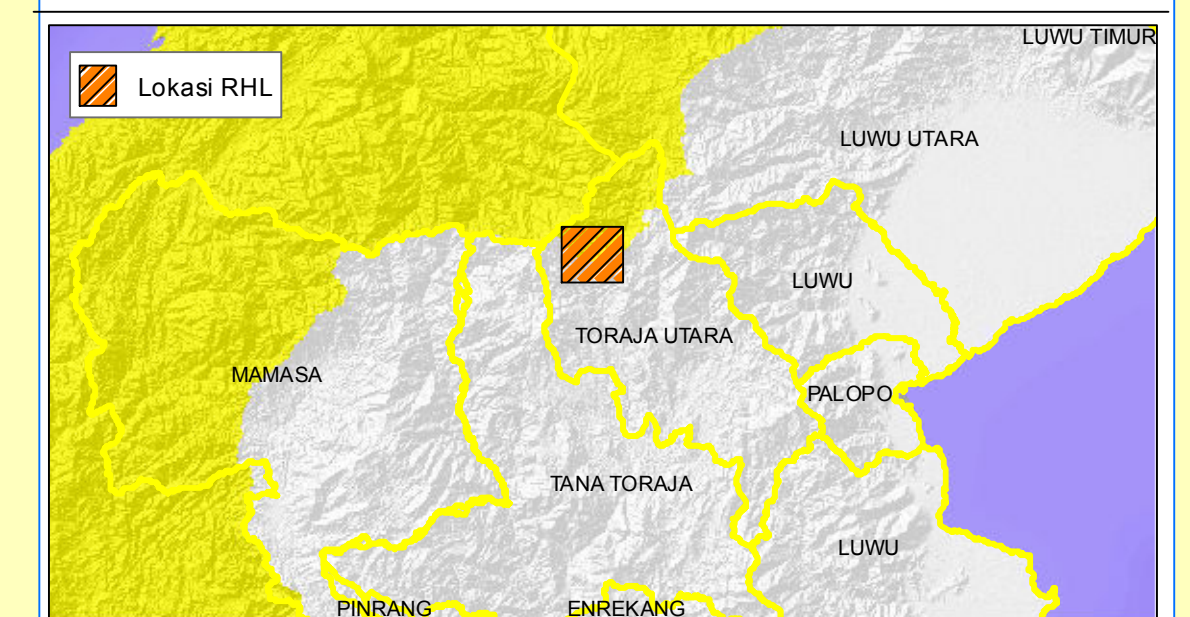

**Pengesahan :**

Digambar Oleh :

Zulkifli Saad, S.Hut  
 NIP. 198011101999031001

Dinilai Oleh :

Ahmad Dimiyati, S.Hut.T., M.Si.  
 NIP. 197103071992031002

Mengetahui,  
 Ka. KPHL Unit VII Saddang II

Gazali Dama Ichsan, S.P  
 NIP. 197709082006041007

Disahkan Oleh  
 Kepala Balai

Rochman Nugrahini, S.Hut., M.Si.  
 NIP. 196910281998032002



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG  
 BPDASHL JENEBERANG SADDANG



**RANCANGAN ANGGARAN BIAYA  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**A. PEMBUATAN TANAMAN AGROFORESTRY (P0)**

**LOK. : SALU-SALU**  
**DESA : LEMBANG BARUPPU UTARA**  
**KEC. : BARUPPU**  
**KPHL : SADDANG II**

**LUAS : 120 HA**  
**BLOK : I**  
**400 BTG/ HA**  
**(SWAKELOLA)**

No.	Jenis Kegiatan	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan		Kebutuhan			
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
<b>I. GAJI-UPAH</b>									
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	90.000	HOK	660,00	HOK	660,00	59.400.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan tanaman	HOK	7,00	90.000	HOK	840,00	HOK	840,00	75.600.000
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja	HOK	1,08	90.000	HOK	129,60	HOK	129,60	11.664.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	90.000	HOK	720,00	HOK	720,00	64.800.000
5	Pemeliharaan tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman (3x))	HOK	8,00	90.000	HOK	960,00	HOK	960,00	86.400.000
6	Pembuatan/ Penyempurnaan Teknik KTA berbasis lahan	HOK	12,00	90.000	HOK	1.440,00	HOK	1.440,00	129.600.000
7	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	0,10	4.000.000	OB	12,00	OB	12,00	48.000.000
<b>JUMLAH I</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>475.464.000</b>
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>									
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	2.500	Patok	6.000,00	Patok	6.000,00	15.000.000
2	Pengadaan ajir	Batang	400,00	400	Batang	48.000,00	Batang	48.000,00	19.200.000
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama	Unit	0,04	600.000	Unit	5,00	Unit	5,00	3.000.000
4	Pengadaan bahan gubuk kerja	Unit	0,02	3.400.000	Unit	2,00	Unit	2,00	6.800.000
5	Pengadaan pupuk :								
	* Pupuk Kompos	Kg	50,00	2.000	Kg	6.000,00	Kg	6.000,00	12.000.000
	* Pupuk NPK Tablet	Kg	6,50	20.000	Kg	780,00	Kg	780,00	15.600.000
6	Pengadaan Obatobatan/ Herbisida	Paket	1,00	7.800.000	Paket	1,00	Paket	1,00	7.800.000
7	pengadaan bahan/ peralatan kerja	Paket	0,02	9.600.000	Paket	1,00	Paket	1,00	9.600.000
<b>JUMLAH II</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>89.000.000</b>
<b>III. PENYEDIAAN BIBIT</b>									
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>								
	* Eucalyptus	Batang	74,00	4.000	Batang	8.880,00	Batang	8.880,00	35.520.000
	* Buangin	Batang	74,00	4.000	Batang	8.880,00	Batang	8.880,00	35.520.000
	* Suren	Batang	73,00	4.000	Batang	8.760,00	Batang	8.760,00	35.040.000
	* Cempaka	Batang	73,00	4.000	Batang	8.760,00	Batang	8.760,00	35.040.000
2	<i>Tanaman HHBK :</i>								
	* Aren	Batang	37,00	4.400	Batang	4.440,00	Batang	4.440,00	19.536.000
	* Alpukat	Batang	109,00	4.400	Batang	13.080,00	Batang	13.080,00	57.552.000
<b>IV. JUMLAH III</b>									<b>218.208.000</b>
<b>V. JUMLAH BIAYA SWAKELOLA</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>782.672.000</b>
<b>VI. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10 %)</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>78.267.200</b>
<b>VII. JUMLAH BIAYA KONTRAKTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>860.939.200</b>
<b>VIII. PEMBULATAN</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>860.939.000</b>

**B. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA AGROFORESTRY (P1)**

LOK. : SALU-SALU  
 DESA : LEMBANG BARUPPU UTARA  
 KEC. : BARUPPU  
 KPHL : SADDANG II

LUAS : 120 HA  
 BLOK : I  
 400 BTG/ HA  
 (SWAKELOLA)

No.	Jenis Kegiatan	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
<b>I. GAJI-UPAH</b>									
1	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	1,00	90.000	HOK	120,00	HOK	120,00	10.800.000
2	Peyulaman	HOK	2,00	90.000	HOK	240,00	HOK	240,00	21.600.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukan, Pengendalian ham/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (3x)	HOK	12,00	90.000	HOK	1.440,00	HOK	1.440,00	129.600.000
4	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	0,10	4.000.000	OB	12,00	OB	12,00	48.000.000
<b>JUMLAH I</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>210.000.000</b>
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>									
1	Pengadaan pupuk NPK Tablet	Kg	11,50	20.000	Kg	1.380,00	Kg	1.380,00	27.600.000
<b>JUMLAH II</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>27.600.000</b>
<b>III. PENYEDIAAN SULAMAN (20 %)</b>									
<i>1 Tanaman Kayu-Kayuan :</i>									
*	Eucalyptus	Batang	14,00	4.000	Batang	1.680,00	Batang	1.680,00	6.720.000
*	Buangin	Batang	14,00	4.000	Batang	1.680,00	Batang	1.680,00	6.720.000
*	Suren	Batang	13,00	4.000	Batang	1.560,00	Batang	1.560,00	6.240.000
*	Cempaka	Batang	13,00	4.000	Batang	1.560,00	Batang	1.560,00	6.240.000
<i>2 Tanaman HHBK :</i>									
*	Aren	Batang	7,00	4.400	Batang	840,00	Batang	840,00	3.696.000
*	Alpukat	Batang	19,00	4.400	Batang	2.280,00	Batang	2.280,00	10.032.000
<b>IV. JUMLAH III</b>									<b>39.648.000</b>
<b>V. JUMLAH BIAYA SWAKELOLA</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>277.248.000</b>
<b>VI. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10 %)</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>27.724.800</b>
<b>VII. JUMLAH BIAYA KONTRAKTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>304.972.800</b>
<b>VIII. PEMBULATAN</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>304.972.000</b>

C.. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA AGROFORESTRY (P2)

LOK. : SALU-SALU  
 DESA : LEMBANG BARUPPU UTARA  
 KEC. : BARUPPU  
 KPHL : SADDANG II

LUAS : 120 HA  
 BLOK : I  
 400 BTG/ HA  
 (SWAKELOLA)

No.	Jenis Kegiatan	Standar Per Hektar		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
<b>I. GAJI-UPAH</b>									
1	Penyulaman serta Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah	HOK	12,00	90.000	HOK	1.440,00	HOK	1.440,00	129.600.000
2	Pengawasan/ Mandor tanam	OB	0,10	4.000.000	OB	12,00	OB	12,00	48.000.000
	<b>JUMLAH I</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>177.600.000</b>
<b>II. BAHAN-BAHAN</b>									
1	Pengadaan pupuk NPK Tablet	Kg	10,00	20.000	Kg	1.200,00	Kg	1.200,00	24.000.000
	<b>JUMLAH II</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>24.000.000</b>
<b>III. PENYEDIAAN SULAMAN (10 %)</b>									
1	<i>Tanaman Kayu-Kayuan :</i>								
	* Eucalyptus	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
	* Buangin	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
	* Suren	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
	* Cempaka	Batang	7,00	4.000	Batang	840,00	Batang	840,00	3.360.000
2	<i>Tanaman HHBK :</i>								
	* Aren	Batang	4,00	4.400	Batang	480,00	Batang	480,00	2.112.000
	* Alpukat	Batang	8,00	4.400	Batang	960,00	Batang	960,00	4.224.000
<b>IV.</b>	<b>JUMLAH III</b>								<b>19.776.000</b>
<b>V.</b>	<b>JUMLAH BIAYA SWAKELOLA</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>221.376.000</b>
<b>VI.</b>	<b>BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10 %)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>22.137.600</b>
<b>VII.</b>	<b>JUMLAH BIAYA KONTRAKTUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>243.513.600</b>
<b>VIII.</b>	<b>PEMBULATAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>243.513.000</b>
