



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG BONE BOLANGO**

---

**RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
TAHUN 2020**

BLOK	:	I
FUNGSI KAWASAN	:	HUTAN PRODUKSI TERBATAS
KPH	:	V BOALEMO
DESA	:	PANGI
KECAMATAN	:	DULUPI
KABUPATEN	:	BOALEMO
PROPINSI	:	GORONTALO
DAS	:	MODELOMO
LUAS	:	100 HA


---


*Limboto, Desember 2019*


**LEMBAR PENGESAHAN  
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
TAHUN 2020**


**BLOK : I**  
**FUNGSI : HUTAN PRODUKSI TERBATAS**  
**KPH : V BOALEMO**  
**DESA : PANGI**  
**KECAMATAN : DULUPI**  
**KABUPATEN : BOALEMO**  
**PROPINSI : GORONTALO**  
**D A S : MODELOMO**  
**L U A S : 100 HA**

  
**IRAWATI, HZ, ADAM, SP**  
NIP.19691022-199903 2 005

*DINILAI OLEH :*  
KEPALA SEKSI PROGRAM DAS DAN HL  
BPDASHL BONE BOLANGO,  
  
**MUHAMMAD BAKRI NONGKO, SE. M.Si**  
NIP.19750528 199803 1 001

*DISUSUN OLEH :*  
an. TIM PENYUSUN,  
  
**TASRIF**  
NIP.19820212 200112 1 003

*DISAHKAN OLEH :*  
KEPALA BPDASHL  
BONE BOLANGO,  
  
**M. TAHIR P, SP. M.Si**  
NIP.19641231 198603 1 006



# KATA PENGANTAR

---


Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini disusun oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango, dengan melibatkan personil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Gorontalo, BPKH XV Gorontalo, SPTN Wilayah I Limboto, SKW II Wilayah Gorontalo dan KPH serta masyarakat sekitar lokasi. Rancangan Kegiatan ini disusun untuk dijadikan acuan teknis tingkat detail guna pelaksanaan RHL, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.


Buku rancangan kegiatan ini disusun berdasarkan pengolahan dan analisis data primer yang diperoleh di lapangan serta data sekunder berupa dokumen dan peta tematik dari beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan lokasi kegiatan. Secara umum buku rancangan kegiatan ini menggambarkan risalah umum lokasi, rancangan kegiatan, rancangan biaya, dan rancangan kelembagaan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan. Peta rancangan kegiatan menggambarkan situasi, tata letak, desain teknis petak kerja serta informasi lainnya yang dapat digambarkan secara visual.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan kegiatan ini mulai dari awal sampai dengan penyajian *output* pekerjaan diucapkan terima kasih. Semoga buku rancangan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan RHL di lapangan.

Limboto, Desember 2019

Penyusun






# DAFTAR ISI

---


Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
<b>BAB II. RISALAH UMUM</b> .....	<b>3</b>
A. Kondisi Biofisik .....	3
1. Letak dan Luas .....	3
2. Penutupan Lahan .....	4
3. Ketinggian Tempat dan Topografi .....	4
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	4
1. Demografi .....	4
2. Aksesibilitas .....	4
3. Tenaga Kerja .....	4
4. Sosial Budaya .....	5
5. Kelembagaan Masyarakat .....	5



<b>BAB III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL .....</b>	<b>6</b>
A. Rancangan Penyediaan Bibit .....	6
1. Lokasi Persemaian .....	6
2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman .....	6
B. Rancangan Kegiatan Penanaman .....	7
1. Penyiapan Lahan .....	7
2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan .....	9
3. Penanaman .....	10
C. Rancangan Pemeliharaan Tanaman .....	12
<b>BAB IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA .....</b>	<b>14</b>
A. Penyediaan Bibit.....	14
B. Pembuatan Tanaman (P0) .....	15
C. Pemeliharaan Tanaman Tahun I .....	16
D. Pemeliharaan Tanaman Tahun II .....	17
E. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya .....	18
<b>BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jadwal Kegiatan Penyediaan Bibit .....	19
B. Jadwal Kegiatan Penanaman Tahun Berjalan (P0) .....	20
C. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) .....	21
D. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua(P2) .....	22

**LAMPIRAN**





# BAB I. PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

Degradasi sumberdaya alam di Propinsi Gorontalo diindikasikan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Indonesia yang mencakup lahan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Degradasi hutan dan lahan tersebut saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik secara nasional maupun internasional. Peningkatan luasan lahan kritis tersebut disebabkan oleh adanya deforestasi (pengurangan kawasan hutan) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) yang terus terjadi.

Banyak faktor yang mengakibatkan adanya deforestasi dan degradasi hutan antara lain yaitu pertambahan penduduk dan pembangunan di luar sektor kehutanan yang sangat pesat, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan. Kondisi demikian diperparah dengan adanya perambahan dan kebakaran hutan yang mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan alam.

Salah satu strategi pemerintah untuk meminimalisir laju kerusakan hutan (deforestasi dan degradasi) adalah melalui program kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). RHL merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peraturan Dirjen PDASHL Nomor: P.5/PDASHL/SET/KUM.1/8/2018 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2019 dan Peraturan Dirjen PDASHL Nomor: P.3/PDASHL/SET/KUM.1/3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen PDASHL Nomor: P.5/PDASHL/SET/KUM.1/8/2018 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2019.

Sebelum pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan perlu dibuat rancangan kegiatan RHL (RK RHL), yang merupakan desain teknis kegiatan RHL yang memuat informasi detail mengenai kejelasan lokasi, tata letak, jenis tanaman, kebutuhan bibit, kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan biaya yang diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan. Rancangan kegiatan RHL digunakan sebagai dasar pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu penyusunan rancangan kegiatan ini harus ditunjang dengan data informasi yang mutakhir, objektif dan akurat sesuai dengan kondisi lapangan, dan memiliki sifat realistis dan aplikatif.

## **B. Maksud dan Tujuan**


Maksud Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini adalah tersusunnya buku rancangan Kegiatan RHL Tahun 2020 di Kabupaten Boalemo yang realistis dan mudah dilaksanakan di lapangan dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Tujuan Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman ini adalah untuk memberikan acuan teknis yang detail guna pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan agar sesuai dengan kaidah teknis yang tepat guna baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya wilayah setempat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

## **C. Sasaran**

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2020 meliputi kegiatan RHL pada hutan lindung, terdiri dari:

1. Tahun ke-1 : Pembuatan bibit / Pengadaan bibit
2. Tahun ke-2 : Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan
3. Tahun ke-3 : Pemeliharaan ke-1
4. Tahun ke-4 : Pemeliharaan ke-2
5. Akhir Tahun ke-4 : Evaluasi Keberhasilan Tanaman



## BAB II. RISALAH UMUM

---

### A. Kondisi Biofisik

#### 1. Letak dan Luas

##### a. Letak Administratif

- 1) Blok : I
- 2) Desa : Pangi
- 3) Kecamatan : Dulupi
- 4) Kabupaten : Boalemo
- 5) Propinsi : Gorontalo

##### b. Letak Geografis

- Secara hidrologis terletak pada DAS Modelomo
- Lokasi Penanaman memiliki Batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangga Jaya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dulupi dan Desa Tenilo
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lahumbo
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Putih

Koordinat geografis berada pada  $0^{\circ}34'2,904''N$  -  $0^{\circ}34'49,524''N$  dan  $122^{\circ}23'42,897''E$  -  $122^{\circ}23'58,128''E$

##### c. Luas Lokasi : 100 Ha



## 2. Penutupan Lahan

Pada umumnya Areal Lokasi Kegiatan di dominasi oleh Pertanian Lahan Kering dan Belukar

## 3. Ketinggian Tempat dan Topografi

Ketinggian 200 – 483 meter dpl, dengan topografi pada lokasi penanaman umumnya landai.

# B. Kondisi Sosial dan Ekonomi

## 1. Demografi

- a. Jumlah Penduduk : 1433 jiwa
- b. Jumlah Laki-laki : 731 jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 702 jiwa
- d. Jumlah usia produktif : 209 jiwa

## 2. Aksesibilitas

- a. Jarak lokasi ke Pusat Desa : 3 Km
- b. Jarak Desa Ke Kecamatan : 20 Km
- c. Jarak Kecamatan Ke Kabupaten : 30 Km

## 3. Tenaga Kerja


Kegiatan penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan akan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja/kelompok tani/koperasi setempat dan diutamakan yang berada disekitar lokasi kegiatan yang dibimbing oleh mandor dan pelaksana lapangan serta pengawas lain yang ditunjuk.

#### **4. Sosial Budaya**

Masyarakat di Desa Pangi, didominasi oleh suku Gorontalo. Masyarakat di sekitar lokasi melakukan kegiatan usahanya dengan bercocok tanam dan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pelestarian hutan guna penyangga kehidupan mereka, mereka juga berharap adanya hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### **5. Kelembagaan Masyarakat**

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga telah cukup akrab dengan hal bercocok tanam serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Dimana hal itu akan berdampak baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.



## BAB III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

### A. Rancangan Penyediaan Bibit

#### 1. Lokasi Persemaian

Kegiatan penyediaan bibit dilakukan melalui pembuatan bibit di persemaian yang berada didekat atau disekitar lokasi penanaman

#### 2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Tabel 3.1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL

No	Komposisi Jenis Tanaman	Jumlah Bibit / Ha (Batang)	Kebutuhan Bibit (Batang)				Total (Btg)
			Pengadaan Bibit	Pembuatan Bibit Sulaman Penanaman Tahun Berjalan (10%)	Pembuatan Bibit Sulaman P1 (20%)	Pembuatan Bibit Sulaman P2 (10%)	
<b>I</b>	<b>Tanaman Kayu-kayuan</b>						
1	Mahoni	35	3.500	350	700	350	4.900
2	Nyatoh	40	4.000	400	800	400	5.600
3	Gmelina	45	4.500	450	900	450	6.300
<b>II</b>	<b>Tanaman HHBK</b>						
1	Jambu Mete	95	9.500	950	1.900	950	13.300
2	Durian	95	9.500	950	1.900	950	13.300
3	Rambutan	90	9.000	900	1.800	900	12.600
	<b>Jumlah</b>	<b>400</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>56.000</b>

## B. Rancangan Kegiatan Penanaman

## C. Rancangan Kegiatan Penanaman

Kegiatan Penanaman Rehalibitasi Hutan dan Lahan ini di laksanakan dengan pola agroforestri dengan jumlah pohon 400 batang/ha (untuk jenis tanaman hutan/MPTS) dengan jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan.

### 1. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuhan yang sesuai bagi tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, fisik, pengelolaan dan faktor sosial serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang besar.

#### a. Persiapan

- Lokasi dan luas lahan didasarkan pada hasil inventarisasi dan rancangan pembagian blok dan petak.
- Teknik penyiapan lahan didasarkan pada kondisi fisik, kelerengan dan tipe penutupan lahan.
- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam.
- Penyiapan lahan untuk jalur-jalur tanaman dilaksanakan dengan cara membabat rumput dan gulma serta belukar selebar 1 meter. Jarak antar sumbu jalur disesuaikan dengan jarak tanaman dengan arah utara selatan atau mengikuti kontur.
- Pada sistem tanam jalur, jalur-jalur tanam dirancang tidak terputus dan rancangan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam.

#### b. Pelaksanaan

##### a) Pembentukan satuan unit kerja penyiapan lahan

- Satuan kerja unit lahan beranggotakan minimal 5 orang
- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rintisan jalur tanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- Dua anggota regu, bertugas membuat dan membuka rintisan jalur.

- Dua anggota regu bertugas membuat ajir dan memasang ajir pada lubang tanam sepanjang jalur.

- b) Persiapan Peralatan Kerja
  - Penyiapan peta kerja penyiapan lahan skala 1 : 10.000
  - Persiapan peralatan kerja antara lain: parang/golok, cangkul, papan tanda dan perlengkapan logistik lainnya
- c) Perencanaan Kerja
  - Menentukan lokasi blok dan peta kerja rehabilitasi hutan
  - Membuat peta kerja detail penyiapan lahan
  - Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan
  - Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan
- d) Pelaksanaan
  - Mencari tanda jalur penanaman yang akan dibuat
  - Membuat rintisan jalur bersih/tanaman selebar 1 meter
  - Pada setiap ujung jalur diberi tanda patok kayu diameter 5 cm dengan tinggi 130 cm, bagian ujung patok di cat warna merah sepanjang 10 cm.
  - Menentukan lokasi lubang tanaman sebanyak 400 lubang/ha dan menandai lubang tanam dengan ajir, panjang Ajir 100 cm dan bagian ujung ajir di cat warna kuning sepanjang 10 cm
- e) Pencatatan dan pelaporan
  - Nama lokasi blok dan petak kerja
  - Jumlah jalur tanam pembuatan rehabilitasi hutan
  - Rencana jenis dan jumlah tanaman pada masing-masing petak
  - Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan
  - Buku register diisi setiap hari kegiatan
  - Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab satuan unit kerja penyiapan lahan

- Laporan kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap
- Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah petak dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan

## 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan dan peralatan kerja sebagaimana Tabel 3.2

NO	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman	Pemeliharaan	Pemeliharaan
			(P0)	Tahun Pertama (P1)	Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan patok arah larikan	Batang	5.000,00	-	-
2	Pengadaan ajir	Batang	40.000,00	-	-
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	4,00	-	-
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	2,00	-	-
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	100,00	100,00	100,00
6	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	100,00	-	-
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	Paket	2,00	-	-

### 3. Penanaman

#### a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL

NO	Komponen	Satuan	Kebutuhan
			Volume
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0)</b>		
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	550,00
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan	HOK	700,00
3	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	108,00
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	600,00
5	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X	HOK	800,00
6	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	10,00
<b>II</b>	<b>Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)</b>		
1	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	100,00
2	Penyulaman	HOK	200,00
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit (3X)	HOK	1.200,00
4	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	10,00
<b>III</b>	<b>Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)</b>		
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit	HOK	1.200,00
2	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	10,00



b. Teknik Pelaksanaan

Pembentukan satuan unit kerja Distribusi Bibit dan Penanaman

- 1) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- 2) Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam.
- 3) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan perlengkapan logistik lainnya.
- 4) Menentukan lokasi blok dan petak kerja penanaman.
- 5) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit.
- 6) Membuat peta kerja detail penanaman.
- 7) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- 8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman.

c. Pelaksanaan

- 1) Melakukan distribusi bibit.
- 2) Membersihkan piringan dan menggali lubang tanam yang telah ditandai ajir.
- 3) Melakukan penanaman.

d. Pencatatan dan pelaporan

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut:

- 1) Nama lokasi blok dan petak kerja.
- 2) Jumlah jalur tanam rehabilitasi hutan.
- 3) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada masing-masing petak.
- 4) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

### **C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN**

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
2. Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
3. Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.

#### **Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman**

##### **1) Penyulaman**

Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama, dan tahun kedua.

##### **2) Penyiangan dan pendangiran**


Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan. Penyiangan dan pendangiran pada tahun berjalan dilaksanakan 3 (tiga) kali, tahun kedua dilakukan 3 (tiga) kali dan tahun ketiga dilaksanakan 1 (satu) kali.

### 3) Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik atau anorganik dengan cara ditaburkan disekitar batang bibit yang ditanam atau ditanam di sekitar lubang tanam. Pemupukan pada tahun berjalan dilakukan tiga kali, tahun kedua dilakukan tiga kali dan tahun ketiga dilakukan satu kali

### 4) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman.



## BAB IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

### A. PENYEDIAAN BIBIT

Tabel 4.1 Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan			Kebutuhan	
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>Penyediaan Bibit</b>								
	Tanaman Kayu-Kayuan/HHBK	Batang	400	1.760.000	100	Batang	40.000	4.400	176.000.000
	<b>JUMLAH I</b>								<b>176.000.000</b>
II	<b>JUMLAH BIAYA (I)</b>								<b>176.000.000</b>
III	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>	10%							<b>17.600.000</b>
IV	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>								<b>193.600.000</b>
	<b>Pembulatan</b>								<b>-</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>-</b>					<b>193.600.000</b>

## B. PEMBUATAN TANAMAN (P0)

Tabel 4.2 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	495.000	100,00	HOK	550,00	90.000	49.500.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,00	630.000	100,00	HOK	700,00	90.000	63.000.000
3	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	540.000	100,00	HOK	600,00	90.000	54.000.000
4	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X	HOK	8,00	720.000	100,00	HOK	800,00	90.000	72.000.000
5	Pembuatan gubuk kerja/pondok kerja dan papan nama	HOK	1,08	97.200	100,00	HOK	108,00	90.000	9.720.000
6	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	100,00	OB	10,00	4.000.000	40.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>2.882.200</b>					<b>288.220.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	125.000,00	100,00	Patok	5.000,00	2.500	12.500.000
2	Pengadaan ajir	Btg	400,00	108.000,00	100,00	Btg	40.000,00	270	10.800.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0,04	24.000,00	100,00	Unit	4,00	600.000	2.400.000
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	68.000,00	100,00	Unit	2,00	3.400.000	6.800.000
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	100,00	Paket	100,00	230.000	23.000.000
6	Pengadaan obat-obatan	Paket	1,00	65.000,00	100,00	Paket	100,00	65.000	6.500.000
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	Paket	0,02	80.000,00	100,00	Paket	2,00	4.000.000	8.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>700.000,00</b>					<b>70.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 40 Btg (Pemeliharaan tahun berjalan)	Btg	40	176.000	100,00	Btg	4.000,00	4.400	17.600.000
2	Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar	Paket	1	340000	100,00	Paket	100,00	340.000	34.000.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>516.000</b>					<b>51.600.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>4.098.200</b>					<b>409.820.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>409.820</b>					<b>40.982.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>4.508.020</b>					<b>450.802.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(20)</b>					<b>(2.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>4.508.000</b>					<b>450.800.000</b>

### C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

Tabel 4.3 Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)

No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Distribusi bibit kelubang tanam	HOK	1,00	90.000	100,00	HOK	100,00	90.000	9.000.000
2	Penyulaman	HOK	2,00	180.000	100,00	HOK	200,00	90.000	18.000.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit 3 X	HOK	12,00	1.080.000	100,00	HOK	1.200,00	90.000	108.000.000
4	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	100,00	OB	10,00	4.000.000	40.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.750.000</b>					<b>175.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	100,00	Paket	100,00	230.000	23.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>230.000,00</b>					<b>23.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	80	352.000	100,00	Btg	8.000,00	4.400	35.200.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>352.000</b>					<b>35.200.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>2.332.000</b>					<b>233.200.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>233.200</b>					<b>23.320.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.565.200</b>					<b>256.520.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(200)</b>					<b>(20.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.565.000</b>					<b>256.500.000</b>

#### D. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Tabel 4.4 Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)


No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit	HOK	12,00	1.080.000	100,00	HOK	1.200,00	90.000	108.000.000
2	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	100,00	OB	10,00	4.000.000	40.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.480.000</b>					<b>148.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	200.000	100,00	Paket	100,00	200.000	20.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>200.000,00</b>					<b>20.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	40	176.000	100,00	Btg	4.000,00	4.400	17.600.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>176.000</b>					<b>17.600.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>1.856.000</b>					<b>185.600.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>185.600</b>					<b>18.560.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.041.600</b>					<b>204.160.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(600)</b>					<b>(60.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.041.000</b>					<b>204.100.000</b>

## E. REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel 4.5. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Kegiatan	Luas		Total Biaya (Rp)
1	2	3		4
1	Pembuatan Bibit 400 Btg	100	Ha	193.600.000
2	Penanaman PO	100	Ha	450.800.000
3	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	100	Ha	256.500.000
4	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	100	Ha	204.100.000
<b>Jumlah</b>				<b>1.105.000.000</b>





## BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. JADWAL KEGIATAN PENYEDIAAN BIBIT

Tabel 5.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2020											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
*	Penyediaan Bibit												
	- Tanaman Kayu Kayuan / HHBK												

**B. JADWAL KEGIATAN PENANAMAN TAHUN BERJALAN (P0)**

**Tabel 5.2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2021**

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	July	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>												
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	■	■										
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam			■									
3	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	■	■		■								
4	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X				■				■	■		■	
5	Pembuatan gubuk kerja/pondok kerja dan papan nama	■	■										
6	Pengawasan/Mandor Tanam	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>II</b>	<b>Bahan</b>												
1	Pengadaan patok arah larikan	■											
2	Pengadaan ajir	■											
3	Pengadaan bahan papan nama	■											
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	■	■										
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	■											
6	Pengadaan obat-obatan/herbisida	■											
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	■	■										
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>												
1	Bibit sulaman 40 Btg (Pemeliharaan tahun berjalan)	■	■	■									
2	Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar	■	■	■									

**C. JADWAL KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA (P1)**

**Tabel 5.3 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022**

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>												
1	Distribusi bibit ke lubang tanam												
2	Penyulaman												
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit (3x)												
4	Pengawasan/Mandor Tanam												
<b>II</b>	<b>Bahan</b>												
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam												
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>												
1	Bibit sulaman												

**D. JADWAL KEGIATAN PEMELIHARAAN TAHUN KEDUA (P2)**


**Tabel 5.4 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023**

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>												
1	Penyulaman serta penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit												
2	Pengawasan/Mandor Tanam												
<b>II</b>	<b>Bahan</b>												
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam												
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>												
1	Bibit sulaman												

# LAMPIRAN

# GAMBAR

Lampiran 1. Papan Nama Petak

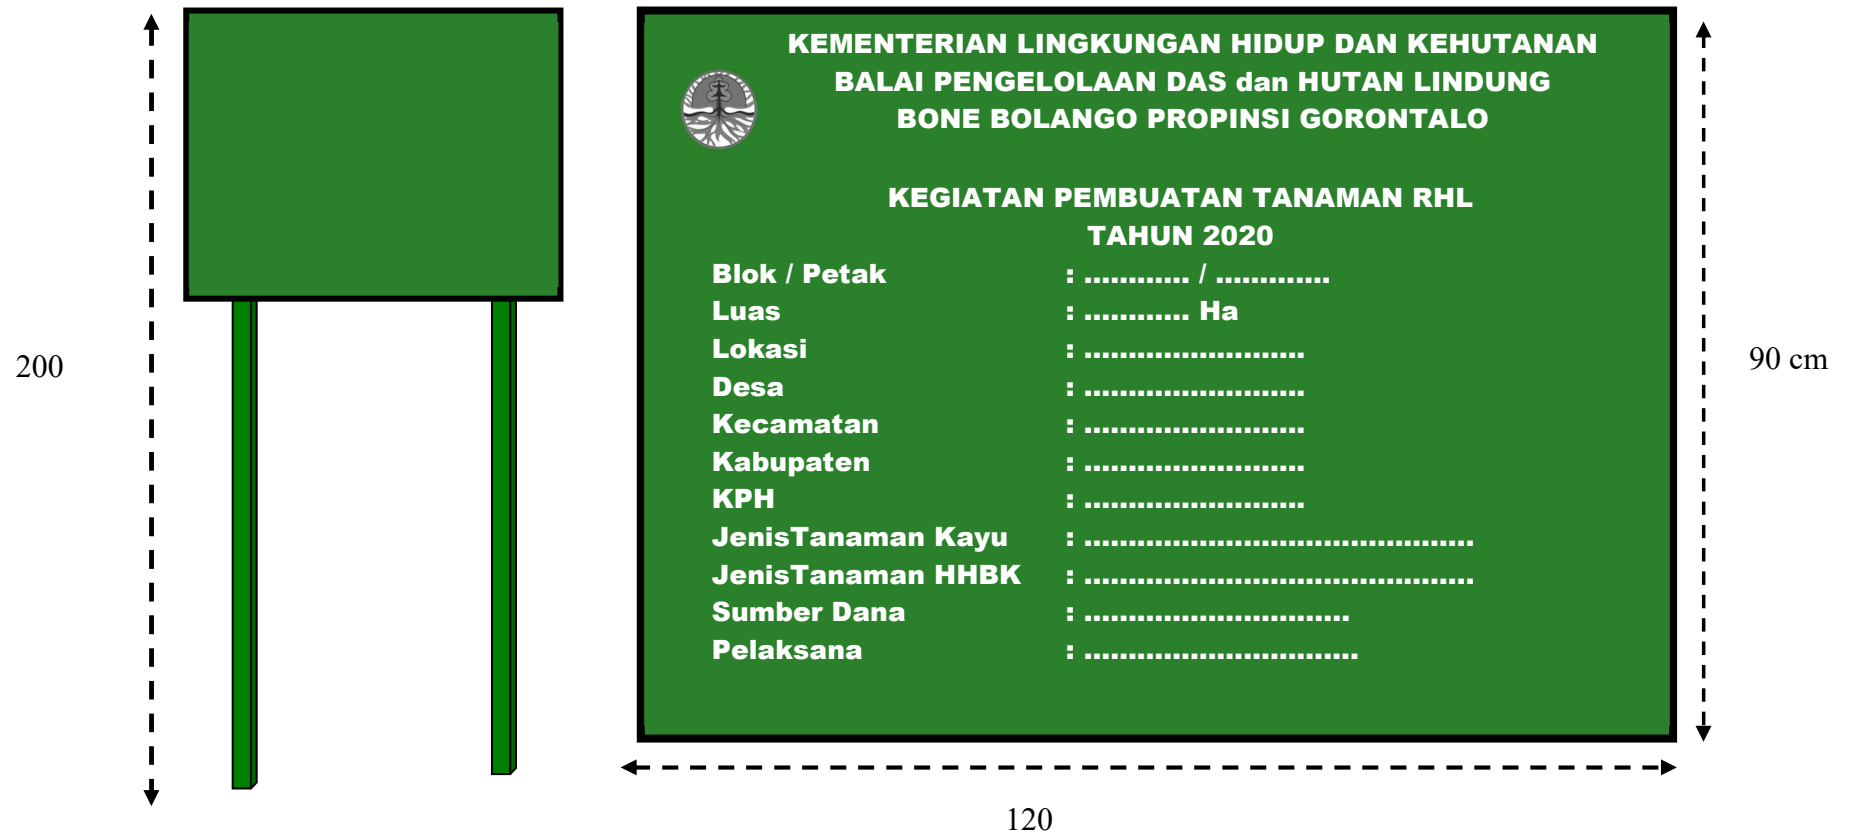

Lampiran 2. Gambar Papan Mutasi



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGELOLAAN DAS dan HUTAN LINDUNG**  
**BONE BOLANGO PROPINSI GORONTALO**

**Kegiatan** : Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2020  
**Lokasi** : Desa ..... Kec. .... Kab. ....  
**Pelaksana** : .....  
**Total Anggaran** : Rp. ....


No	Uraian Kegiatan	Total Target	Waktu Pelaksanaan	Rencana		Realisasi		Keterangan
				Volume	%	Volume	%	
1								
2								
3								
4								
5								
7								
8								
9								
10								
dst								

....., ..... 2019


**Pelaksana Lapangan**

.....



Lampiran 3. Gambar dan Spesifikasi Gubuk Kerja

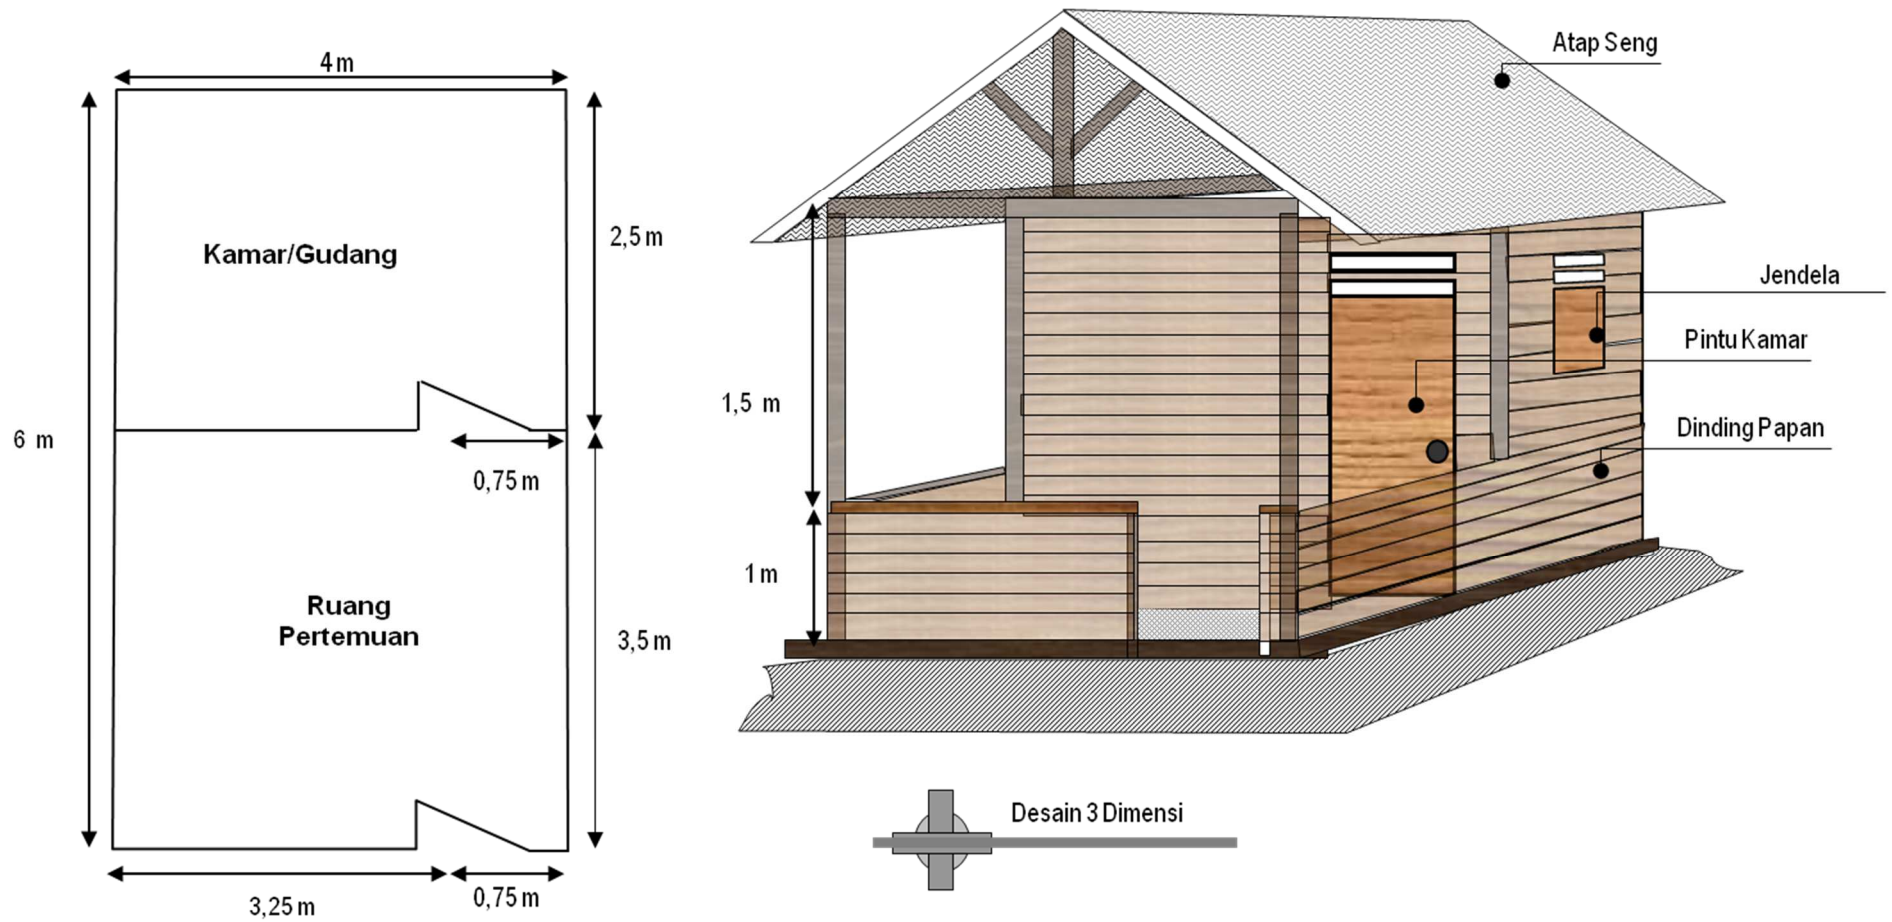



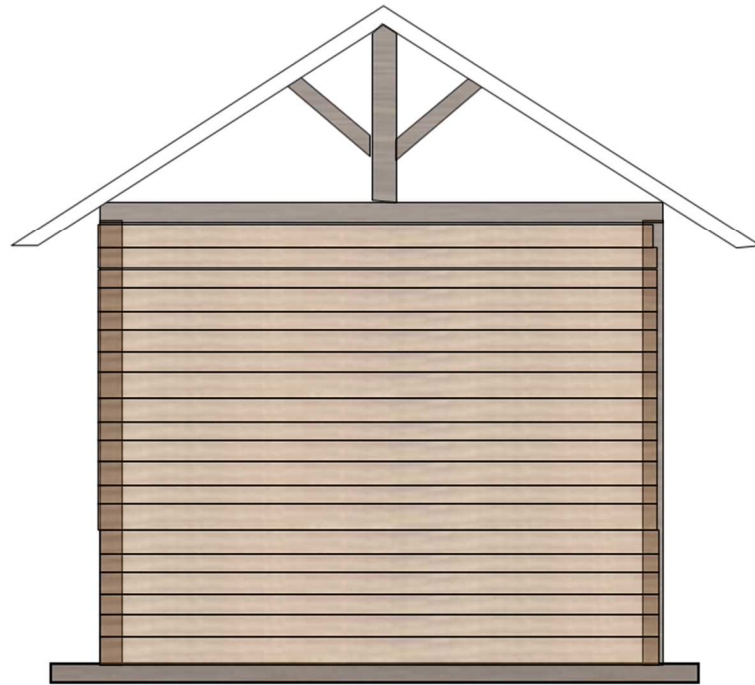


Tampak Belakang

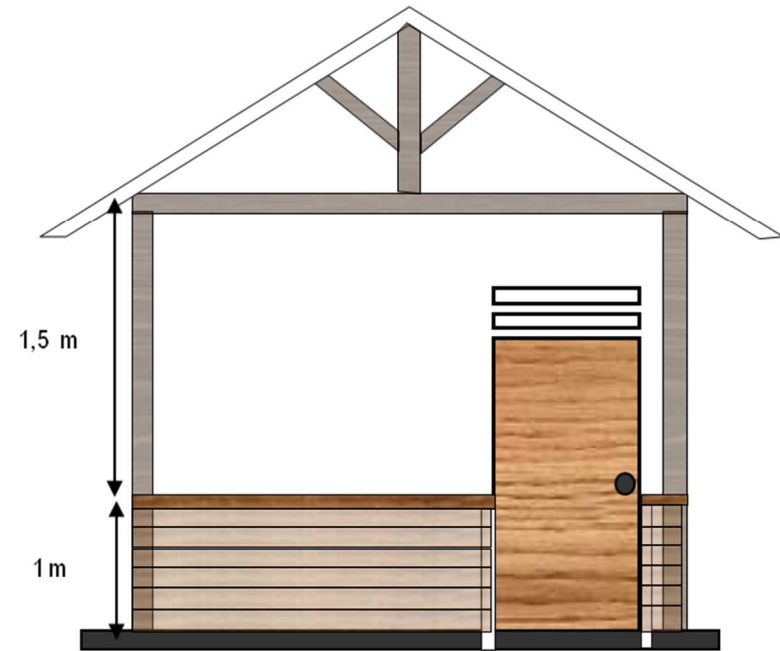


Tampak Depan




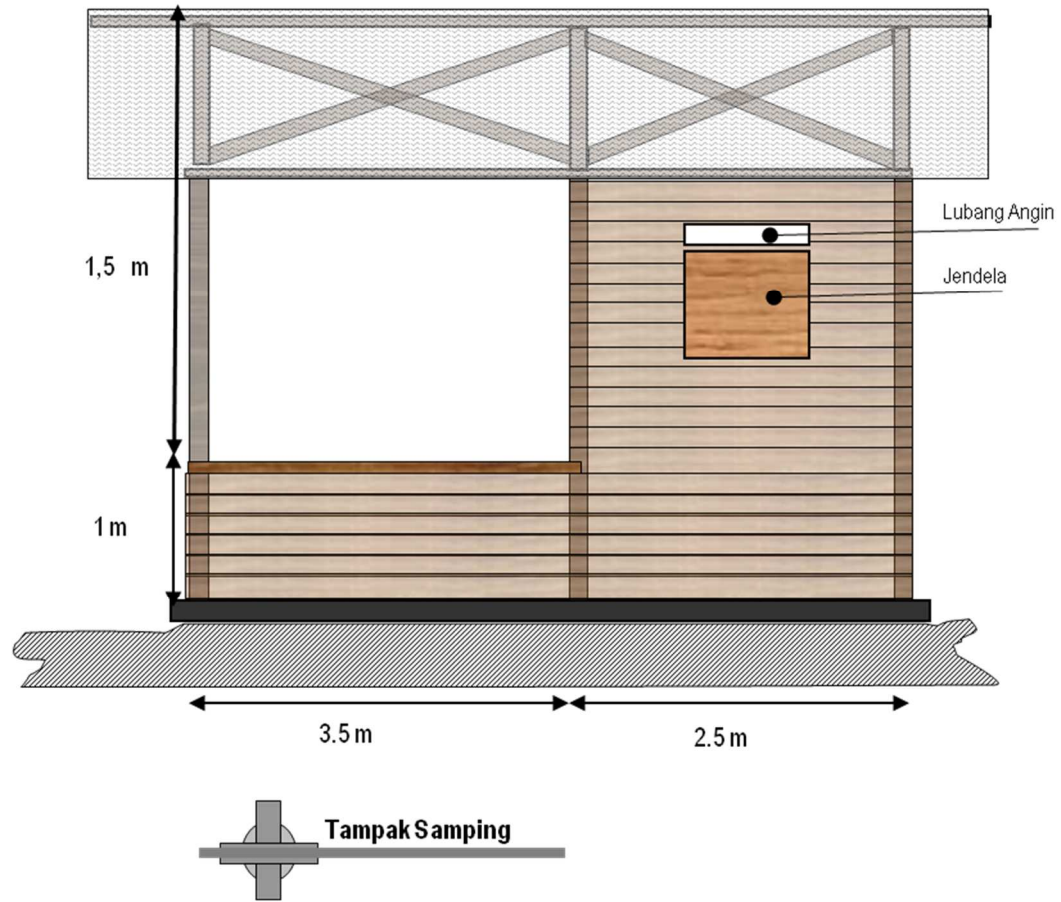

Lampiran 4. . Gambar Desain Tempat Penampungan Bbit

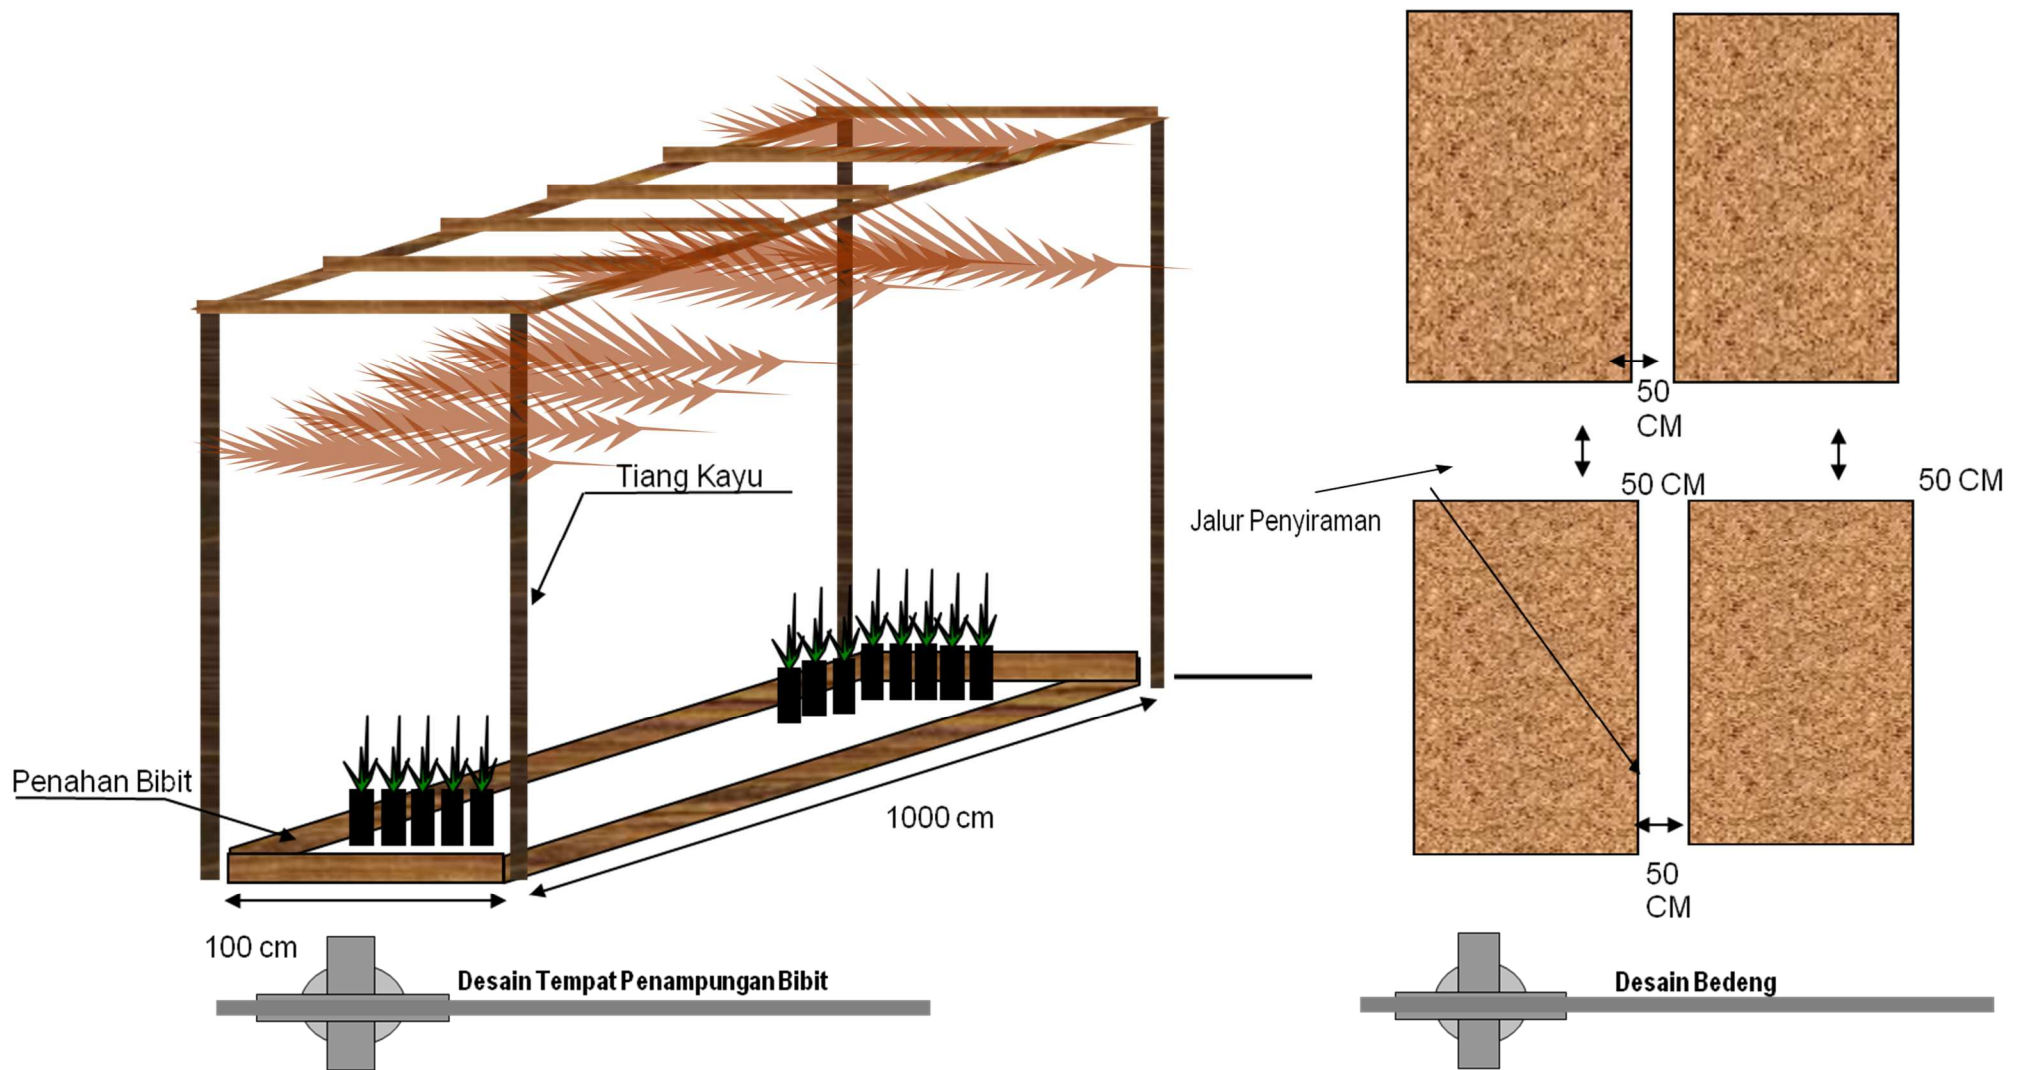

Lampiran 5. Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir

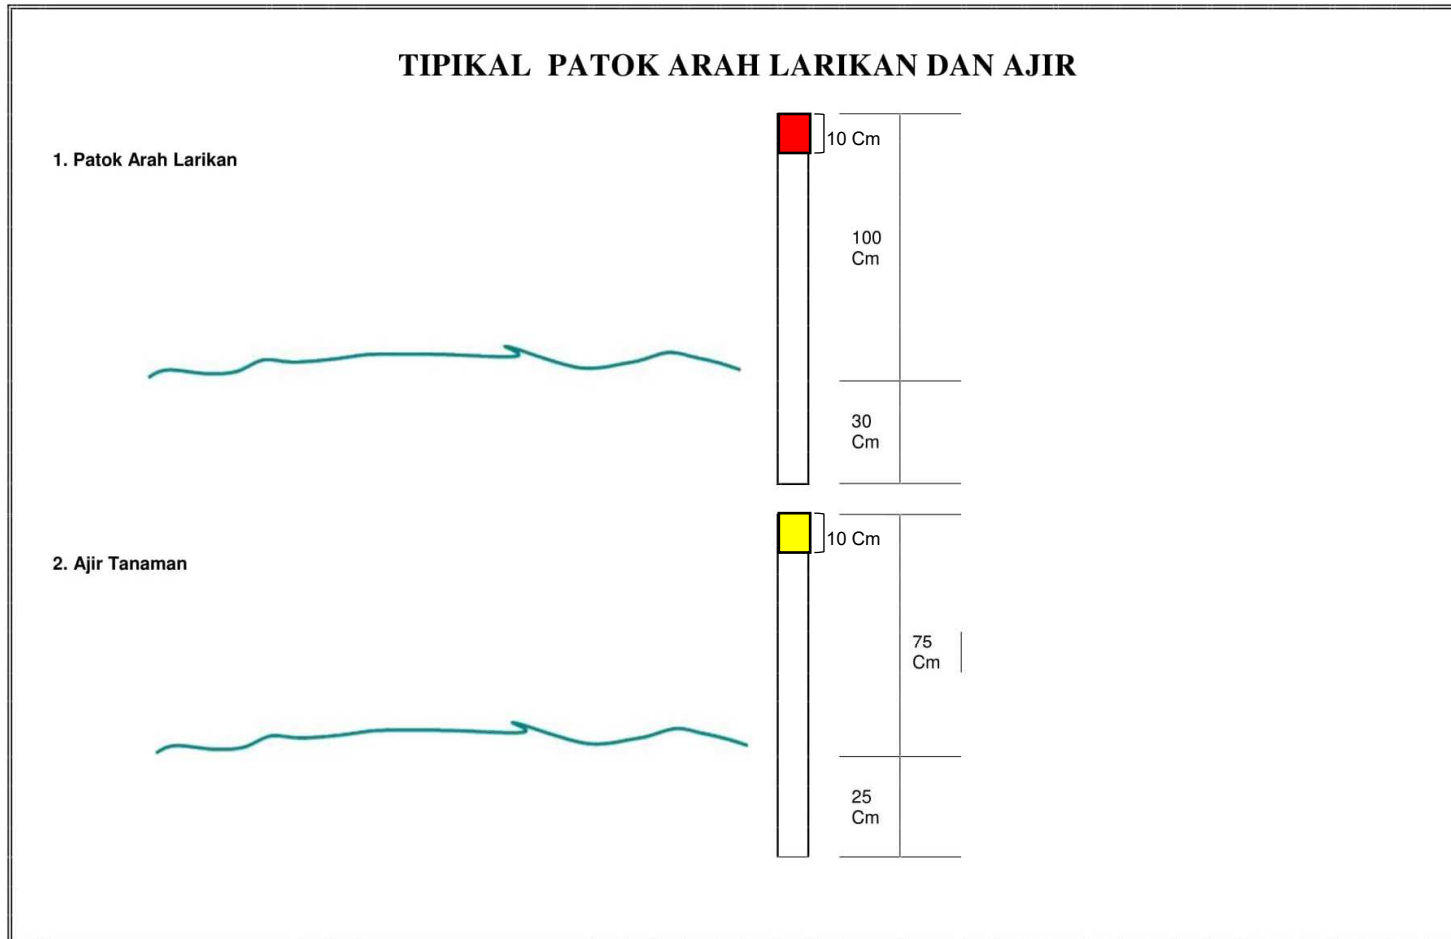

# LAMPIRAN

## RAB PER PETAK

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PER PETAK KEGIATAN TAHUN BERJALAN (PO)									
PETAK 1									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	495.000	25,00	HOK	137,50	90.000	12.375.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,00	630.000	25,00	HOK	175,00	90.000	15.750.000
3	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	540.000	25,00	HOK	150,00	90.000	13.500.000
4	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X	HOK	8,00	720.000	25,00	HOK	200,00	90.000	18.000.000
5	Pembuatan gubuk kerja/pondok kerja dan papan nama	HOK	1,08	97.200	25,00	HOK	27,00	90.000	2.430.000
6	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>2.882.200</b>					<b>72.055.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	125.000,00	25,00	Patok	1.250,00	2.500	3.125.000
2	Pengadaan ajir	Btg	400,00	108.000,00	25,00	Btg	10.000,00	270	2.700.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0,04	24.000,00	25,00	Unit	1,00	600.000	600.000
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	68.000,00	25,00	Unit	0,50	3.400.000	1.700.000
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
6	Pengadaan obat-obatan	Paket	1,00	65.000,00	25,00	Paket	25,00	65.000	1.625.000
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	Paket	0,02	80.000,00	25,00	Paket	0,50	4.000.000	2.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>700.000,00</b>					<b>17.500.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 40 Btg (Pemeliharaan tahun berjalan)	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
2	Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar	Paket	1	340000	25,00	Paket	25,00	340.000	8.500.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>516.000</b>					<b>12.900.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>4.098.200</b>					<b>102.455.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>409.820</b>					<b>10.245.500</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>4.508.020</b>					<b>112.700.500</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(20)</b>					<b>(500)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>4.508.000</b>					<b>112.700.000</b>

PETAK 2									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	495.000	25,00	HOK	137,50	90.000	12.375.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,00	630.000	25,00	HOK	175,00	90.000	15.750.000
3	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	540.000	25,00	HOK	150,00	90.000	13.500.000
4	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X	HOK	8,00	720.000	25,00	HOK	200,00	90.000	18.000.000
5	Pembuatan gubuk kerja/pondok kerja dan papan nama	HOK	1,08	97.200	25,00	HOK	27,00	90.000	2.430.000
6	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>2.882.200</b>					<b>72.055.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	125.000,00	25,00	Patok	1.250,00	2.500	3.125.000
2	Pengadaan ajir	Btg	400,00	108.000,00	25,00	Btg	10.000,00	270	2.700.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0,04	24.000,00	25,00	Unit	1,00	600.000	600.000
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	68.000,00	25,00	Unit	0,50	3.400.000	1.700.000
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
6	Pengadaan obat-obatan	Paket	1,00	65.000,00	25,00	Paket	25,00	65.000	1.625.000
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	Paket	0,02	80.000,00	25,00	Paket	0,50	4.000.000	2.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>700.000,00</b>					<b>17.500.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 40 Btg (Pemeliharaan tahun berjalan)	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
2	Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar	Paket	1	340000	25,00	Paket	25,00	340.000	8.500.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>516.000</b>					<b>12.900.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>4.098.200</b>					<b>102.455.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>409.820</b>					<b>10.245.500</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>4.508.020</b>					<b>112.700.500</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(20)</b>					<b>(500)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>4.508.000</b>					<b>112.700.000</b>

PETAK 3									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	495.000	25,00	HOK	137,50	90.000	12.375.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,00	630.000	25,00	HOK	175,00	90.000	15.750.000
3	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	540.000	25,00	HOK	150,00	90.000	13.500.000
4	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X	HOK	8,00	720.000	25,00	HOK	200,00	90.000	18.000.000
5	Pembuatan gubuk kerja/pondok kerja dan papan nama	HOK	1,08	97.200	25,00	HOK	27,00	90.000	2.430.000
6	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>2.882.200</b>					<b>72.055.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	125.000,00	25,00	Patok	1.250,00	2.500	3.125.000
2	Pengadaan ajir	Btg	400,00	108.000,00	25,00	Btg	10.000,00	270	2.700.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0,04	24.000,00	25,00	Unit	1,00	600.000	600.000
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	68.000,00	25,00	Unit	0,50	3.400.000	1.700.000
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
6	Pengadaan obat-obatan	Paket	1,00	65.000,00	25,00	Paket	25,00	65.000	1.625.000
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	Paket	0,02	80.000,00	25,00	Paket	0,50	4.000.000	2.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>700.000,00</b>					<b>17.500.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 40 Btg (Pemeliharaan tahun berjalan)	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
2	Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar	Paket	1	340000	25,00	Paket	25,00	340.000	8.500.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>516.000</b>					<b>12.900.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>4.098.200</b>					<b>102.455.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>409.820</b>					<b>10.245.500</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>4.508.020</b>					<b>112.700.500</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(20)</b>					<b>(500)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>4.508.000</b>					<b>112.700.000</b>



PETAK 4									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan			Kebutuhan	
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Persiapan Lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	495.000	25,00	HOK	137,50	90.000	12.375.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,00	630.000	25,00	HOK	175,00	90.000	15.750.000
3	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,00	540.000	25,00	HOK	150,00	90.000	13.500.000
4	Pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3 X	HOK	8,00	720.000	25,00	HOK	200,00	90.000	18.000.000
5	Pembuatan gubuk kerja/pondok kerja dan papan nama	HOK	1,08	97.200	25,00	HOK	27,00	90.000	2.430.000
6	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>2.882.200</b>					<b>72.055.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50,00	125.000,00	25,00	Patok	1.250,00	2.500	3.125.000
2	Pengadaan ajir	Btg	400,00	108.000,00	25,00	Btg	10.000,00	270	2.700.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0,04	24.000,00	25,00	Unit	1,00	600.000	600.000
4	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	68.000,00	25,00	Unit	0,50	3.400.000	1.700.000
5	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
6	Pengadaan obat-obatan	Paket	1,00	65.000,00	25,00	Paket	25,00	65.000	1.625.000
7	Pengadaan bahan / peralatan kerja	Paket	0,02	80.000,00	25,00	Paket	0,50	4.000.000	2.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>700.000,00</b>					<b>17.500.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 40 Btg (Pemeliharaan tahun berjalan)	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
2	Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar	Paket	1	340000	25,00	Paket	25,00	340.000	8.500.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>516.000</b>					<b>12.900.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>4.098.200</b>					<b>102.455.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>	10%		<b>409.820</b>					<b>10.245.500</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>4.508.020</b>					<b>112.700.500</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(20)</b>					<b>(500)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>4.508.000</b>					<b>112.700.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PER PETAK KEGIATAN TAHUN PERTAMA (P1)**

PETAK 1									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Distribusi bibit kelubang tanam	HOK	1,00	90.000	25,00	HOK	25,00	90.000	2.250.000
2	Penyulaman	HOK	2,00	180.000	25,00	HOK	50,00	90.000	4.500.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit 3 X	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
4	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.750.000</b>					<b>43.750.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>230.000,00</b>					<b>5.750.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	80	352.000	25,00	Btg	2.000,00	4.400	8.800.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>352.000</b>					<b>8.800.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>2.332.000</b>					<b>58.300.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>233.200</b>					<b>5.830.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.565.200</b>					<b>64.130.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(200)</b>					<b>(5.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.565.000</b>					<b>64.125.000</b>

PETAK 2									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Distribusi bibit kelubang tanam	HOK	1,00	90.000	25,00	HOK	25,00	90.000	2.250.000
2	Penyulaman	HOK	2,00	180.000	25,00	HOK	50,00	90.000	4.500.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit 3 X	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
4	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.750.000</b>					<b>43.750.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>230.000,00</b>					<b>5.750.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	80	352.000	25,00	Btg	2.000,00	4.400	8.800.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>352.000</b>					<b>8.800.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>2.332.000</b>					<b>58.300.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>233.200</b>					<b>5.830.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.565.200</b>					<b>64.130.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(200)</b>					<b>(5.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.565.000</b>					<b>64.125.000</b>

PETAK 3									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Distribusi bibit kelubang tanam	HOK	1,00	90.000	25,00	HOK	25,00	90.000	2.250.000
2	Penyulaman	HOK	2,00	180.000	25,00	HOK	50,00	90.000	4.500.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit 3 X	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
4	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.750.000</b>					<b>43.750.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>230.000,00</b>					<b>5.750.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	80	352.000	25,00	Btg	2.000,00	4.400	8.800.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>352.000</b>					<b>8.800.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>2.332.000</b>					<b>58.300.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>233.200</b>					<b>5.830.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.565.200</b>					<b>64.130.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(200)</b>					<b>(5.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.565.000</b>					<b>64.125.000</b>

PETAK 4									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Distribusi bibit kelubang tanam	HOK	1,00	90.000	25,00	HOK	25,00	90.000	2.250.000
2	Penyulaman	HOK	2,00	180.000	25,00	HOK	50,00	90.000	4.500.000
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit pemeliharaan teknik konservasi tanah 3 X	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
4	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.750.000</b>					<b>43.750.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	230.000,00	25,00	Paket	25,00	230.000	5.750.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>230.000,00</b>					<b>5.750.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	80	352.000	25,00	Btg	2.000,00	4.400	8.800.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>352.000</b>					<b>8.800.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>2.332.000</b>					<b>58.300.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>233.200</b>					<b>5.830.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.565.200</b>					<b>64.130.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(200)</b>					<b>(5.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.565.000</b>					<b>64.125.000</b>

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PER PETAK KEGIATAN TAHUN KEDUA (P2)									
PETAK 1									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan			Kebutuhan	
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
2	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.480.000</b>					<b>37.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	200.000	25,00	Paket	25,00	200.000	5.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>200.000,00</b>					<b>5.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>176.000</b>					<b>4.400.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>1.856.000</b>					<b>46.400.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>185.600</b>					<b>4.640.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.041.600</b>					<b>51.040.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(600)</b>					<b>(15.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.041.000</b>					<b>51.025.000</b>

PETAK 2									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan			Kebutuhan	
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
2	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.480.000</b>					<b>37.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	200.000	25,00	Paket	25,00	200.000	5.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>200.000,00</b>					<b>5.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>176.000</b>					<b>4.400.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>1.856.000</b>					<b>46.400.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>185.600</b>					<b>4.640.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.041.600</b>					<b>51.040.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(600)</b>					<b>(15.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.041.000</b>					<b>51.025.000</b>

PETAK 3									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan				Kebutuhan
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
2	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.480.000</b>					<b>37.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	200.000	25,00	Paket	25,00	200.000	5.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>200.000,00</b>					<b>5.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>176.000</b>					<b>4.400.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>1.856.000</b>					<b>46.400.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>185.600</b>					<b>4.640.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.041.600</b>					<b>51.040.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(600)</b>					<b>(15.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.041.000</b>					<b>51.025.000</b>



PETAK 4									
No.	Jenis Kegiatan	Standar per Ha			Volume Kegiatan			Kebutuhan	
		Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Luas (Ha)	Satuan	Volume	(Rp./Sat)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Gaji/Upah</b>								
1	Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukkan, pengendalian hama/penyakit	HOK	12,00	1.080.000	25,00	HOK	300,00	90.000	27.000.000
2	Pengawasan/Mandor Tanam	OB	0,10	400.000	25,00	OB	2,50	4.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH I</b>			<b>1.480.000</b>					<b>37.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Bahan</b>								
1	Pengadaan pupuk dan atau media tanam	Paket	1,00	200.000	25,00	Paket	25,00	200.000	5.000.000
	<b>JUMLAH II</b>			<b>200.000,00</b>					<b>5.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Penyediaan Bibit</b>								
1	Bibit sulaman 80 btg	Btg	40	176.000	25,00	Btg	1.000,00	4.400	4.400.000
	<b>JUMLAH III</b>			<b>176.000</b>					<b>4.400.000</b>
<b>IV</b>	<b>JUMLAH BIAYA (I + II + III)</b>			<b>1.856.000</b>					<b>46.400.000</b>
<b>V</b>	<b>Biaya Umum dan Keuntungan (10%)</b>		10%	<b>185.600</b>					<b>4.640.000</b>
<b>VI</b>	<b>Jumlah Biaya (bila dilaksanakan secara kontraktual)</b>			<b>2.041.600</b>					<b>51.040.000</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>(600)</b>					<b>(15.000)</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>2.041.000</b>					<b>51.025.000</b>

### REKAPITULASI PER PETAK

No	Kegiatan	Luas		Total Biaya (Rp)
1	2	3		4
1	Pembuatan Bibit 400 Btg	100	Ha	193.600.000
2	Penanaman P0 Petak 1	25	Ha	112.700.000
3	Penanaman P0 Petak 2	25	Ha	112.700.000
4	Penanaman P0 Petak 3	25	Ha	112.700.000
5	Penanaman P0 Petak 4	25	Ha	112.700.000
6	Pemeliharaan P1 Petak 1	25	Ha	64.125.000
7	Pemeliharaan P1 Petak 2	25	Ha	64.125.000
8	Pemeliharaan P1 Petak 3	25	Ha	64.125.000
9	Pemeliharaan P1 Petak 4	25	Ha	64.125.000
10	Pemeliharaan P2 Petak 1	25	Ha	51.025.000
11	Pemeliharaan P2 Petak 2	25	Ha	51.025.000
12	Pemeliharaan P2 Petak 3	25	Ha	51.025.000
13	Pemeliharaan P2 Petak 4	25	Ha	51.025.000
<b>Jumlah</b>				<b>1.105.000.000</b>
